



BALANÇO
4 ANOS
2007 - 2010





Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional





Ferrovias Transnordestina - Trecho Missão Velha/Salgueiro • CE/PE

APRESENTAÇÃO

Ao lançar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em janeiro de 2007, o Governo Federal assumiu o compromisso de fazer o Brasil crescer de forma acelerada e sustentada.

No primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os principais desafios eram estabilizar a economia e implementar um novo modelo de desenvolvimento para o País, combinando crescimento com distribuição de renda.

A tarefa foi cumprida: quatro anos depois, a economia brasileira reunia indicadores positivos como poucas vezes na história, e o mundo atravessava um ciclo contínuo de crescimento. Com a casa arrumada e um cenário internacional favorável, abria-se um horizonte de possibilidades. Era chegado o momento de avançar. O PAC foi uma resposta a esse desafio.

Pela primeira vez em décadas, o País teria um plano estratégico capaz de resgatar o planejamento em infraestrutura, retomar investimentos em setores estruturantes, fazer crescer o emprego e a renda, incentivar o investimento público e privado e, principalmente, construir a infraestrutura necessária para sustentar o crescimento do Brasil. Um plano que só teria êxito se houvesse forte articulação no Governo Federal e fosse executado em parceria com estados, municípios e com a iniciativa privada.

Os resultados alcançados pelo PAC nesses quatro anos mostram o acerto da decisão de lançar o programa. A expansão média da economia brasileira deve atingir 4,6% ao ano no período 2007-2010, taxa significativamente maior que a verificada em períodos anteriores.

Os investimentos públicos dobraram entre 2007 e 2010, passando de 1,62% do PIB, em 2006, para 3,27% do PIB nos 12 meses encerrados em outubro deste ano. Um dos fatores que contribuíram para o aumento dos investimentos foi a ampliação do crédito, com juros menores e prazos de pagamento maiores.

A criação de postos de trabalho continua em expansão. O saldo líquido de geração de empregos acumulado no período do PAC é recorde: 8,2 milhões. A taxa de desemprego de outubro deste ano é a menor da série histórica do IBGE: 6,1%.

O PAC também foi essencial para coibir os impactos da crise financeira que assolou os mercados internacionais em 2008 e 2009. No Brasil, diferentemente da maior parte dos países, o Governo Federal não reduziu investimentos. Ao contrário, o PAC, juntamente com a força do mercado interno, foi capaz de minimizar significativamente os impactos da crise econômica internacional.

Todos os brasileiros ganharam com o PAC, grande parte por serem beneficiados diretamente pelas obras que estão sendo realizadas e os demais, pelo efeito extremamente positivo que o PAC provoca na economia, garantindo crescimento continuado em nosso País.

Os investimentos executados pelo programa chegarão a R\$ 619 bilhões até 31 de dezembro de 2010. Esse valor representa 94,1% dos R\$ 657,4 bilhões previstos para serem investidos pelo programa no período 2007-2010. Até 31 de outubro deste ano, o montante investido atingiu R\$ 559,6 bilhões, equivalentes a 85,1% do total previsto.

Os empreendimentos concluídos no âmbito do PAC alcançarão R\$ 444 bilhões até dezembro de 2010. O valor representa 82% dos R\$ 541,8 bilhões previstos para serem concluídos no período 2007-2010.

O desenvolvimento chegou a todo o território brasileiro. Essa é a mudança substancial que acontece neste momento no País.

Duas das maiores hidrelétricas do mundo estão sendo construídas hoje no Brasil: Santo Antônio e Jirau, e Belo Monte será iniciada em breve. No dia 30 de novembro, o Governo Federal inaugurou as Eclusas do Tucuruí, no Pará. Um empreendimento que estava em ritmo lento havia 30 anos e que foi retomado pelo PAC. Um marco histórico para a região Norte do País.

Até dezembro, o PAC concluirá 6.377 quilômetros de rodovias e outros 909 quilômetros de ferrovias. No setor de Petróleo e Gás são 12 novos campos e 12 plataformas em operação, além de 3.776 quilômetros de gasodutos construídos.

Nas áreas de Habitação e Saneamento, 1.323 obras foram concluídas e 4.016 estão sendo executadas em todo o País, em parceria com governos estaduais e municipais.

Isso tudo continuará com o PAC 2. Ao mesmo tempo em que dará continuidade aos investimentos em infraestrutura geral, a segunda etapa do programa priorizará as regiões metropolitanas com investimentos que visam solucionar os problemas históricos que acometem as nossas cidades. Urbanização de favelas, saneamento ambiental, mobilidade urbana, pavimentação, drenagem e contenção de encostas estão contemplados no PAC 2, assim como unidades de pronto atendimento (UPA), unidades básicas de saúde (UBS), pré-escolas, creches, postos comunitários de segurança e espaços de esporte, cultura e lazer.

O melhor balanço é constatar que as brasileiras e os brasileiros estão vivendo muito melhor, e que o País entrou na trajetória contínua do crescimento. O Brasil finalmente se tornou o país do presente.

Nas próximas páginas estão apresentadas, detalhadamente, as informações sobre a execução orçamentária e financeira do PAC, bem como sobre os empreendimentos do programa. Boa leitura.

**Comitê Gestor do PAC
09 de dezembro de 2010**



Metrô de Salvador - Lapa Acesso Norte • BA

SUMÁRIO

| | |
|---|-----|
| Quadro Macroeconômico | 07 |
| Medidas Institucionais | 19 |
| Execução Orçamentária e Financeira | 27 |
| Ações Concluídas | 33 |
| Evolução do Monitoramento | 43 |
| Infraestrutura Logística | 49 |
| Rodovias | 53 |
| Ferrovias | 70 |
| Portos | 78 |
| Hidrovias | 85 |
| Aeroportos | 88 |
| Infraestrutura Energética | 97 |
| Geração de Energia Elétrica..... | 101 |
| Transmissão de Energia Elétrica..... | 117 |
| Petróleo e Gás Natural | 128 |
| Refino, Petroquímica e HBIO | 135 |
| Revitalização da Indústria Naval | 138 |
| Combustíveis Renováveis | 150 |
| Infraestrutura Social e Urbana | 153 |
| Luz para Todos | 157 |
| Metrô | 158 |
| Recursos Hídricos | 164 |
| Habitação | 180 |
| Saneamento | 206 |



Usina Hidrelétrica Santo Antônio • RO



Quadro Macroeconômico

QUADRO MACROECONÔMICO

Balanço de quatro anos do PAC

Passados quatro anos desde o lançamento do PAC, os resultados efetivos alcançados pela economia brasileira indicam que o objetivo de acelerar o crescimento econômico – mesmo levando em conta a interferência da maior crise internacional em 80 anos – foi atingido. A expansão média da economia brasileira deve atingir 4,6% ao ano no período entre 2007 e 2010, taxa significativamente maior do que a verificada nos períodos anteriores.

Além dos resultados conseguidos em termos de crescimento, cumpre ainda destacar a importância do PAC para mitigar impactos mais negativos da crise financeira internacional na atividade econômica. Quando da erupção da crise, o PAC já havia proporcionado ao Brasil um programa estruturado de investimentos, ao contrário do que ainda ocorre na maioria dos outros países mesmo passados dois anos do início da crise. E diferentemente de períodos de crise anteriores, nos quais o Governo tinha forçosamente que reduzir seus investimentos para evitar desconfiças sobre as finanças públicas, o PAC foi reforçado, indicando uma atuação anticíclica decidida, procurando manter o funcionamento da atividade econômica.

A estratégia de apostar no investimento contribuiu para que o País mantivesse a criação de novos postos formais de trabalho, mesmo em um período de enfrentamento da crise financeira. O saldo líquido de geração de empregos acumulado em 12 meses, até outubro de 2010, é recorde em 2,24 milhões. A taxa de desemprego de outubro de 2010

é a menor da série histórica do IBGE, 6,1%. Verifica-se assim que a taxa de desemprego continuou sua trajetória de declínio durante a vigência do PAC, atingindo ao final de 2010 os menores valores da série histórica.

O PAC também é essencial para a rápida recuperação do crescimento neste ano de 2010. Basta observar o desempenho dos investimentos, que devem crescer por volta de 20%. Com isso, em 2010 a taxa de investimento da economia brasileira deve ficar ligeiramente abaixo da verificada em 2008 (19,1%), retomando a inflexão na trajetória de crescimento iniciada com o PAC. Importante notar que após o lançamento do PAC, a formação bruta de capital fixo como proporção do PIB ficou sempre acima dos valores observados no quadriênio anterior, mesmo durante a crise financeira.

Um dos fatores relevantes para a elevação dos investimentos na economia brasileira, no âmbito do PAC, foi a expansão do crédito bancário, em especial para o setor imobiliário, assim como nos desembolsos do BNDES. Os desembolsos do BNDES mantiveram-se em patamares recordes (R\$ 170,8 bilhões no acumulado em 12 meses até outubro de 2010) e o Programa de Sustentação do Crescimento - PSI permitiu o apoio ao investimento nos setores mais vulneráveis à reversão cíclica. A União fez mais dois aportes ao BNDES durante o ano de 2010, num total superior a R\$ 100 bilhões, preservando a capacidade do banco de alavancar investimentos. Estas operações contribuíram para que os bancos públicos sustentassem o crescimento de crédito na crise, especialmente para capital de giro e imobiliário.

Também é essencial destacar os resultados do Programa Minha Casa Minha Vida, que constitui um vigoroso instrumento de incentivo à produção num setor intensivo em trabalho e em insumos produzidos no País. De fato, considerando apenas o ano de 2010, observamos que até meados de novembro de 2010 o programa havia contratado mais de 463,6 mil unidades, num valor de R\$ 28,4 bilhões, número bem superior às 276 mil unidades contratadas no primeiro ano do programa (2009).

Também houve um significativo aprofundamento no crédito para as pessoas físicas que, juntamente com o desempenho favorável do mercado de trabalho destacado anteriormente, foi essencial para fortalecimento do mercado doméstico. O crédito bancário continuou a se expandir, tendo alcançado, em outubro de 2010, 47% do PIB (contra 24% em 2003).

Dessa forma, a maior robustez da economia nacional possibilitada pelo PAC foi determinante para o enfrentamento da crise e para a rápida retomada do alto crescimento já em 2010.

Política Fiscal

Desde o lançamento do PAC houve uma expansão de cerca de 1,6 ponto percentual do PIB das despesas primárias da União, atingindo 18,6% do PIB nos 12 meses encerrados em outubro de 2010, sem considerar os gastos com a capitalização recente da Petrobras.

Comparando com o perfil das despesas primárias antes e depois do PAC, houve uma significativa ampliação dos investimentos, que passaram de 0,6% do PIB, em 2006, para 1,2% do PIB nos 12 meses encerrados em outubro de 2010. Já os gastos com pessoal passaram de 4,5% para 4,7% do PIB na

mesma base comparativa, em virtude da necessidade de reestruturação de carreiras, procurando inclusive fortalecer a atuação do Estado no acompanhamento do PAC, além do processo de substituição de servidores terceirizados.

As despesas com transferência de renda, por sua vez, passaram de 8,4% em 2006 para 9% do PIB nos 12 meses encerrados em outubro de 2010, denotando a estratégia do Governo Federal de fortalecimento do mercado doméstico via, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo. Por fim, as demais despesas correntes ficaram relativamente estáveis, passando de 3,4% para 3,7% do PIB na mesma base de comparação.

De forma igualmente relevante, o processo de capitalização da Petrobras, no total de R\$ 120,3 bilhões, reforçou o caixa da empresa, possibilitando a sequência ao seu plano de investimentos, no valor global de US\$ 224 bilhões até 2014, e reforçou o superávit primário da União.

A ampliação das despesas primárias, além de contribuir para o crescimento sustentável – na medida em que elevou os investimentos e fortaleceu o mercado doméstico – não impediu a trajetória de significativa redução da dívida líquida do setor público observada desde 2003. Em termos do PIB, a dívida líquida passou de 47,3%, em 2006, para 41,5% do PIB em setembro de 2010, levando-se ainda em conta a breve interrupção da trajetória declinante em decorrência das medidas tomadas durante o enfrentamento da crise.

Inflação

A inflação permaneceu dentro do intervalo das metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) desde o lançamento do

PAC. Após ficar abaixo do centro da meta em 2006, quando a inflação foi de 3,1%, a variação do IPCA nos anos seguintes atingiu 4,5% em 2007 e 5,9% em 2008. Deve-se notar que a expansão dos preços naqueles anos esteve mais relacionada aos choques de oferta e à desvalorização cambial no último trimestre de cada ano, que provocaram uma significativa alta nos alimentos (10,8% em 2007 e 11,1% em 2008).

Em 2009, com a desaceleração do crescimento econômico em virtude da crise financeira internacional, a inflação voltou a recuar e ficou novamente abaixo do centro da meta (4,3%), também se beneficiando a valorização da taxa nominal de câmbio após os efeitos mais perversos da crise financeira internacional sobre a economia brasileira.

Em 2010, a inflação deve retornar para uma taxa superior ao centro da meta de 4,5%, novamente influenciada pela alta nos preços dos alimentos. Entretanto, é importante ressaltar que as expectativas apontam para uma redução da inflação ao longo dos próximos anos.

Esse comportamento favorável da inflação nos últimos anos, juntamente com a perspectiva para uma convergência gradual à trajetória das metas estipuladas pelo CMN, contribuiu para a manutenção da queda nas taxas reais de juros praticadas na economia brasileira.

Setor Externo

A rápida retomada do crescimento econômico do Brasil após a crise financeira, em um cenário ainda cercado de incertezas sobre o desempenho da economia global, está provocando uma tendência de apreciação da taxa de câmbio bem como ampliação do déficit em transações correntes do balanço de pagamentos, desde meados de 2009.

Dentre outros fatores, isso se deve à melhoria das perspectivas de crescimento da economia brasileira, que levou o País a receber significativo aumento no fluxo de capitais. Procurando evitar volatilidade excessiva na taxa nominal de câmbio, o Governo Federal vem intervindo no mercado cambial, com destaque para a manutenção da política de aquisição das reservas internacionais e a taxação, via Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), da entrada de capitais e das margens nas operações praticadas nos mercados futuros de dólar.


O compromisso com o câmbio flutuante e a manutenção de uma situação de credor externo líquido, com reservas internacionais acima da dívida externa, reduz a vulnerabilidade externa da economia brasileira. É importante ressaltar que tanto a dívida externa total quanto as reservas internacionais, expressas como parcela do PIB, encontram-se em níveis bem mais confortáveis do que em períodos anteriores.

Considerações Finais

Neste balanço de quatro anos do PAC, seus principais objetivos foram alcançados. Houve uma aceleração no ritmo de crescimento da economia, apesar da crise financeira internacional. Ademais, foi verificado um significativo aumento no emprego e na renda, com diminuição das desigualdades sociais e regionais.

O sucesso dos primeiros quatro anos do PAC e a garantia de continuidade da programação dos investimentos, além das novas metas estabelecidas com o PAC 2, produzem expectativas positivas de superação dos gargalos na infraestrutura do País e, principalmente, melhoria nas condições de vida da população brasileira nos próximos anos.

TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO PIB



*/ Projeções do Governo
Fonte: IBGE

Elaboração: MF/SPE

ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Taxa de crescimento médio do PIB (em %aa) *

| Período | Efetivo | Proposta do PAC 1 |
|----------|---------|-------------------|
| 1995-98 | 2,5 | |
| 1999-02 | 2,1 | |
| 2003-06 | 3,5 | |
| 2007-10* | 4,6 | 4,9 |

*/ Para 2010, a projeção é de 7,5%. A proposta do PAC 1, apresentada em janeiro de 2007, era de crescimento do PIB de 4,5% em 2007 e 5% em 2008, 2009 e 2010


Fonte: IBGE

Elaboração: MF/SPE


CRIAÇÃO LÍQUIDA DE POSTOS DE TRABALHO (variação absoluta – em milhares)



TAXA DE DESOCUPAÇÃO % da PEA




TAXA DE INVESTIMENTO (FBKF / PIB)



Fonte: IBGE

Elaboração: MF/SPE


EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO Saldo em valores nominais

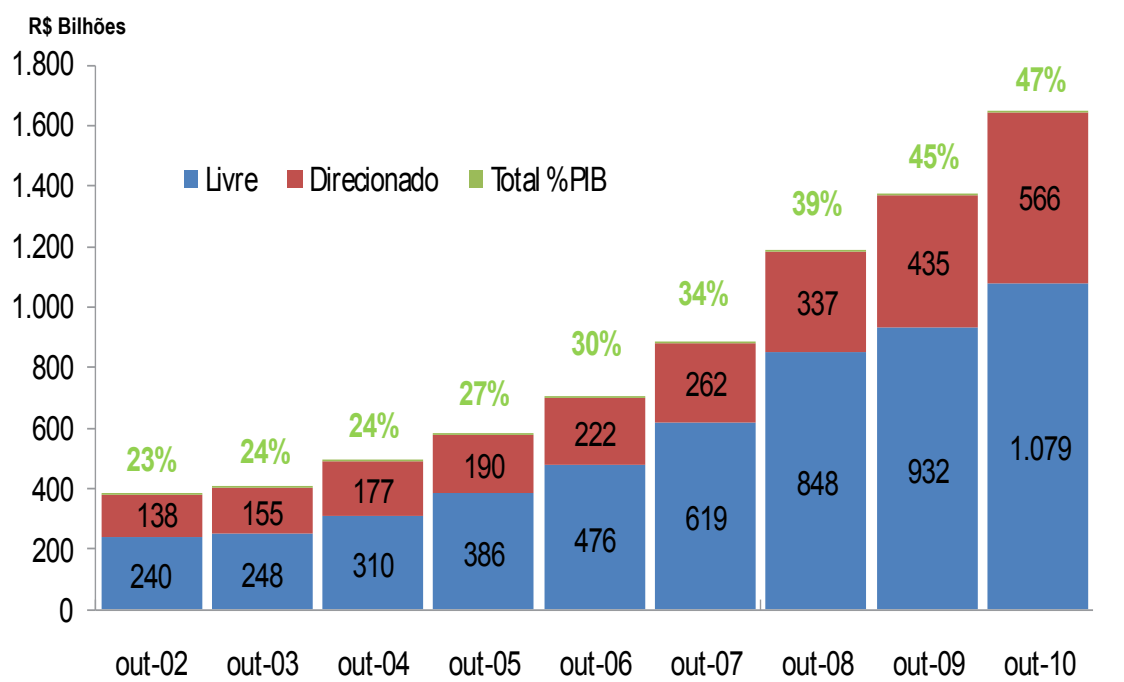

Fonte: BCB

Elaboração: MF/SPE

INVESTIMENTO PÚBLICO % do PIB

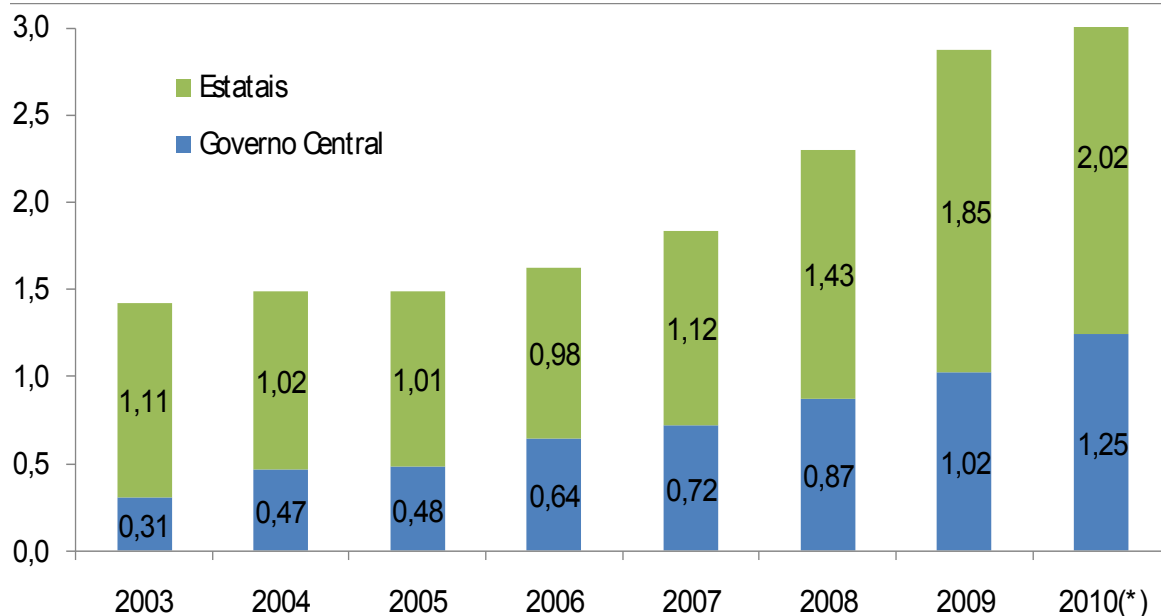

Não contabiliza investimentos no exterior

*/ Governo Central: acumulado em 12 meses até Outubro/10. Estatais: acumulado em 12 meses até Agosto/10

Fontes: MF/STN e MP/DEST Elaboração: MF/SPE

GOVERNO CENTRAL – RESULTADO PRIMÁRIO % do PIB

| Em % do PIB | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (*) |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| RECEITA BRUTA | 21,7% | 21,0% | 21,6% | 22,7% | 22,9% | 23,3% | 23,8% | 23,5% | 23,8% |
| TRANSFERÊNCIAS PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS | 3,8% | 3,5% | 3,5% | 3,9% | 3,9% | 4,0% | 4,4% | 4,1% | 3,9% |
| RECEITA LÍQUIDA TOTAL | 17,9% | 17,4% | 18,1% | 18,8% | 19,0% | 19,3% | 19,4% | 19,5% | 0,19891 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | 15,7% | 15,1% | 15,6% | 16,4% | 17,0% | 17,1% | 16,6% | 18,2% | 18,6% |
| - Pessoal e Encargos Sociais | 4,8% | 4,5% | 4,3% | 4,3% | 4,5% | 4,4% | 4,4% | 4,8% | 4,7% |
| - Transferências de Renda ** | 6,8% | 7,2% | 7,7% | 8,1% | 8,4% | 8,5% | 8,2% | 9,0% | 9,0% |
| - Investimentos | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,2% |
| - Custeio | 3,3% | 3,2% | 3,2% | 3,5% | 3,4% | 3,5% | 3,1% | 3,4% | 3,7% |
| RESULTADO PRIMÁRIO*** | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,1% | 2,2% | 2,9% | 1,3% | 1,3% |
| RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS DE TRANSFERÊNCIAS | 11,0% | 10,3% | 10,5% | 10,8% | 10,6% | 10,8% | 11,2% | 10,5% | 0,109389 |

*/ Acumulado em 12 meses até Outubro/10


**/ Compreende gastos com: benefícios previdenciários, abono, seguro-desemprego, benefícios assistenciais (LOAS e RMV) e Bolsa Família

***/ Sem considerar FSB e a operação de capitalização da Petrobras.

Fonte: STN/MF


Elaborado: SPE/MF

DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO * % do PIB

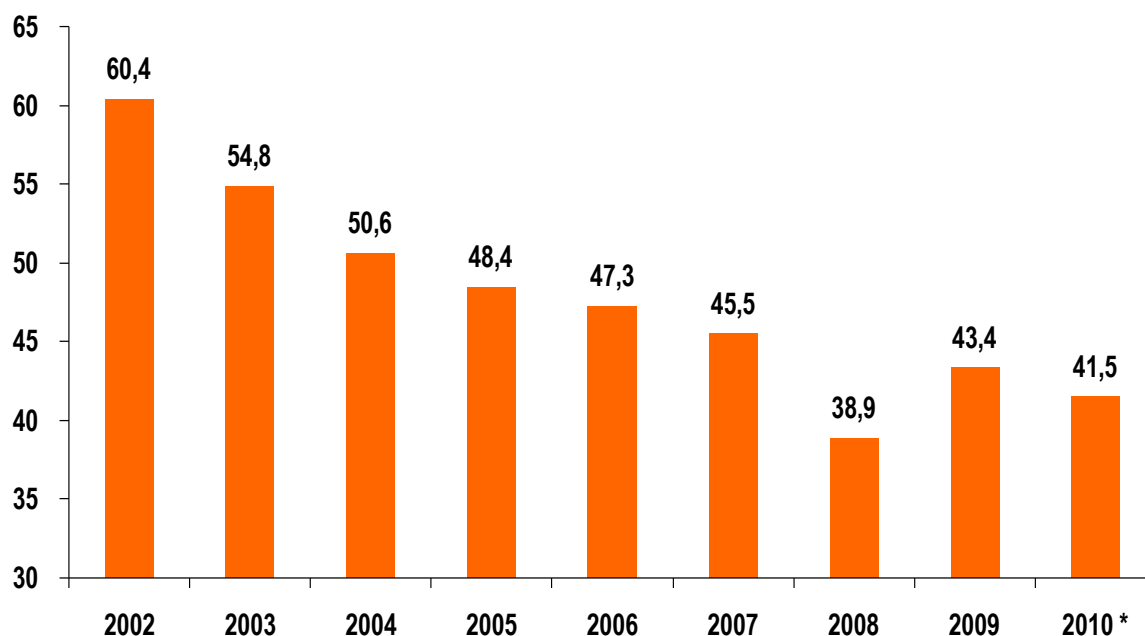

*/ dados de outubro de 2010, não considera Petrobrás em Eletrobras
Fonte: BCB Elaboração: MF/SPE


REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL IPCA – Variação % Acumulada no Ano e Expectativas de Mercado

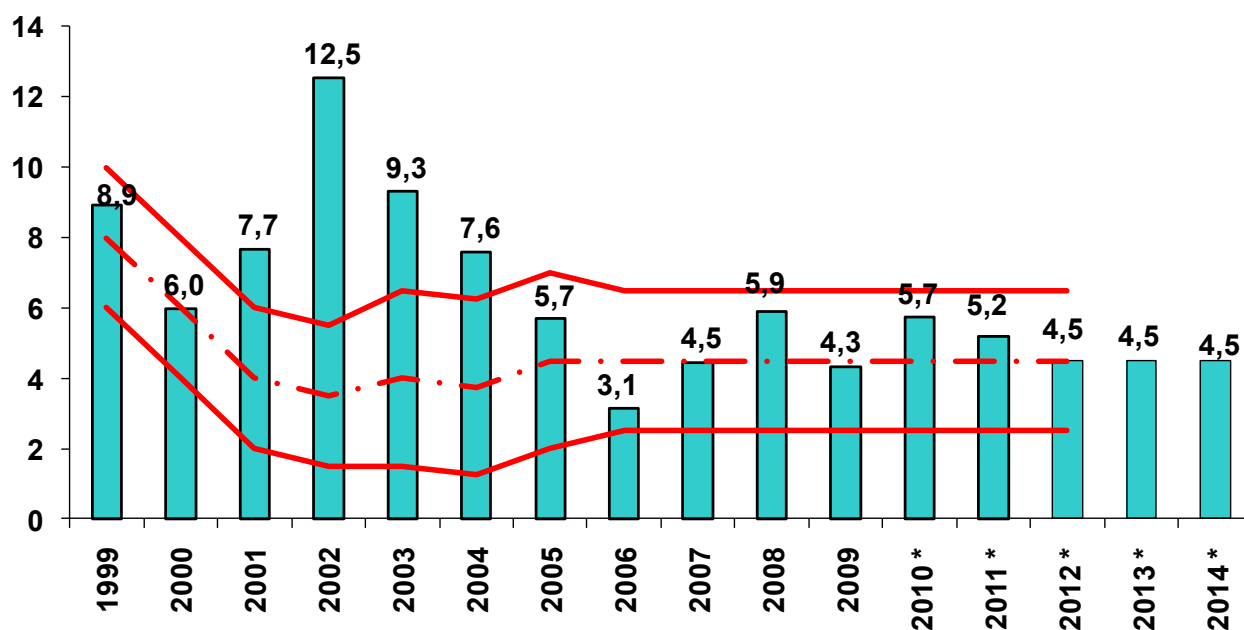

*/ Expectativas de Mercado (Boletim Focus, 26/11/2010)
Fontes: IBGE e BCB Elaboração: MF/SPE

TAXA REAL EX-ANTE DE JUROS*


% aa

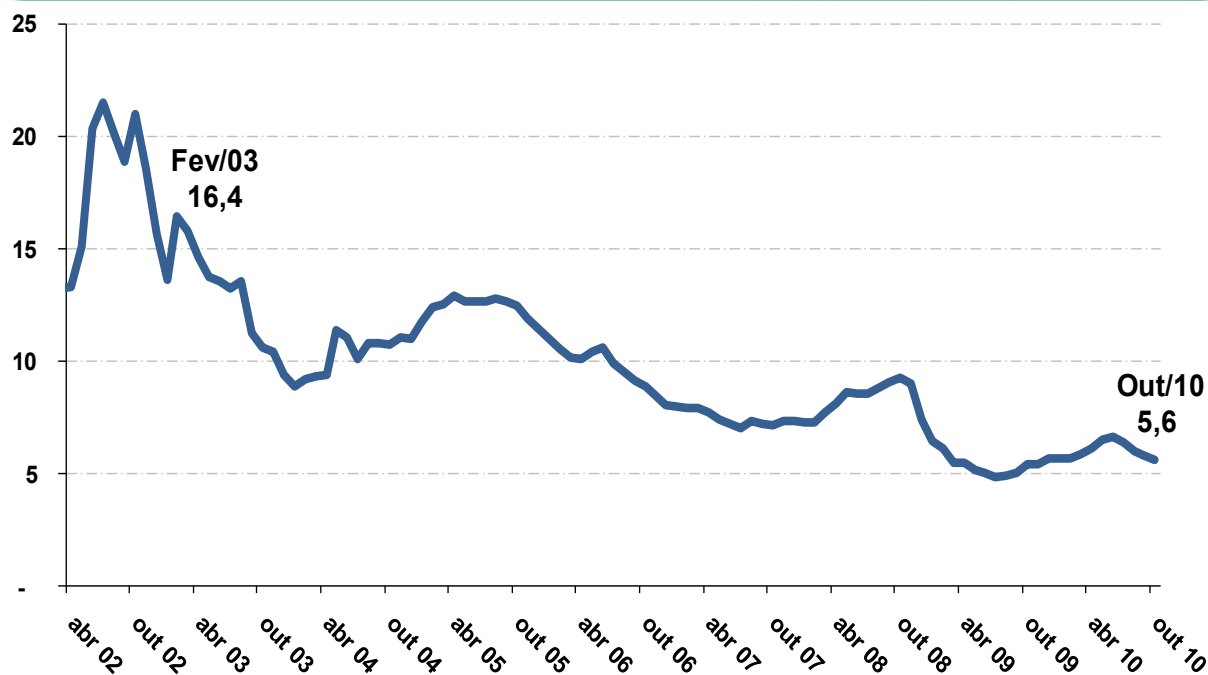

*/ Taxa swap di-pré 360, retiradas as expectativas para a inflação nos próximos 12 meses
Fontes: BCB e BMF Elaboração: MF/SPE

SALDO EM CONTA CORRENTE

% do PIB




*/ Previsão do BCB
Fonte: BCB

Elaboração: MF/SPE

INDICADORES EXTERNOS *

% do PIB




*/ Posição estimada para Outubro/2010

Fonte: BCB

Elaboração: MF/SPE





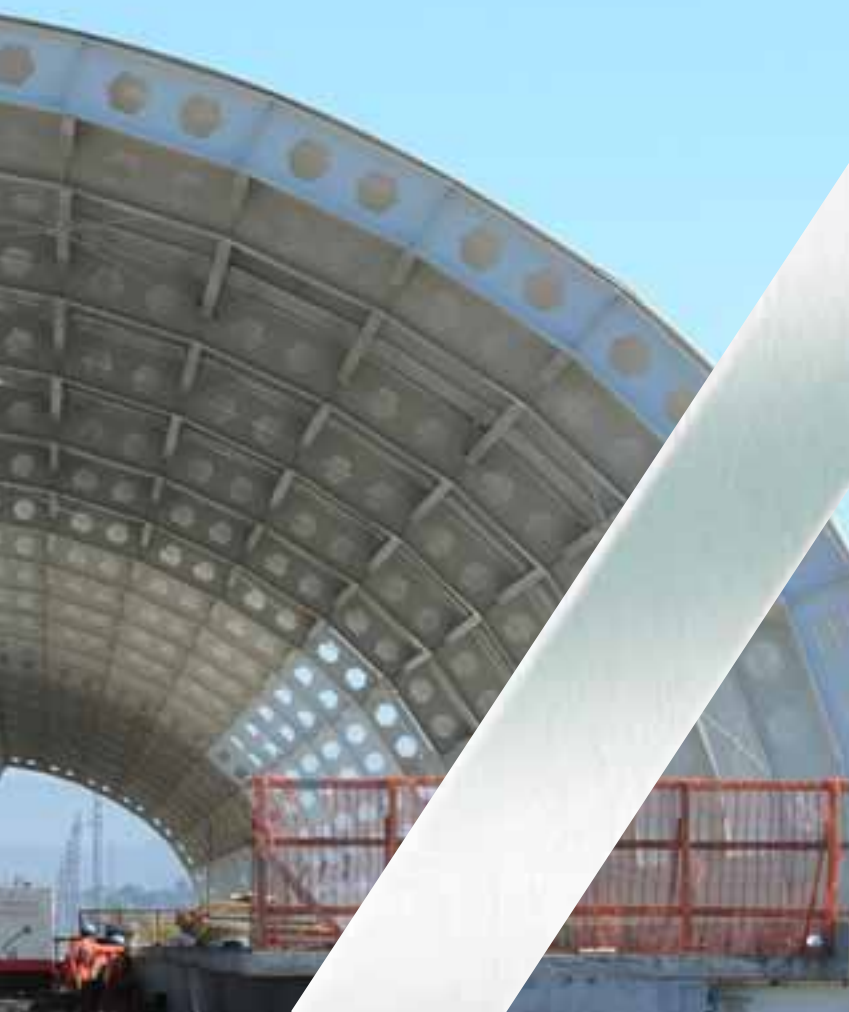

Medidas Institucionais



MEDIDAS DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

| Medida | Situação | Resultado |
|--|--|---|
| Desoneração de Obras de Infra-Estrutura – REIDI | Lei nº 11.488/2007, Decretos nº 6.144/2007 e nº 6.167/2007 | Aprovados 422 projetos pelo MME de geração e de transmissão de energia Inclusão da hidrelétrica de Santo Antônio/RO – 3.150,4 MW |
| Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas | Lei Complementar nº 123/2007 | Adesões ao Simples Nacional: aproximadamente 4,3 milhões de empresas Criação de mais de 700 mil novas empresas |
| Programa de Incentivo ao Setor da TV Digital – PATVD | Lei nº 11.484/2007 Dec. nº 6.234/2007 IN RFB 853, de 13/06/2008 | Criado GTI para análise de projeto 1 projeto aprovado 1 projeto em análise de viabilidade pelo MCT, MDIC e MF |
| Programa de Incentivo ao Setor de Semicondutores – PADIS | Leis nº 11.484/2007 e 11.774/2008 Decreto nº 6.233/2007 | 4 projetos encaminhados por empresas interessadas em análise de viabilidade pelo MCT, MDIC e MF |
| Ampliação do Benefício Tributário para Microcomputadores | Decreto nº 6.023/2007 | Em 2007, 27,2% dos moradores em domicílios particulares permanentes tinham acesso a computador (crescimento de 22,1% em relação a 2006). Aumento das vendas no varejo em 33,5% em 2008 e 10,6% em 2009 para materiais de escritório, informática e comunicação. Em 2010, no acumulado dos últimos 12 meses, até setembro, crescimento de 20,4% neste segmento |

MEDIDAS DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

| Medida | Situação | Resultado |
|--|-----------------------------------|--|
| Recuperação Acelerada dos Créditos de PIS e COFINS em Edificações | Lei nº 11.488/2007 | Renúncia fiscal prevista – R\$ 1,15 bilhão em 2007, R\$ 2,3 bilhões em 2008, R\$ 2 bilhões em 2009 e R\$ 1,9 bilhão em 2010 |
| Desoneração das Compras de Perfil de Aço | Decreto nº 6.024/2007 | Renúncia prevista – R\$ 63 milhões por ano |
| Reajuste da Tabela de Imposto de Renda – Pessoa Física | Lei nº 11.482/2007 | Renúncia prevista – R\$ 1,3 bilhão, em 2007, R\$ 2,5 bilhões em 2008, R\$ 8,8 bilhões em 2009 e R\$ 11,1 bilhões em 2010. (Nos anos de 2009 e 2010 foi considerado o aumento do número de faixas de alíquotas, decorrente da Lei nº 11.495/2009) |
| Depreciação Acelerada para Máquinas e Equipamentos | Lei 11.482/2007 | Renúncia prevista – R\$ 900 milhões por ano |
| Prorrogação da Cumulatividade do PIS e da COFINS na Construção Civil | Lei nº 11.434/2006 | Renúncia prevista – R\$ 600 milhões em 2007, R\$ 1,1 bilhão em 2008, R\$ 1,2 bilhão em 2009 e R\$ 1,3 bilhão em 2010 |
| Desoneração dos Fundos de Investimento em Infraestrutura | Lei nº 11.478/2007 - Isenção IRPF | Não apurado – A isenção de IRPF e IRRF aplica-se aos resgates efetuados após transcorridos 5 anos da aquisição da cota pelo investidor |

MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

| Medida | Situação | Resultado |
|--|---|---|
| Aumento do Prazo de Recolhimento – PIS, Previdência e COFINS | Lei nº 11.488/2007 | Melhora do fluxo de caixa das empresas |
| Criação da Receita Federal do Brasil | Lei nº 11.457/2007 Instrução Normativa nº 829, de 2008 | Unidades de atendimento (CAC e ARF), em todo o país, estão funcionando há mais de um ano em atendimento unificado Nas Delegacias de Julgamento e no Conselho de Contribuintes já estão funcionando as Turmas de Julgamento do Contencioso Previdenciário |
| Reforma Tributária | Encaminhada PEC ao CN em 08/02/2008 – PEC 233/2008 - apensada à PEC 31/2007 | Aguardando votação na Câmara dos Deputados |
| Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e Nota Fiscal Eletrônica | Decreto nº 6.022/2007 | Sped – Escrituração Contábil Digital – ECD e Escrituração Fiscal Digital – EFD <ul style="list-style-type: none"> ▪ PVA (Programa Validador e Assinador) já se encontra em ambiente de produção, estando na versão 1.06, desde janeiro/2009. Nova versão do PVA a ser utilizada para validação e transmissão da EFD a partir de 02/01/2010 ▪ Recepcionadas 9.800 escriturações contábeis digitais Nota Fiscal Eletrônica - NF-e <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mais de 1,75 bilhão de NF-e emitidas – Total superior a R\$ 64,5 trilhões, mais de 373 mil emissores ▪ Todas as Unidades da Federação estão autorizando NF-e ▪ Governo Federal cedeu R\$ 50 milhões em equipamentos para secretarias de fazenda estaduais ▪ Ativação de Central de Atendimento – 0800-978 2338 |

MEDIDAS DE ESTÍMULO AO CRÉDITO E AO FINANCIAMENTO

| Medida | Situação | Resultado |
|--|--|---|
| Redução da TJLP para 6,25% a.a | Resolução CMN 3498/2007 | Em 2007, volumes das operações de crédito do BNDES aumentaram 26,5% em relação a 2006, perfazendo um total de R\$ 65 bilhões. Em 2008, R\$ 91 bilhões e, em 2009, houve R\$ 158 bilhões em projetos aprovados e desembolso de R\$ 137,4 bilhões. A previsão para 2010 é de R\$ 145 bilhões |
| Redução dos Spreads do BNDES para Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Urbano | Implementada | Volume das operações de crédito do BNDES em infraestrutura em 2009 foi de R\$ 48,7 bilhões ou 35,4% do total |
| Criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura com Recursos do FGTS | Lei nº 11.491/2007 IN CVM 462/2007 Resoluções CCFGTS 545, 551, 552 e 553 | O regulamento do Fundo foi aprovado pela CVM em 21/02/2008. FI-FGTS encerrou 2009 com comprometimento total dos recursos alocados – R\$ 17,5 bilhões, dos quais foram desembolsados R\$ 13,7 bilhões. Para 2010, possui orçamento de R\$ 8,5 bilhões, dos quais R\$ 2,9 bilhões já foram aplicados até setembro, aprovados para contratação (REFI) R\$ 0,8 bilhão e em análise adiantada (ROPI) R\$ 5,5 bilhões em novos projetos. Para os investimentos já contratados, prevê-se a geração de 650 mil empregos diretos e 400 mil indiretos |
| Concessão de Crédito à Caixa para Aplicação em Saneamento e Habitação | Lei nº 11.485/2007 | Patrimônio de referência da CAIXA ampliado em 13/06/2007 |

MEDIDAS DE ESTÍMULO AO CRÉDITO E AO FINANCIAMENTO

| Medida | Situação | Resultado |
|---|---|--|
| Ampliação do Limite de Crédito ao Setor Público para Investimento em Saneamento e Habitação | Lei nº 11.537/2007 Resolução CMN 3686/2009 | Limites atuais são de R\$ 14,2 bilhões para Saneamento e R\$ 5,5 bilhões para Habitação |
| Elevação da Liquidez do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) | Lei nº 11.474/2007 Portarias Cidades nº 493/2007 e Fazenda/ Cidades nº 684/2007 | Os procedimentos já foram todos definidos e implementados – normas, processos, sistemas, orientação da Rede e divulgação aos interessados. Liquidação, até 30/10/2010, de 8.432 unidades |
| Criação do Fundo de Investimento em Participação em Infraestrutura | Lei nº 11.478/2007 IN CVM 460/2007 | Marco regulatório finalizado. A constituição dos fundos depende do interesse do setor privado |

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DO INVESTIMENTO

| Medida | Situação | Resultado |
|--|---|---|
| Marco Regulatório para o Setor de Saneamento | Lei nº 11.445/2007 | Aumento do investimento do setor privado em saneamento. Participação privada não passava de 6% do setor até 2006, chegou a 7,5% em 2007, a 9,8% em 2008 e tem a expectativa de chegar a 30% nos próximos 5 anos |
| Abertura do Mercado de Resseguros | Lei Complementar nº 126/2007 | Entrada de novas empresas no mercado de resseguros do Brasil <ul style="list-style-type: none"> ▪ 32 empresas corretoras de resseguros ▪ 85 empresas resseguradoras operando |
| Recriação da SUDAN e da SUDENE | SUDAN - Lei complementar 124/07 e Decreto nº 6.218/07 SUDENE - Lei Complementar 125/07 e Decreto nº 6.219/07 | Superintendências recriadas, estrutura aprovada e presidentes nomeados |

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DO INVESTIMENTO

| Medida | Situação | Resultado |
|--|---|--|
| Regulamentação do Artigo 23 da Constituição – normas para a cooperação entre União, estados, DF e municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício de competência comum | PLP nº 388/2007 - apensado ao PLP 12/2003 - Declarado prejudicado em face da aprovação, em plenário, da Emenda Substitutiva Global de Plenário nº 1 | Aprovado na Câmara. Aguarda votação no Senado |
| Marco Legal das Agências Reguladoras | PL nº 3.337/2004 – apensado ao PL 2057/2003 | Aguarda votação na Câmara dos Deputados |
| Reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência | PL nº 3.937/2004 – Câmara PLC 06/2009 – Senado | Aprovado na Câmara. Aguarda votação no Senado |
| Lei do Gás Natural | PL nº 6.673/2006 – Câmara PLC 90/2007 – Senado | Sancionado pelo Presidente da República, convertido na Lei 11.909/2009 e aguardando regulamentação no Ministério de Minas e Energia. |

MEDIDAS DE GESTÃO

| Medida | Situação | Resultado |
|--|--|--|
| Aperfeiçoamento da Governança Corporativa nas Estatais | Decreto nº 6.021/2007 | Maior transparência, controle e eficiência na gestão das estatais |
| Extinção de Empresas Estatais em Processo de Liquidação | Lei nº 11.483/2007 Decretos nº 6.018/2007 e nº 6.020/2007 | Extinção das empresas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) ▪ Companhia de Navegação do São Francisco – FRANAVE |
| Regime de Previdência Complementar do Servidor Público Federal | PL nº 1.992/2007 | Aguarda votação na Câmara dos Deputados |
| Melhora da Gestão da Previdência Social | PLS nº 261/2005 – Senado (PL nº 1.291/2007 – Câmara) | Aprovado no Senado, aguarda votação na Câmara |
| Criação de Carreira de Analista de Infraestrutura com 800 Cargos | Lei nº 11.538/2007 MP nº 407/2007 | Concurso finalizado para contratação de 600 cargos, sendo 516 cargos de analista e 84 cargos de especialista |

MEDIDAS FISCAIS DE LONGO PRAZO

| Medida | Situação | Resultado |
|--|---|--|
| Controle da Expansão da Despesa de Pessoal da União | PLP nº 01/2007 | Aguarda votação na Câmara dos Deputados (projeto de iniciativa do executivo. Limita as despesas com pessoal no período de 2007 a 2016) |
| Política de Longo Prazo de Valorização do Salário Mínimo | PL nº 01/2007 – Câmara (PLC 42/2007 – Senado) | Aprovado na Câmara e no Senado. Aguarda votação na Câmara, casa de origem, de Emenda do Senado |
| Agilização do Processo Licitatório | PL nº 7.709/2007 – Câmara (PLC nº 32/2007 – Senado) | Aprovado na Câmara, aguarda votação no Senado |
| Fórum Nacional da Previdência Social | Decreto nº 6.019/2007 | Realizadas 12 reuniões em 2007 Elaborado relatório em 31/10/2007 com os principais consensos e dissensos |

MEDIDAS FISCAIS DE LONGO PRAZO

| Medida | Situação | Resultado |
|--|-------------------|--|
| Limite para o aumento da despesa com pessoal e encargos sociais da União | PLS nº 611/07 | Aprovado no Senado, encaminhado à Câmara em 22/12/2009. (Limita as despesas com pessoal ao valor líquido do ano anterior corrigido pelo IPCA +2,5% ou o percentual de crescimento do PIB, o que for menor. Inclui também limite de gasto com obras, instalações e projetos de construção de novas sedes, ampliação ou reforma da Administração Pública a 1/4 dos percentuais estabelecidos para as despesas com pessoal) |
| Valorização do salário mínimo e reajuste dos benefícios | MPVS nº 474 e 475 | MPV 474 convertida na Lei 12.255 (salário mínimo a partir de jan/2010) e MPV 475 convertida na Lei 12.254 (reajuste nos benefícios mantidos pela Previdência Social em 2010 e 2011) |

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO





Plataforma P-57 • ES



Execução Orçamentária e Financeira

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Os investimentos executados do PAC chegarão a R\$ 619 bilhões até 31 de dezembro de 2010. Esse valor representa 94,1% dos R\$ 657,4 bilhões previstos para serem investidos pelo programa no período 2007-2010. Até 31 de outubro deste ano, o montante investido atingiu R\$ 559,6 bilhões, equivalentes a 85,1% do total previsto.

No último balanço, divulgado em abril, o investimento totalizava R\$ 463,9 bilhões, ou 70,7% da previsão. Em dezembro de 2009, a execução financeira do PAC havia chegado a R\$ 403,8 bilhões, ou 63,3% do total.

Os investimentos do setor público (estatais, OGU/Fiscal e Seguridade, e contrapartidas de estados e municípios) atingirão R\$


267,1 bilhões. Até outubro, o montante somou R\$ 235,7 bilhões. Os Financiamentos Habitacionais à Pessoa Física serão de R\$ 216,9 bilhões, valor que atingiu até outubro R\$ 197,8 bilhões. Os investimentos do setor privado somarão R\$ 128 bilhões, montante que totalizou R\$ 119,9 bilhões até outubro. Já os empréstimos ao setor público chegaram a R\$ 6,2 bilhões até outubro, com previsão de R\$ 7 bilhões até dezembro.

Dos R\$ 25 bilhões destinados ao PAC no Orçamento geral da União 2010, serão empenhados, até o final deste ano, R\$ 22,8 bilhões. Os pagamentos deverão alcançar R\$ 20 bilhões. Em relação a dezembro de 2009, o volume de pagamentos será 22% maior e de empenho será 8% superior.




Repar - Refinaria Presidente Getúlio Vargas • PR

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAC 2007-2010 OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado

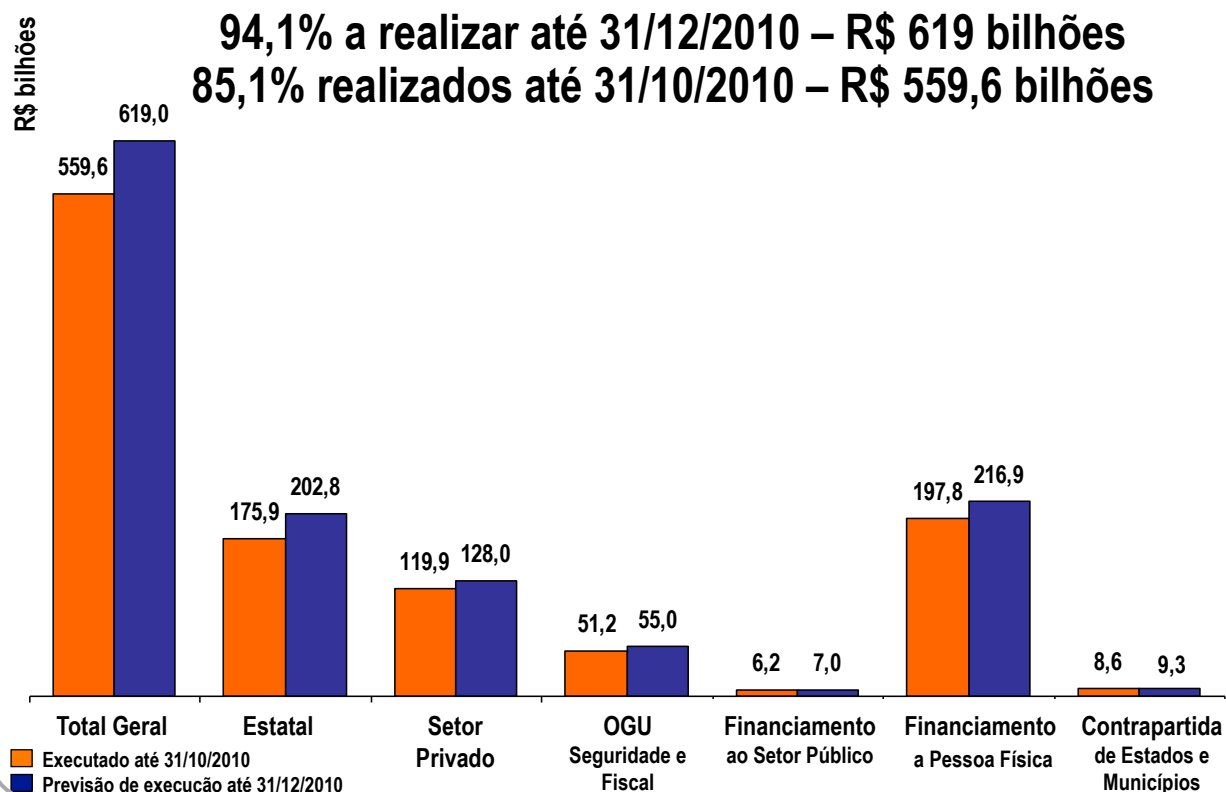


EVOLUÇÃO EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAC 2007-2010 OGU FISCAL E SEGURIDADE, ESTATAL E PRIVADO

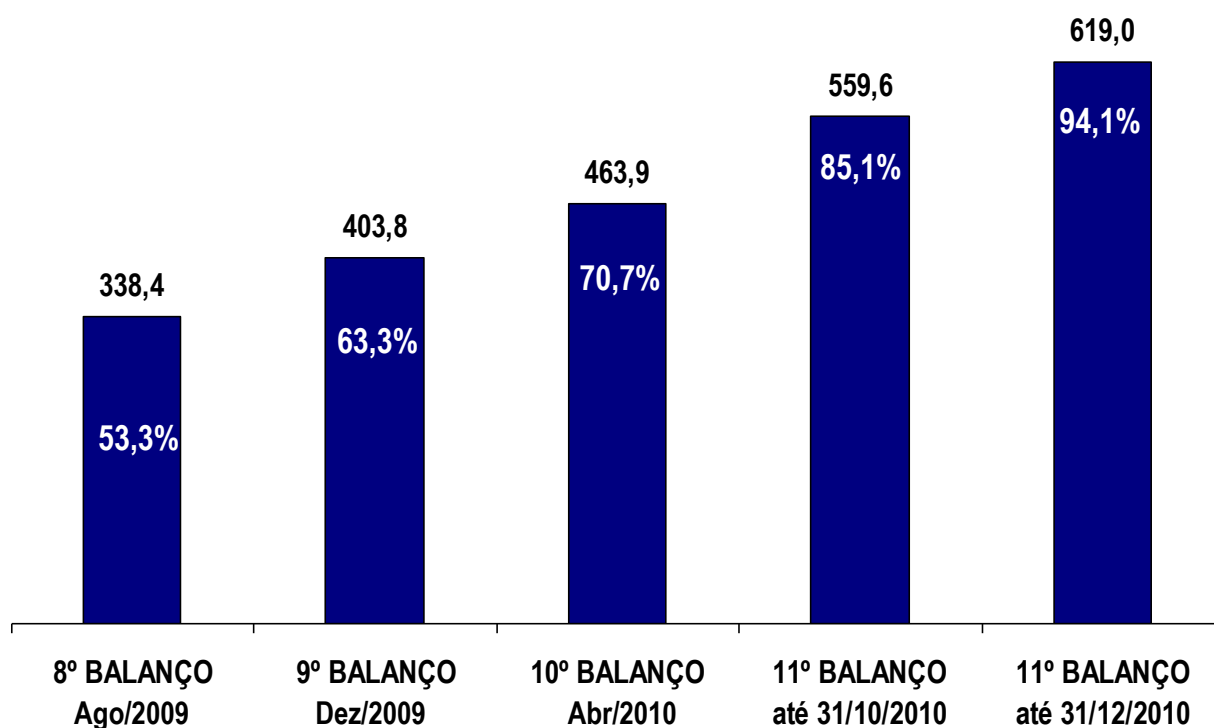

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC OGU Fiscal e Seguridade

Execução Orçamentária 2010 – R\$ bilhões

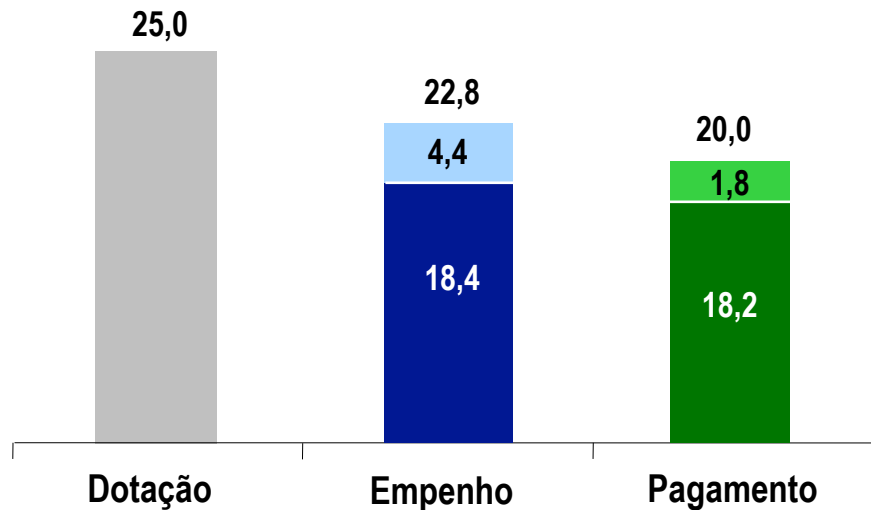


- Dotação total de 2010
- Empenho até 03/12/2010
- Previsão de empenho entre 3 e 31/12/2010
- Pagamento até 03/12/2010
- Previsão de pagamento entre 3 e 31/12/2010

Fonte: SOF

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC

Comparativo do Valor Empenhado – R\$ bilhões

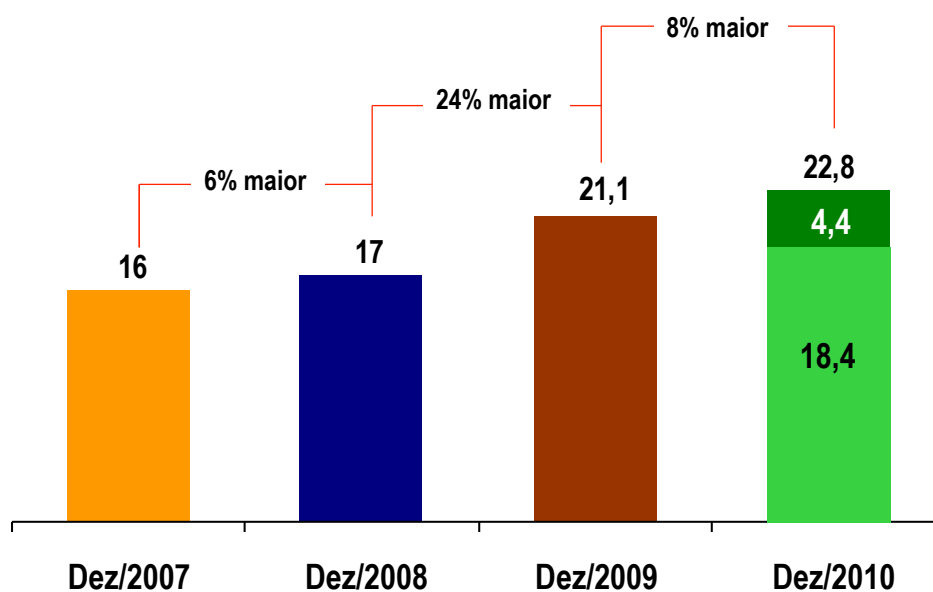


- Previsão de empenho entre 3 e 31/12/2010
- Empenho até 03/12/2010

Fonte: SOF

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC

Comparativo do Valor Pago* – R\$ bilhões

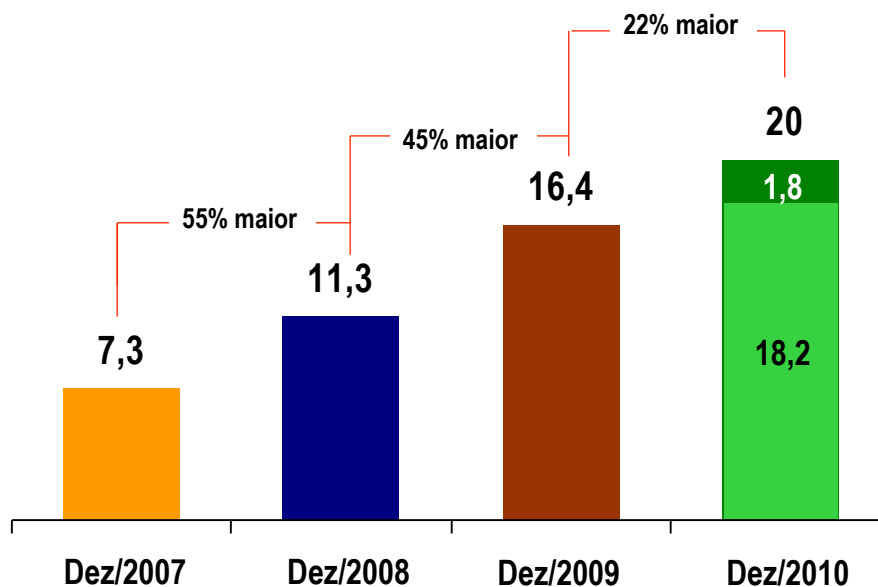

■ Previsão de pagamento entre 3 e 31/12/2010
 ■ Pagamento até 03/12/2010


*RAP + Exercício

Fonte: SOF

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2010

Geração, Transmissão, Petróleo e Gás e Combustíveis Renováveis

Estatual e Setor Privado – Comparativo do Valor Pago – R\$ bilhões 97% realizados

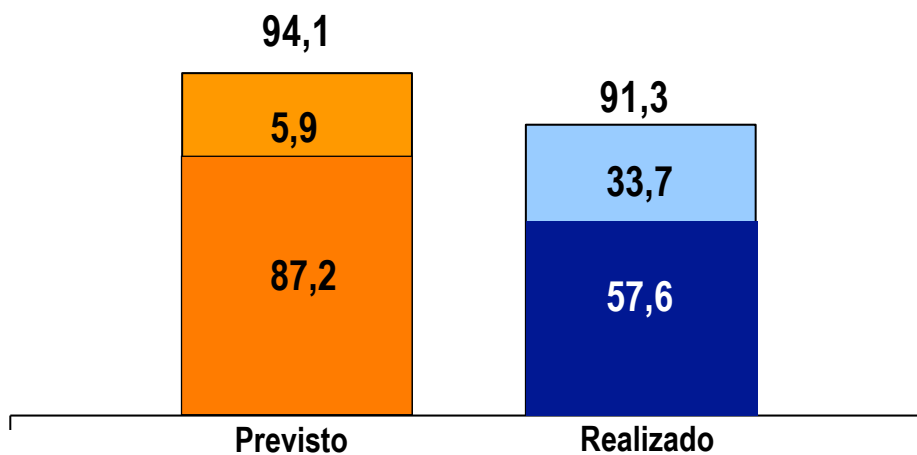

■ Previsão revista
 ■ Previsão original
 ■ Previsão de execução entre 3 e 31/12/2010
 ■ Executado até 31/10/2010

**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO





Ações
Concluídas



AÇÕES CONCLUÍDAS

Os empreendimentos concluídos no âmbito do PAC totalizarão R\$ 444 bilhões até dezembro de 2010. O valor representa 82% dos investimentos previstos, de R\$ 541,8 bilhões, para o período 2007-2010. Até outubro, esse percentual equivalia a 73,3% do previsto para esses quatro anos.

As obras em andamento seguem em ritmo acelerado. As que estão com execução física entre 76% e 99% representam mais de um terço (36,7%). Outros 29,5% das ações apresentam execução entre 51% e 75%. Isso significa que dois terços das obras (66,2%) registram execução física elevada.

O valor dos investimentos concluídos nos eixos Logística, Energia e Social e Urbano somará R\$ 225,2 bilhões até dezembro deste ano. Até outubro, o investimento alcançou R\$ 197,7 bilhões. Nas áreas de Habitação e Saneamento, as ações concluídas somarão R\$ 218,8 bilhões até dezembro de 2010, montante que chegou a R\$ 199,2 bilhões até outubro.

As ações concluídas em Logística chegarão a R\$ 65,4 bilhões até dezembro de 2010. Serão investidos R\$ 42,9 bilhões ao longo de 6.377 quilômetros de rodovias,

outros R\$ 3,4 bilhões em 909 quilômetros de ferrovias, além de R\$ 17 bilhões na Marinha Mercante. Nas Eclusas de Tucuruí (PA), inauguradas em 30 de novembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os investimentos totalizam R\$ 965,5 milhões.

No eixo Energia, as ações concluídas atingirão R\$ 148,5 bilhões até dezembro, com destaque para os R\$ 114,8 bilhões investidos em petróleo, gás natural e combustíveis renováveis e os R\$ 33,7 bilhões em geração e transmissão de energia.

As ações concluídas no eixo Social e Urbano somarão R\$ 230,1 bilhões até dezembro deste ano. O Programa Luz para Todos alcançou a meta original em 21 estados e a meta adicional em outros cinco. Os financiamentos habitacionais (Pessoa Física e SBPE) corresponderão a R\$ 216,9 bilhões, com 2,2 milhões de contratos firmados.


A distribuição dos empreendimentos concluídos do PAC por todas as regiões brasileiras confirma um dos objetivos originais do Programa, de promover a descentralização dos investimentos, combatendo as desigualdades regionais.



Perímetro de Irrigação São João • TO

CONCLUSÃO ORIGINAL DAS OBRAS DO PAC


Valor total do PAC 2007-2010 – R\$ 657,4 bilhões

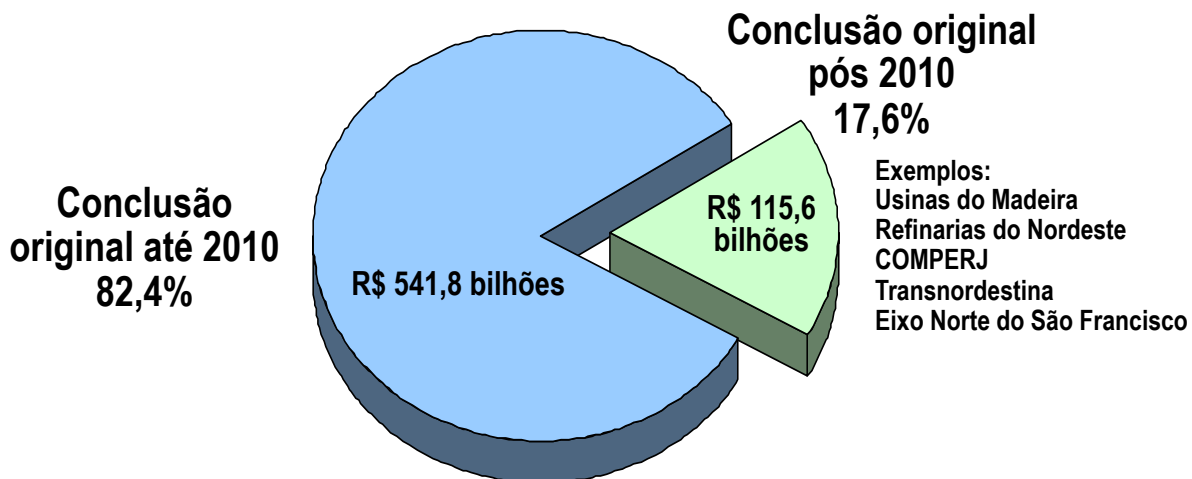

AÇÕES CONCLUÍDAS EM RELAÇÃO AO PREVISÃO CONCLUIR ATÉ 2010 – R\$ 541,8 BILHÕES


82% das ações concluídas até dez/10
73,3% das ações concluídas até out/10

| AÇÕES CONCLUÍDOS | R\$ bilhões | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | out/10 | dez/10 |
| Logística, Energia e Social e Urbano | 197,7 | 225,2 |
| Habitação e Saneamento | 199,2 | 218,8 |
| Total | 396,9 | 444,0 |

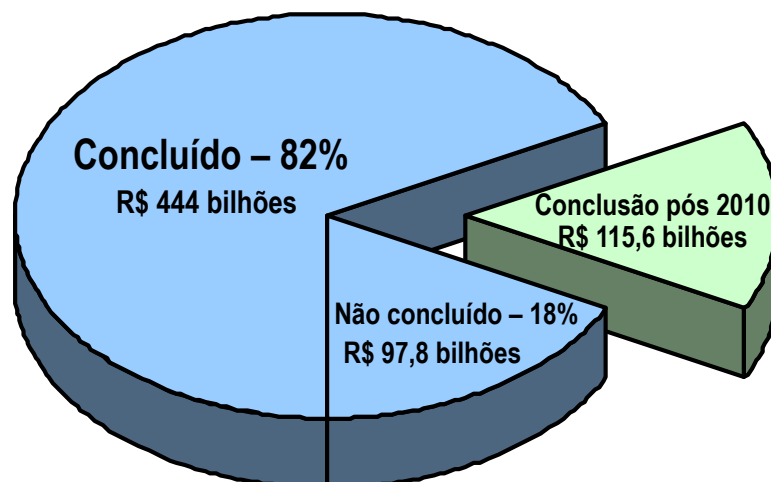

Obras em andamento

Faixas de execução

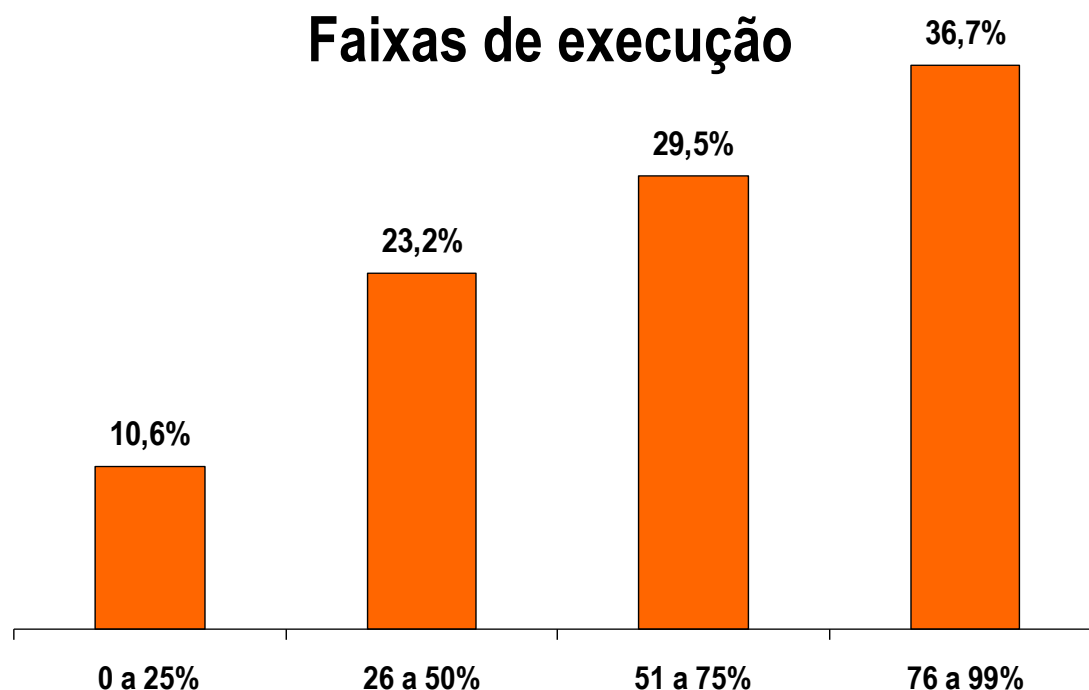

ações concluídas em relação ao valor total do PAC* até 2010 – R\$ 657,4 bilhões

67,5% das ações concluídas até dez/10
60,4% das ações concluídas até out/10

| AÇÕES CONCLUÍDAS | R\$ bilhões | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | out/10 | dez/10 |
| Logística, Energia e Social e Urbano | 197,7 | 225,2 |
| Habitação e Saneamento | 199,2 | 218,8 |
| Total | 396,9 | 444,0 |

*Valor total do PAC até 2010 inclui R\$ 115,6 bilhões de obras, que originalmente não estavam previstas terminar até 2010

82% DAS AÇÕES CONCLUÍDAS* – R\$ 444 BILHÕES

LOGÍSTICA – R\$ 65,4 bilhões

- Rodovias – 6.377 km – R\$ 42,9 bilhões
- Marinha Mercante – Financiamento de 301 embarcações e 5 estaleiros – R\$ 17 bilhões
- Ferrovias – 909 km – R\$ 3,4 bilhões
- Aeroportos – 12 empreendimentos em 10 aeroportos – R\$ 281,9 milhões
- Portos – 14 empreendimentos – R\$ 789,1 milhões
- Hidrovias – 10 terminais – R\$ 44,4 milhões e as Eclusas de Tucuruí – R\$ 965,5 milhões

ENERGIA – R\$ 148,5 bilhões


- Campos de Petróleo e Gás Natural – E&P – R\$ 57,1 bilhões
- Geração de Energia – 10.851 MW – R\$ 26,4 bilhões
- Refino – 16 empreendimentos – R\$ 23,6 bilhões
- Combustíveis Renováveis – 87 usinas – R\$ 10,1 bilhões
- Gasodutos – 3.776 km – R\$ 19,1 bilhões
- Transmissão de Energia – 9.139 km – R\$ 7 bilhões
- GNL – RJ e CE – 20 mil m³/ano – R\$ 3,1 bilhões
- Petroquímicas – R\$ 2,1 bilhões
- HBIO – 256 mil m³/ano – R\$ 55,3 milhões
- Estudos de Inventário – 24.736 MW – R\$ 46,3 milhões
- Estudos de Viabilidade – 14.789 MW – R\$ 216,5 milhões

SOCIAL E URBANO – R\$ 230,1 bilhões

- Financiamento Habitacional para Pessoa Física e SBPE – R\$ 216,9 bilhões
- Luz para Todos – alcance da meta original em 21 Estados e da adicional em 5 – R\$ 6,6 bilhões
- Recursos Hídricos – 23 empreendimentos, 7.945 cisternas em 54 municípios e obras de esgotamento sanitário em 23 municípios – R\$ 2 bilhões
- Saneamento – 1.225 empreendimentos – R\$ 1,5 bilhão
- Metrô – 3 empreendimentos – R\$ 2,7 bilhões
- Habitação – 374 empreendimentos – R\$ 353,5 milhões


*Previsão em 31/12/2010

AÇÕES CONCLUÍDAS Logística – Rodovias – R\$ 42,9 bilhões

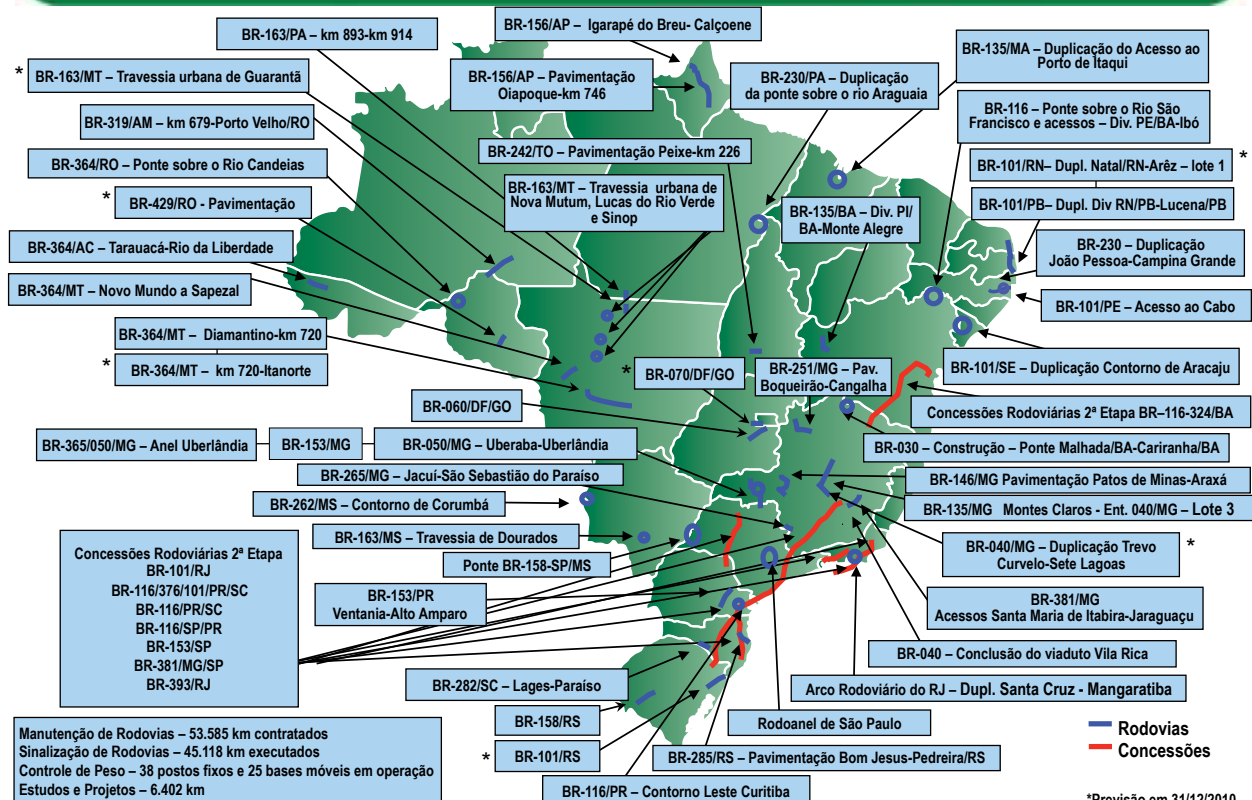

AÇÕES CONCLUÍDAS


Logística – Ferrovias, Portos, Hidrovias, Aeroportos e Marinha Mercante – R\$ 22,5 bilhões

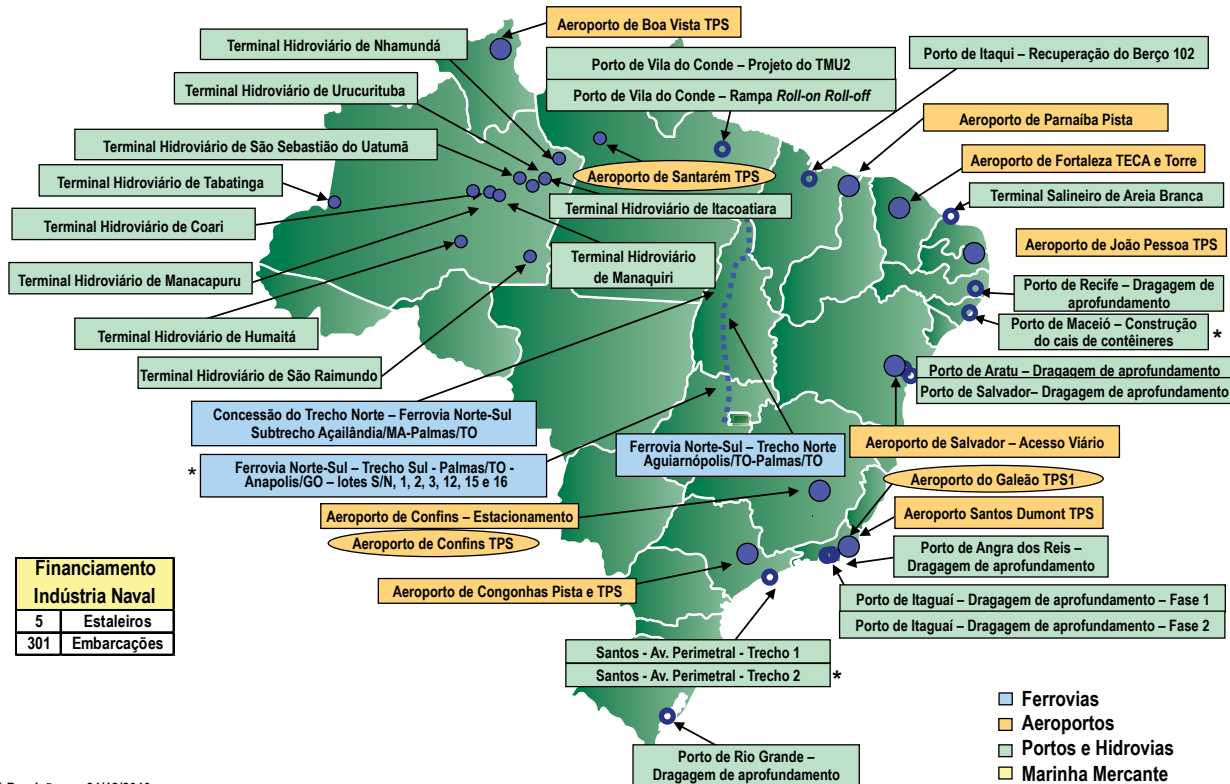

* Previsão em 31/12/2010

AÇÕES CONCLUÍDAS


Geração de Energia Elétrica – R\$ 26,7 bilhões

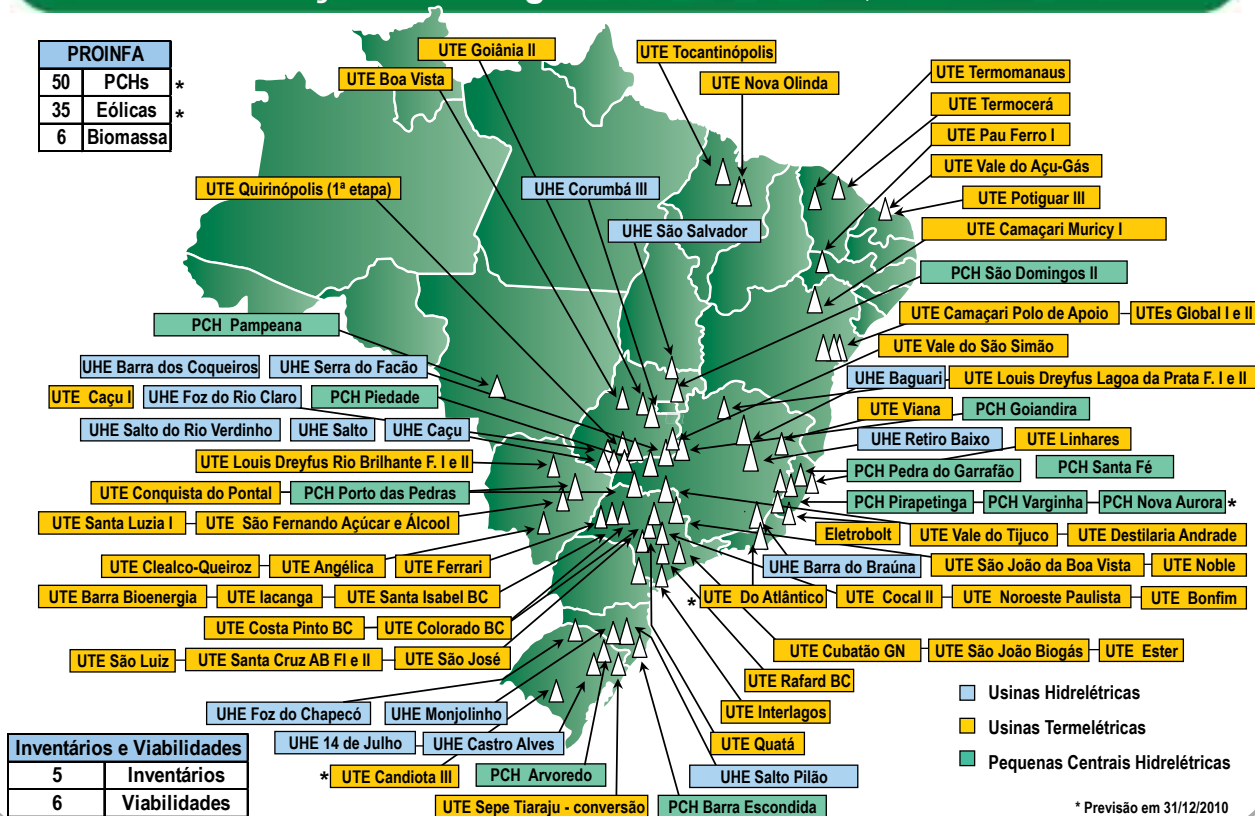

* Previsão em 31/12/2010


AÇÕES CONCLUÍDAS

Transmissão de Energia – R\$ 7 bilhões

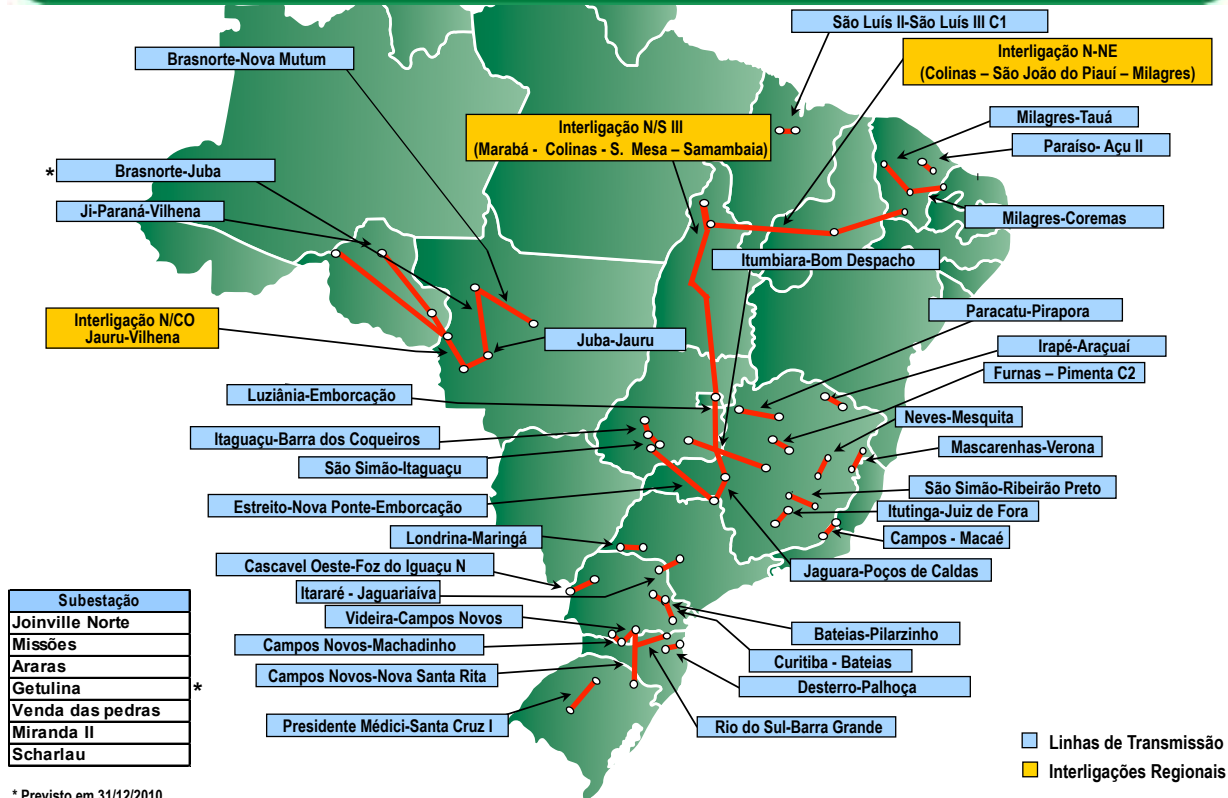



AÇÕES CONCLUÍDAS

Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis – R\$ 114,8 bilhões

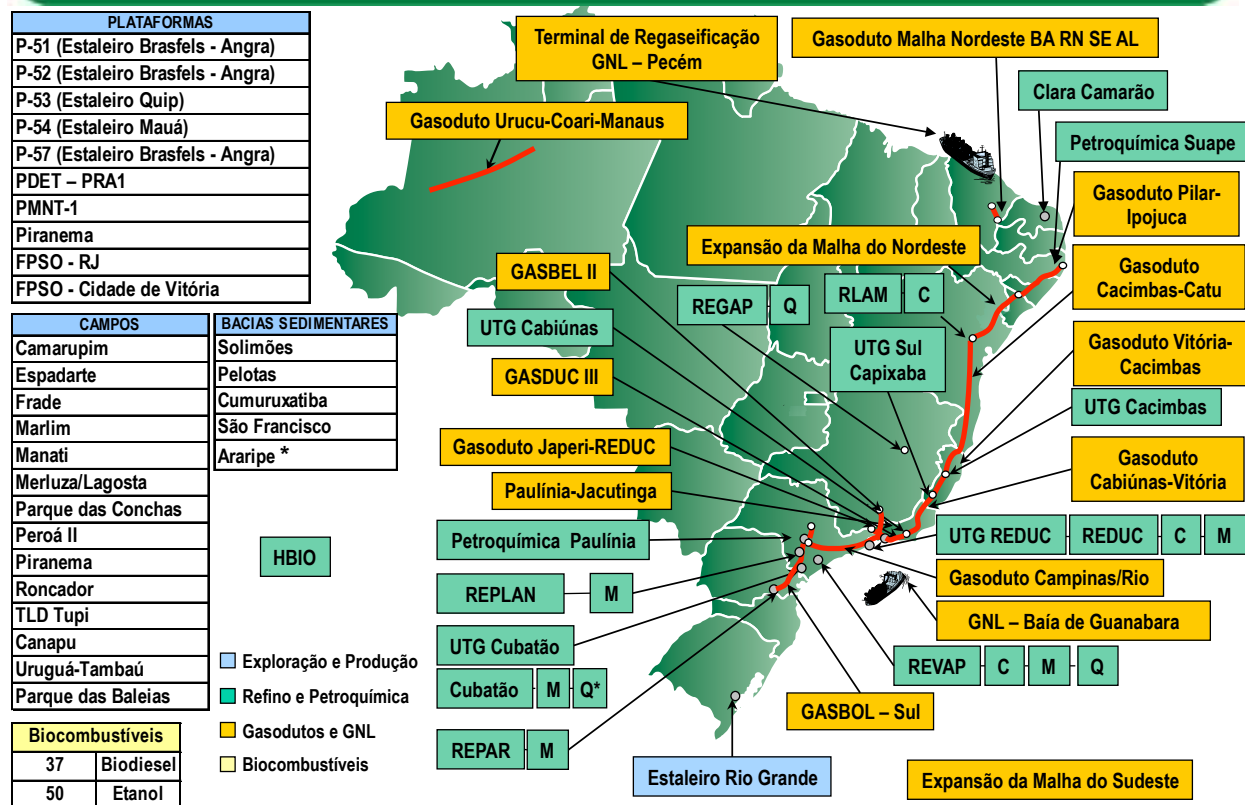


ações concluídas

Social e Urbano – R\$ 230,1 bilhões

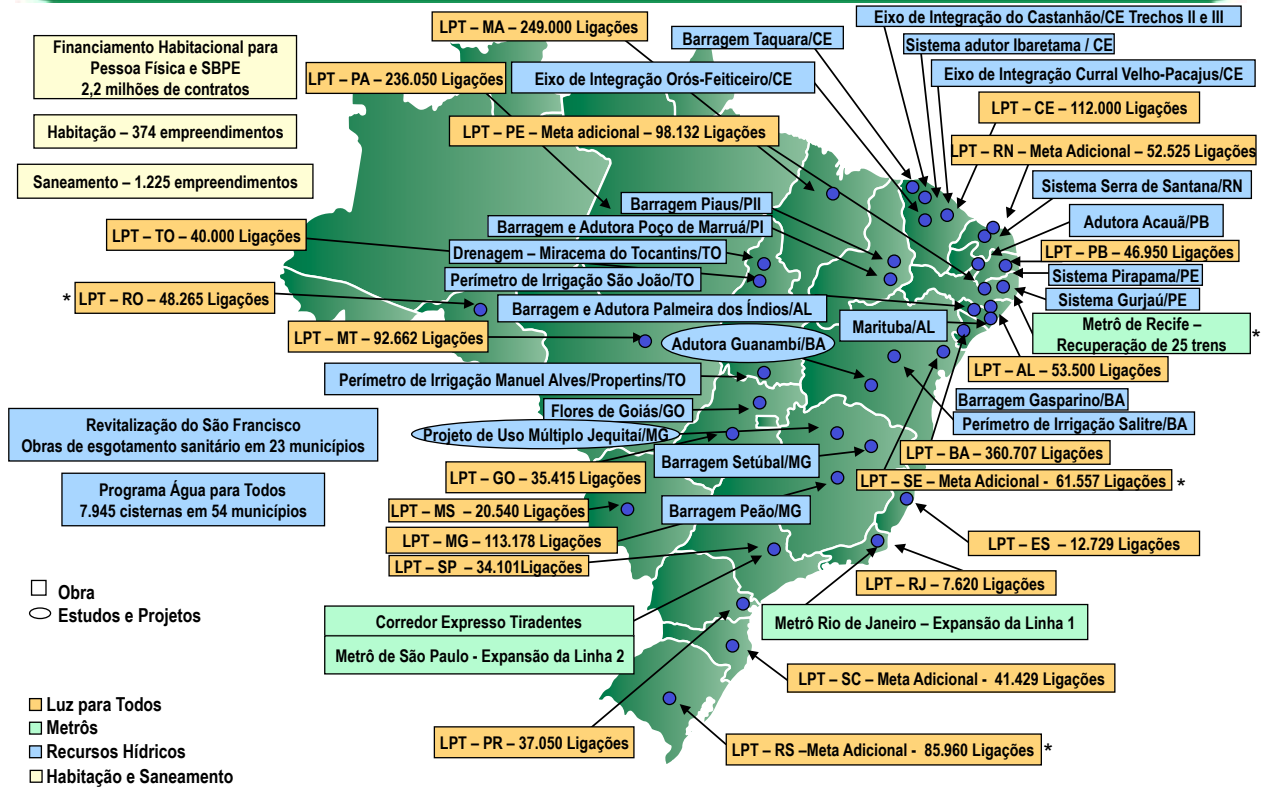

Terminal de Passageiros - Aeroporto de João Pessoa • PB



**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO



Petroleiro Celso Furtado • RJ



Evolução do Monitoramento

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO

Em outubro de 2010 estavam sendo monitoradas 2.561 ações do PAC. Este número não inclui ações das áreas de Saneamento e Habitação.

Considerando o valor do investimento previsto para o período 2007-2010, até 31 de outubro, 48% das ações foram concluídas, 49% eram executadas em ritmo adequado e 3% necessitavam de atenção.

Pelo critério de quantidade, as ações concluídas no mesmo período representavam 62% do total e as com andamento adequado, 30%. Já as que merecem atenção eram 6% e as com execução preocupante, 2%.

Em relação à evolução do estágio das ações monitoradas desde o início do PAC, por valor, em 31 de outubro, 56% estavam concluídas e 44% em obras.

Dos empreendimentos incluídos no PAC após 2008, as ações concluídas equivalem a 48% em valor. Em obras, há 31%, em licitação 20% e em fase de projeto ou licenciamento, 1%.

Em quantidade, a evolução do estágio das ações acompanhadas desde 2007 mostra que, em 31 de outubro de 2010, 76% haviam sido concluídas, 17% estavam com obras em andamento, 3% em licitação e 4% em fase de licenciamento ou projeto.

Das ações incluídas após 2008, 28% foram concluídas por quantidade, 45% estão em obras, 22% em licitação da obra e 5% em fase de projeto ou licenciamento.

Os dados demonstram que a maioria absoluta das obras do PAC saiu do papel. São ações que já estão contribuindo para o desenvolvimento do País.



Saneamento Integrado - Bacia do Maranguapinho - Maracanaú • CE

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DO PAC


Dezembro/2009 – 2.471 ações monitoradas

Abril/2010 – 2.483 ações monitoradas

Outubro/2010 – 2.561 ações monitoradas devido a desmembramentos


Não inclui Saneamento e Habitação

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES MONITORADAS

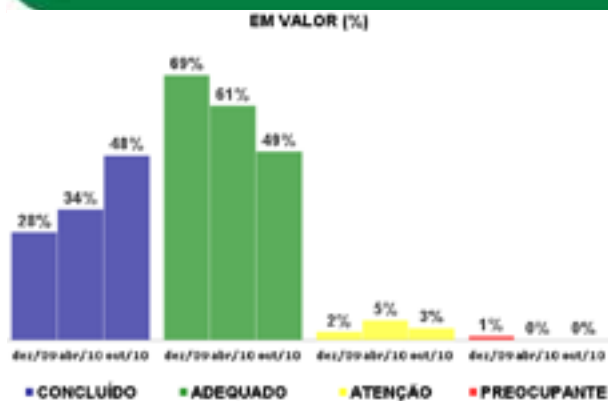


Posição: 31 de outubro de 2010
Não inclui Saneamento e Habitação

EVOLUÇÃO DO ESTÁGIO DAS AÇÕES MONITORADAS Em valor

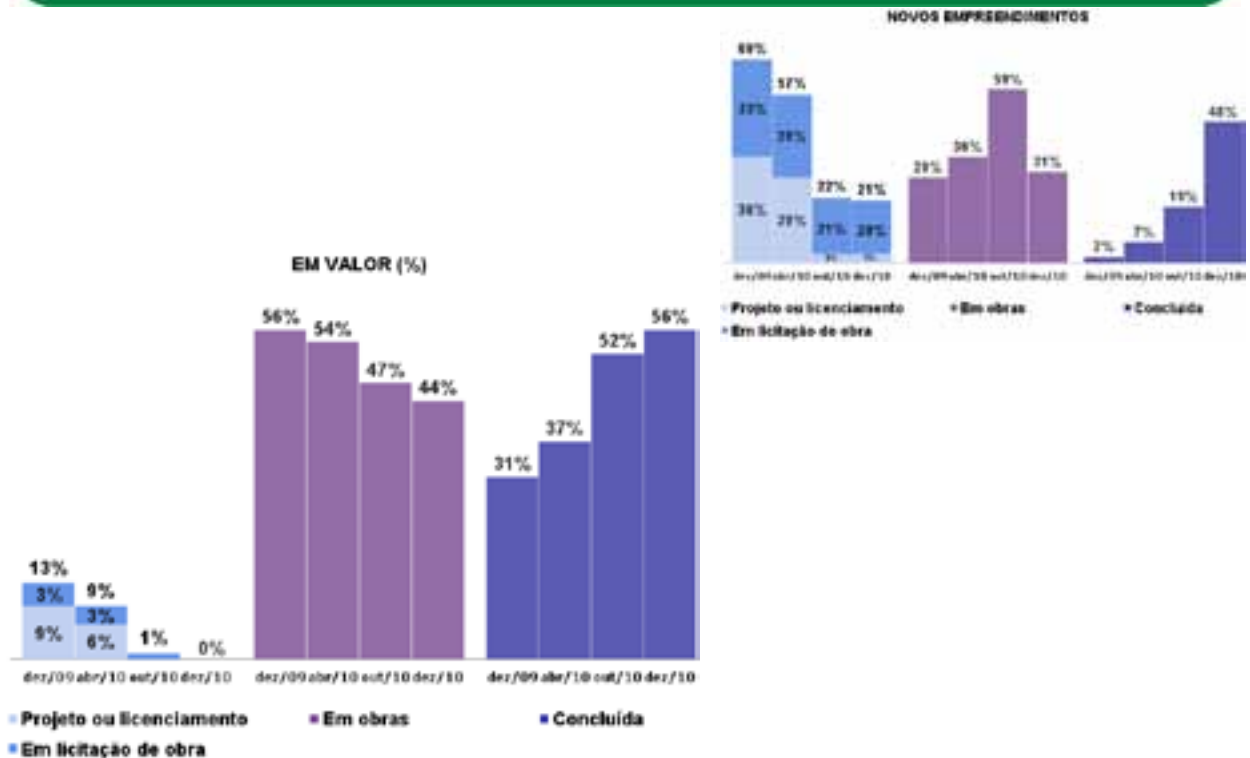

Não inclui Saneamento e Habitação


EVOLUÇÃO DO ESTÁGIO DAS AÇÕES MONITORADAS Em quantidade

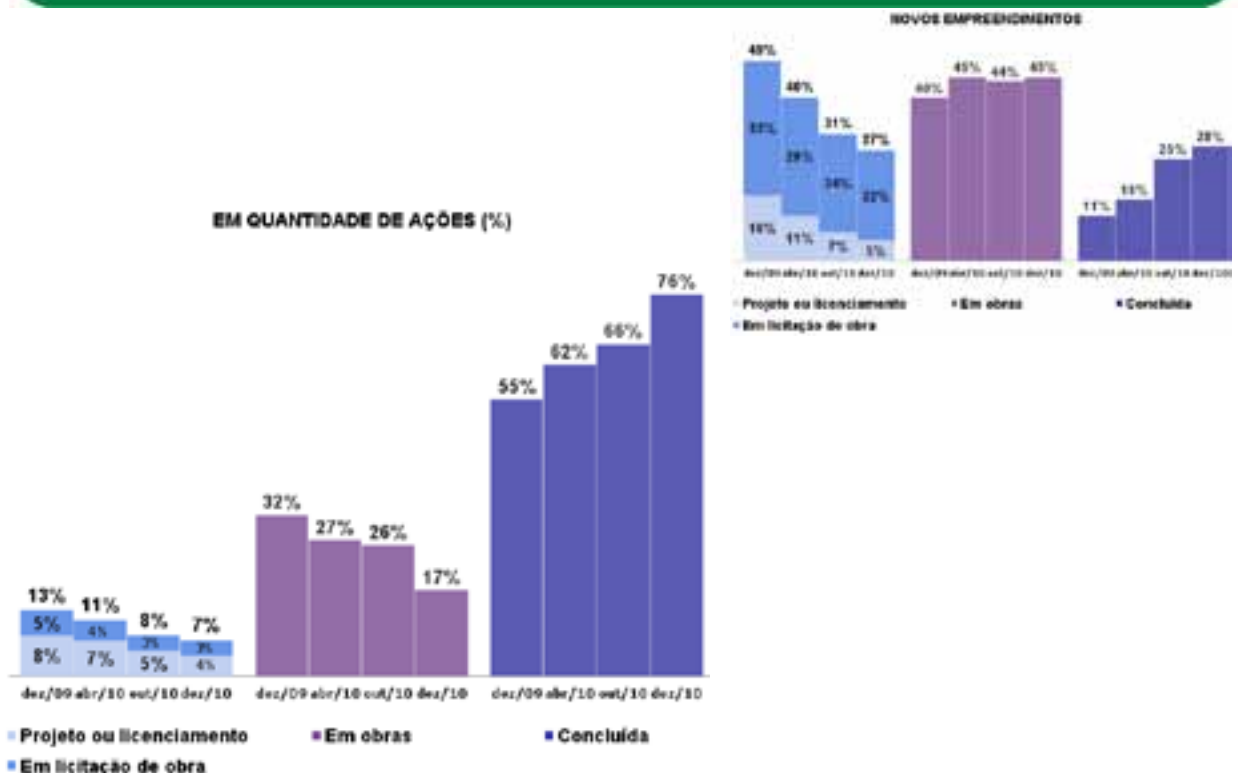

Não inclui Saneamento e Habitação



Gastau - Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté • SP

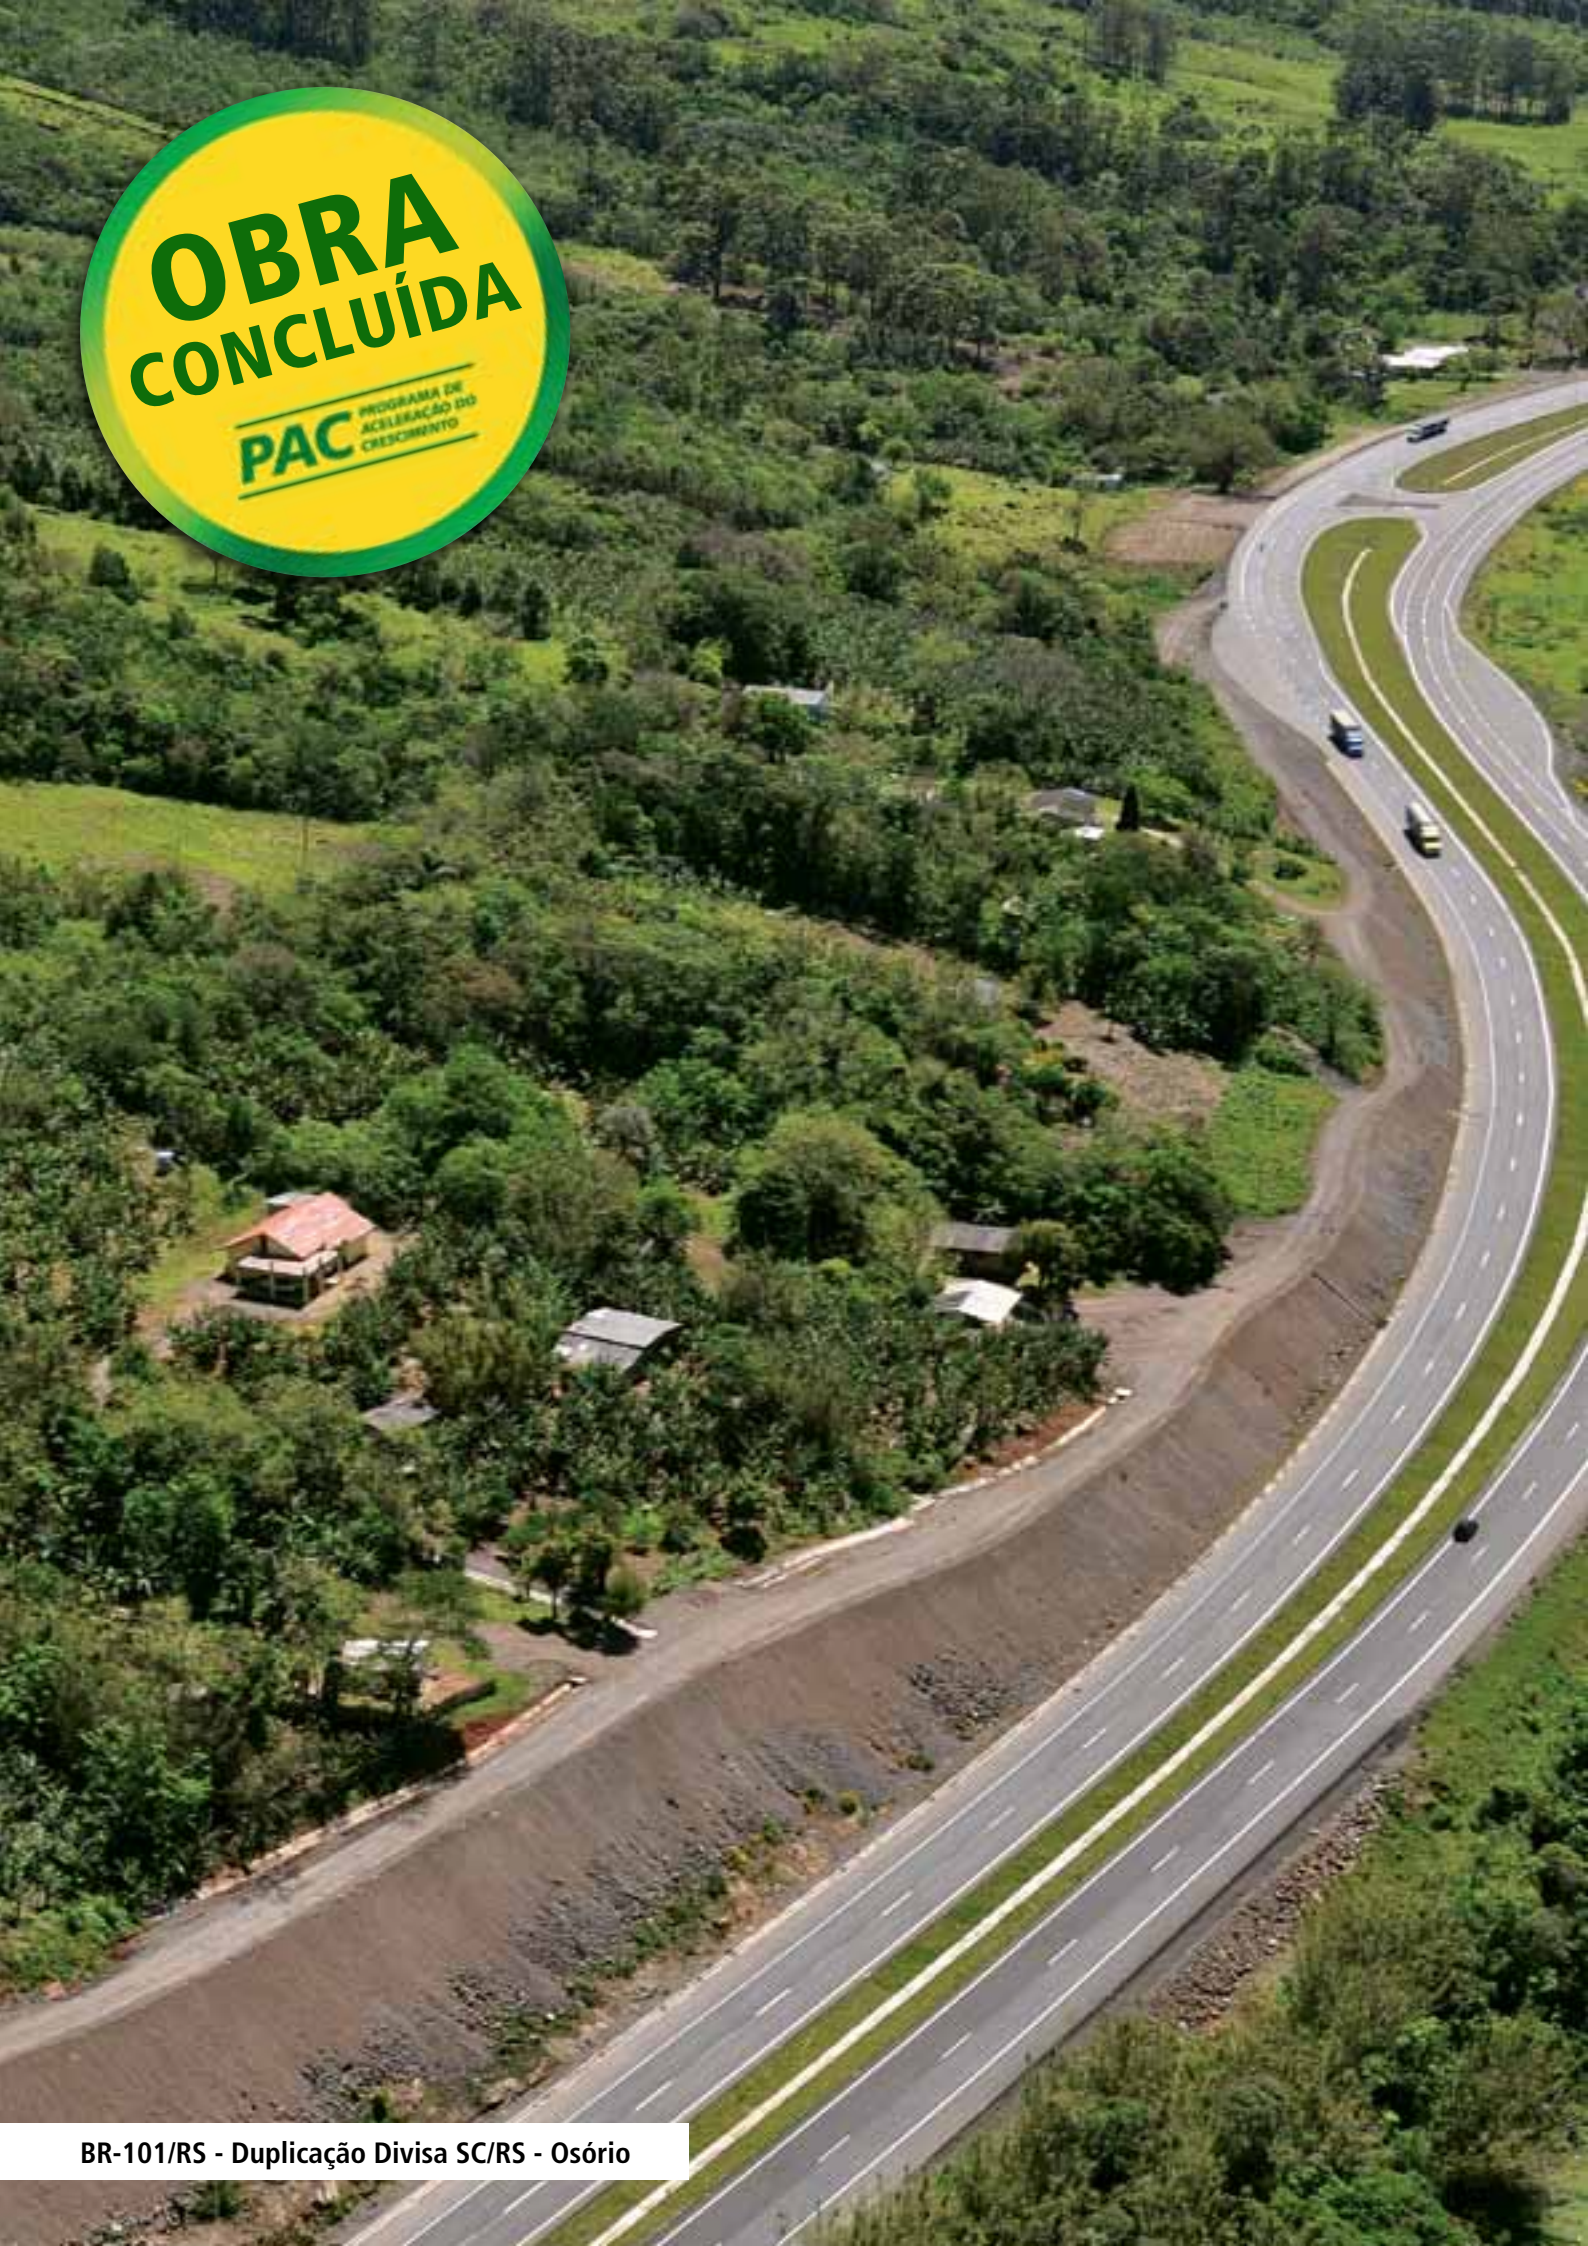

BR-101/RS - Duplicação Divisa SC/RS - Osório



4

Infraestructura
Logística

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

No final de outubro de 2010 eram monitoradas 1.651 ações do eixo de Logística. A evolução das ações neste eixo mostra que, por valor, 73% foram concluídas e 23% estão com execução adequada, enquanto 3% merecem atenção e 1% está em situação preocupante.

Pelo critério de quantidade, o índice de concluídas é de 70% e o de ações em ritmo adequado, de 24%. As ações em atenção somam 4% e as com situação preocupante, 2%.

Em relação à evolução do estágio das ações monitoradas desde 2007, por valor, 82% foram concluídas e 16% estão em obras. Há, ainda, 1% em licitação e 1% em licenciamento ou projeto.

Dos empreendimentos incluídos no PAC após 2008, 27%, em valor, foram concluídos e 66% estão em obras. Outros 5% estão em licitação e 2% em licenciamento ou projeto.

Pelo critério de quantidade, 85% das ações do eixo de Logística foram concluídas, 10% estão em obras, 2% em licitação e 3% em projeto ou licenciamento.

No grupo de ações que foram incluídas após 2008, considerando a quantidade, 30% foram concluídas, 59% estão em obras, 6% em licitação da obra e 5% em fase de projeto ou licenciamento.



INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Evolução do Monitoramento do PAC



Dezembro/2009 – 1.575 ações monitoradas

Abril/2010 – 1.587 ações monitoradas

Outubro/2010 – 1.651 ações monitoradas devido a desmembramentos

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA


Evolução da Situação das Ações Monitoradas

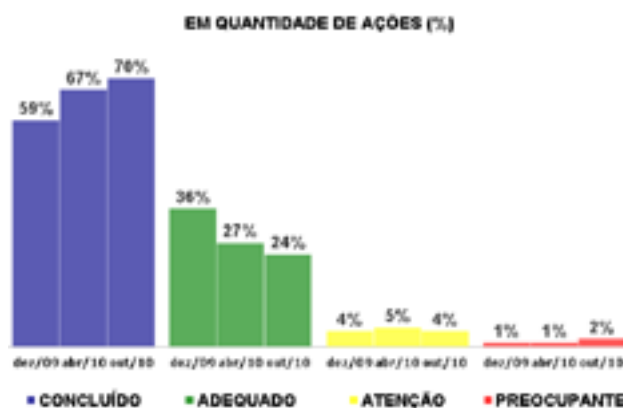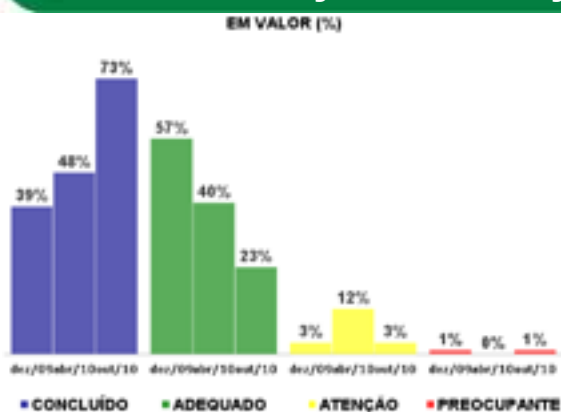

Posição: 31 de outubro de 2010


INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Valor

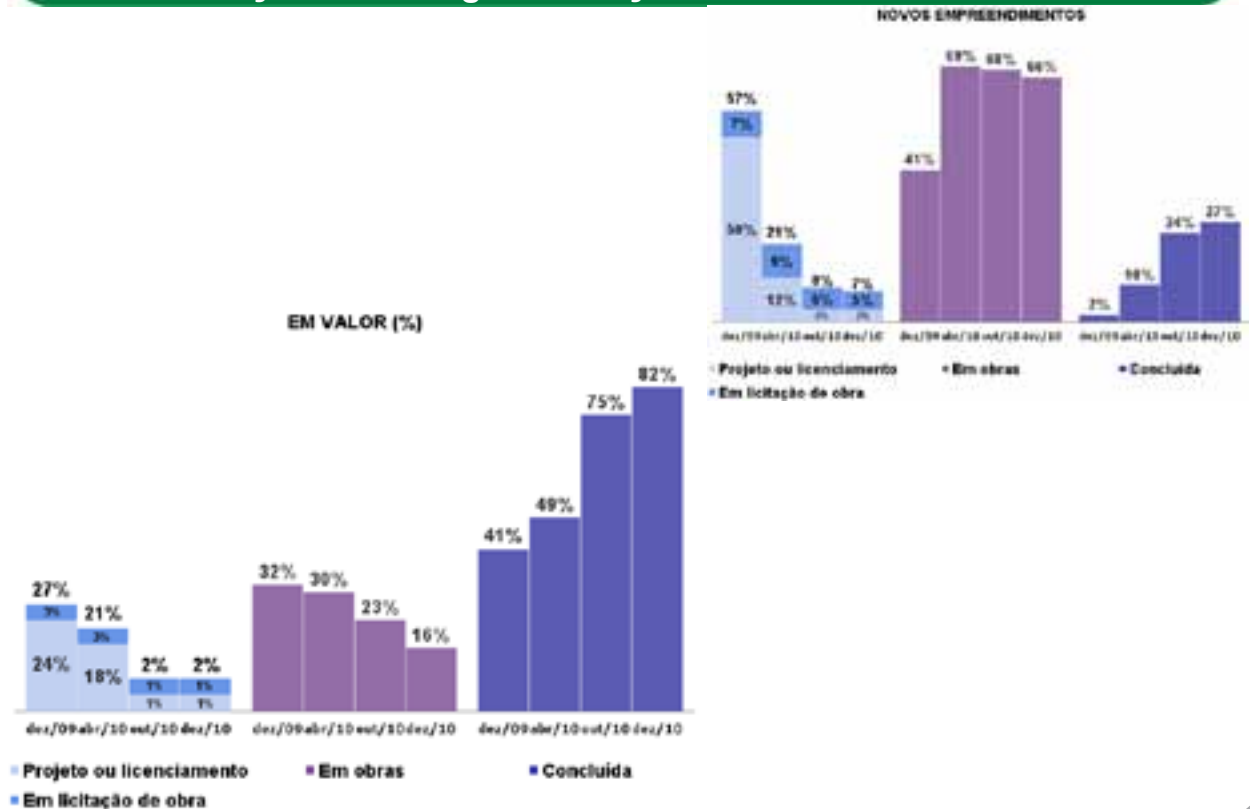

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Quantidade

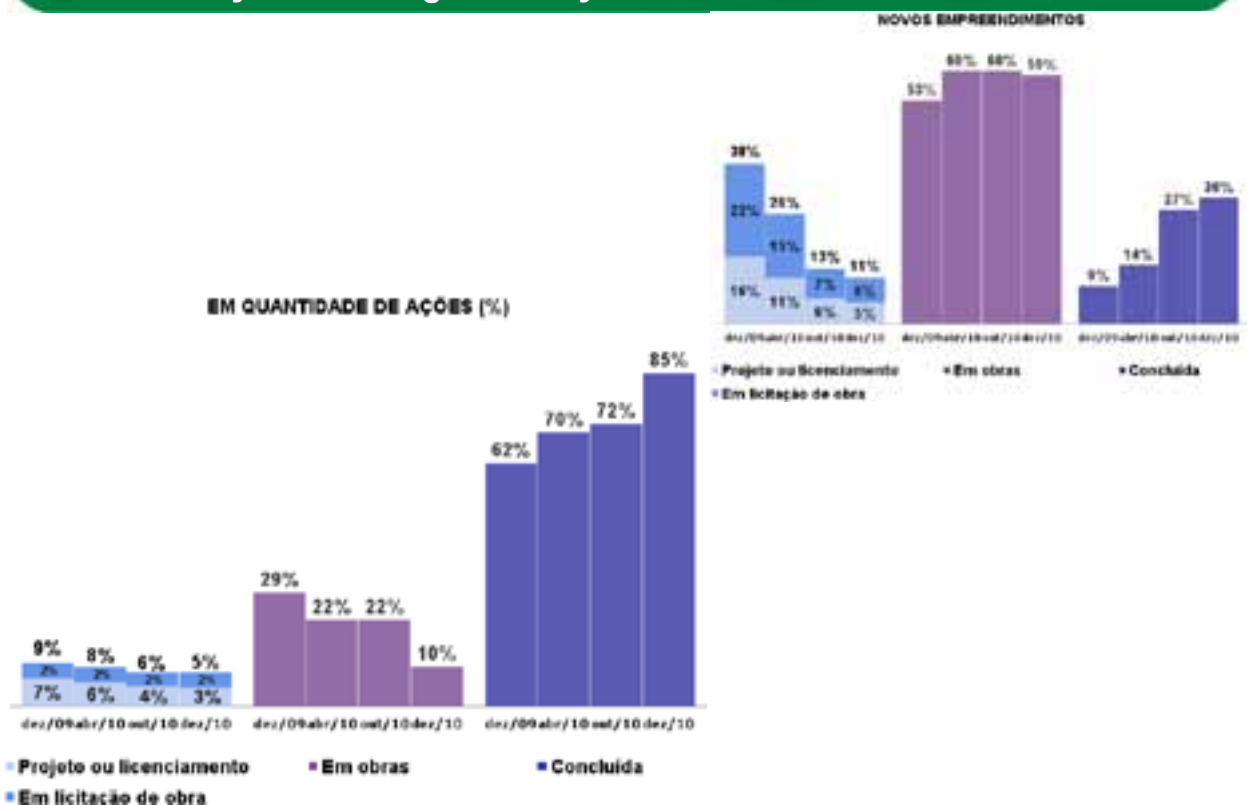


RODOVIAS




RESULTADOS 2007 A 2010

RODOVIAS – REGIÃO NORTE

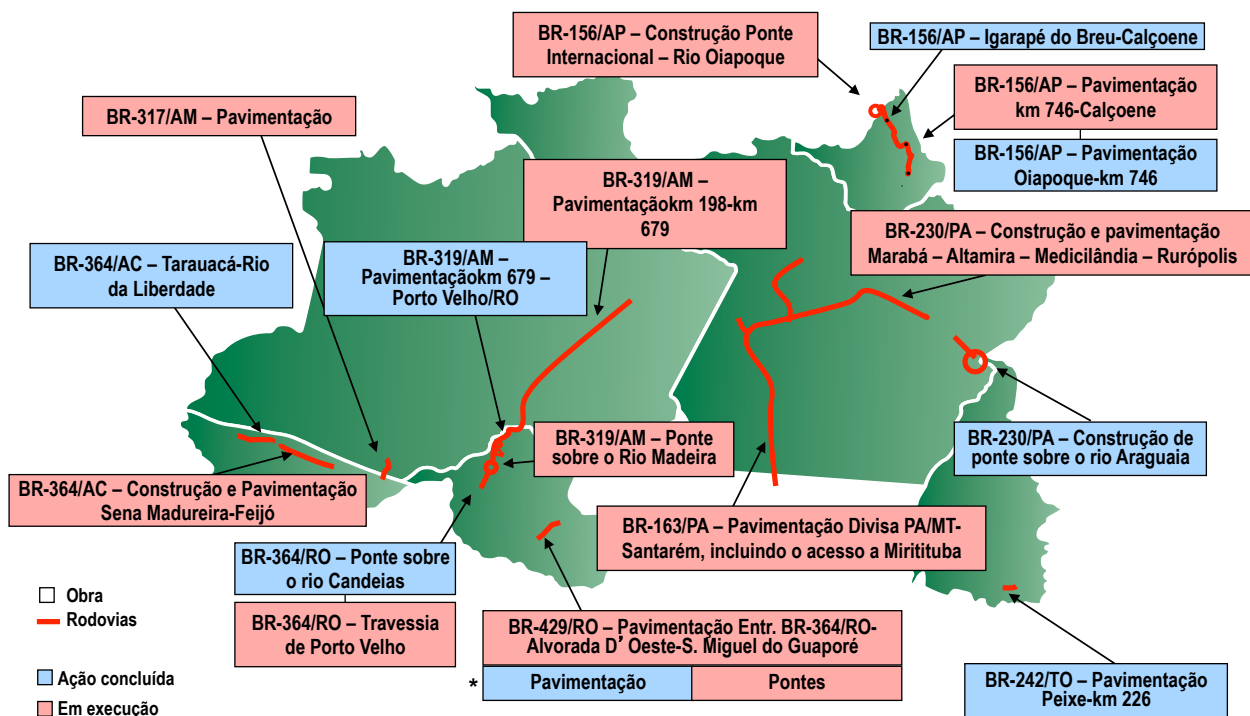


*Previsão em 31/12/2010


RODOVIAS – REGIÃO NORDESTE

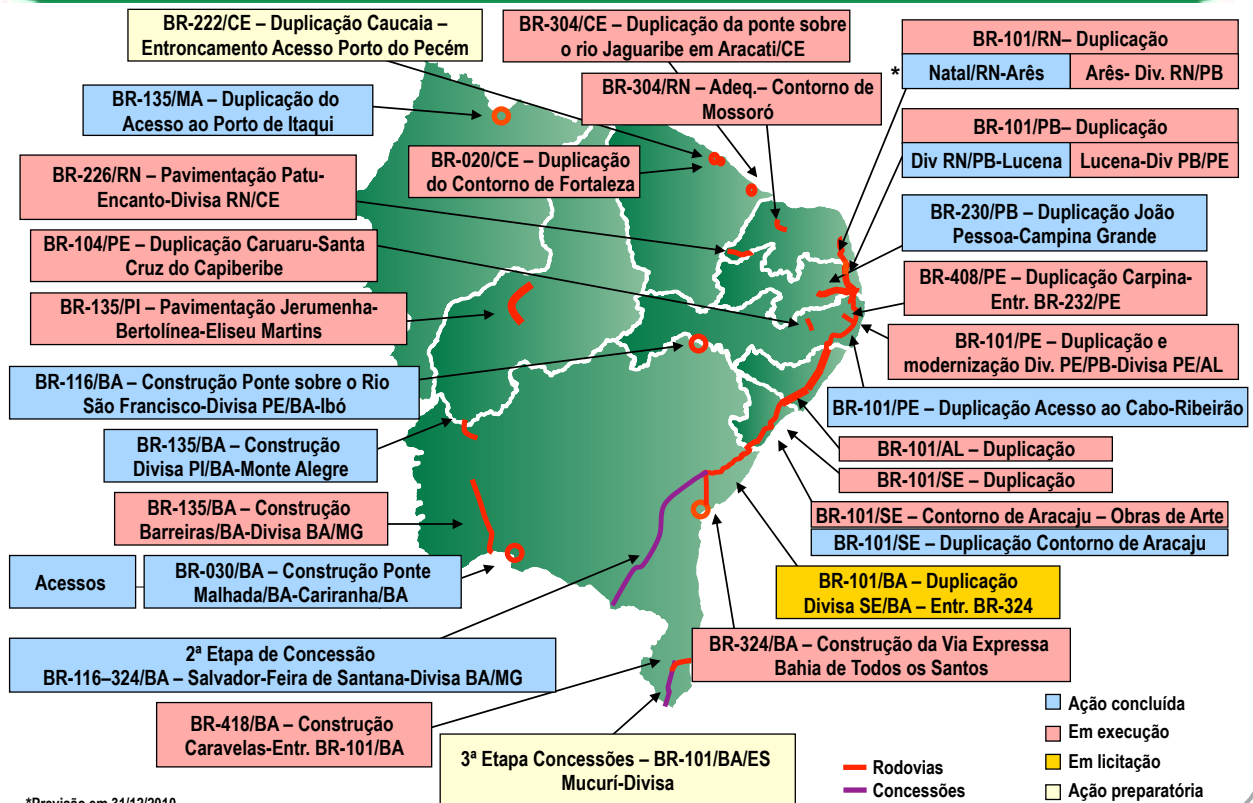


RODOVIAS – REGIÃO SUDESTE

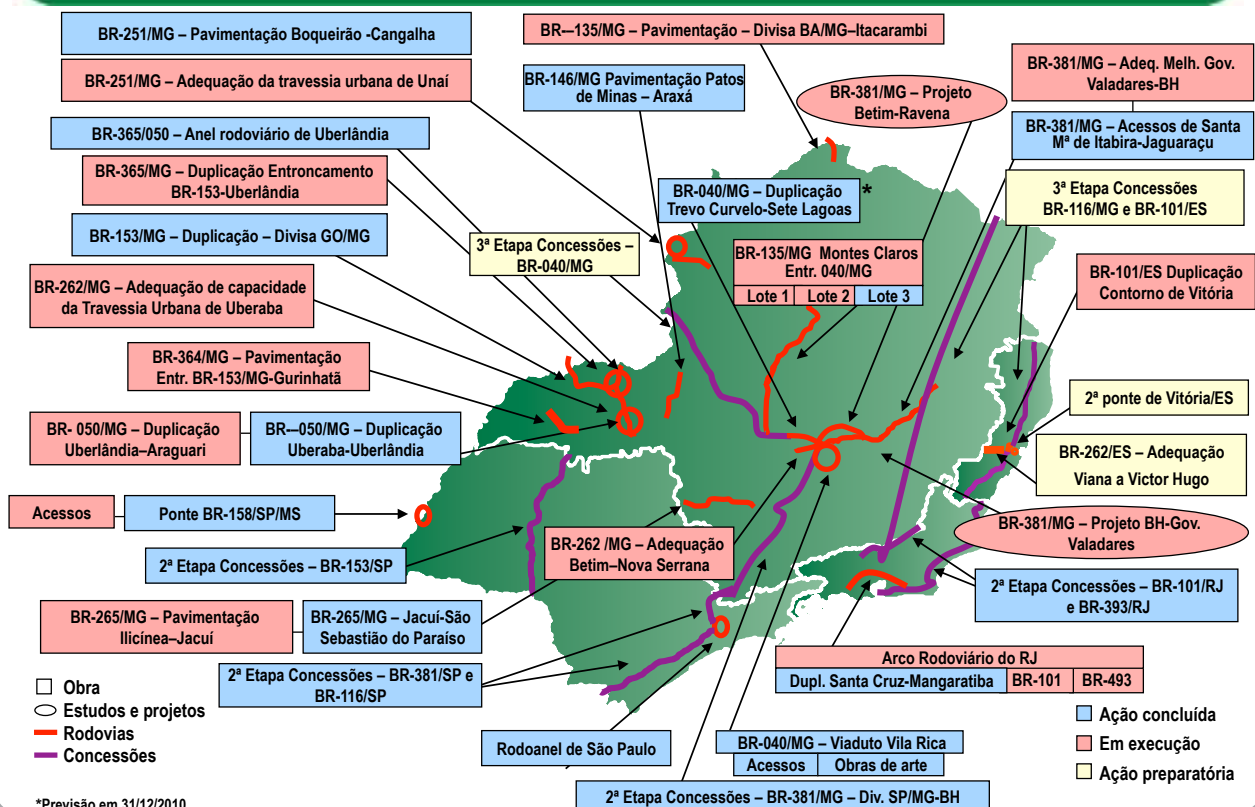

RODOVIAS – REGIÃO SUL

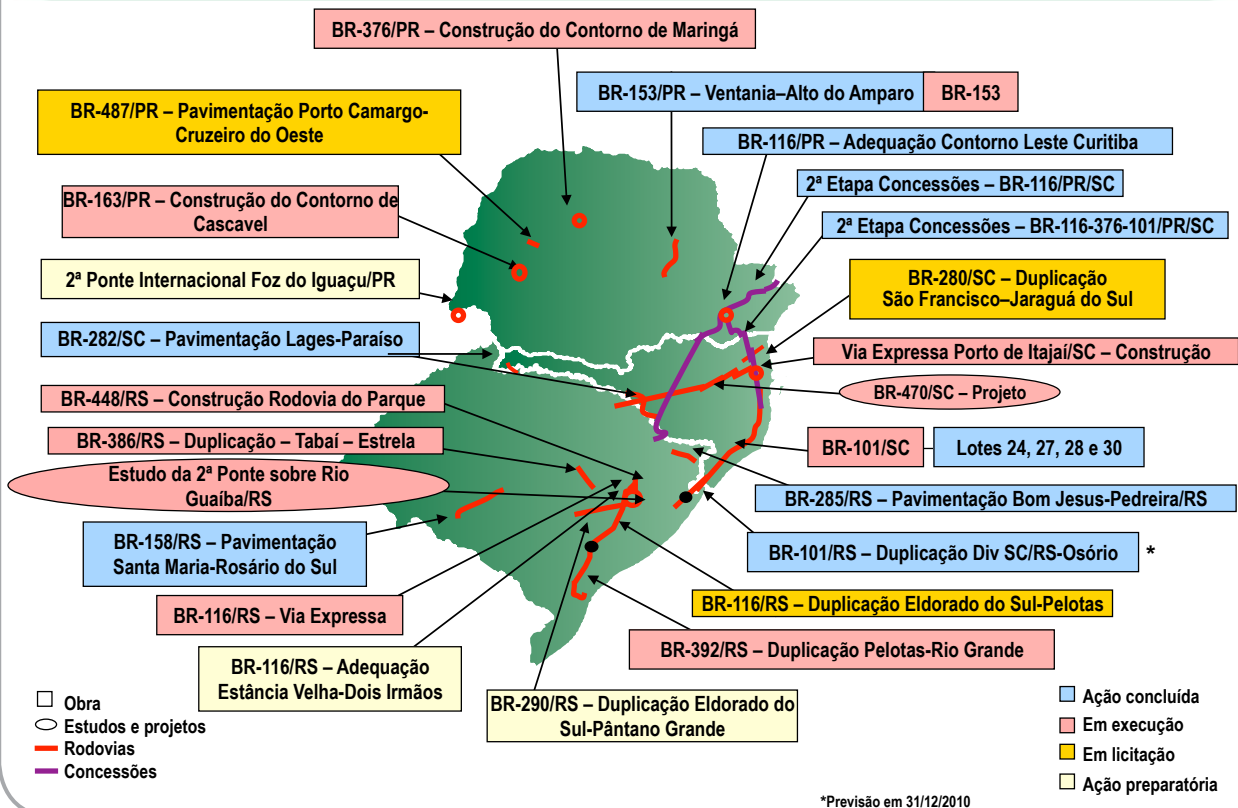

RODOVIAS – REGIÃO CENTRO-OESTE

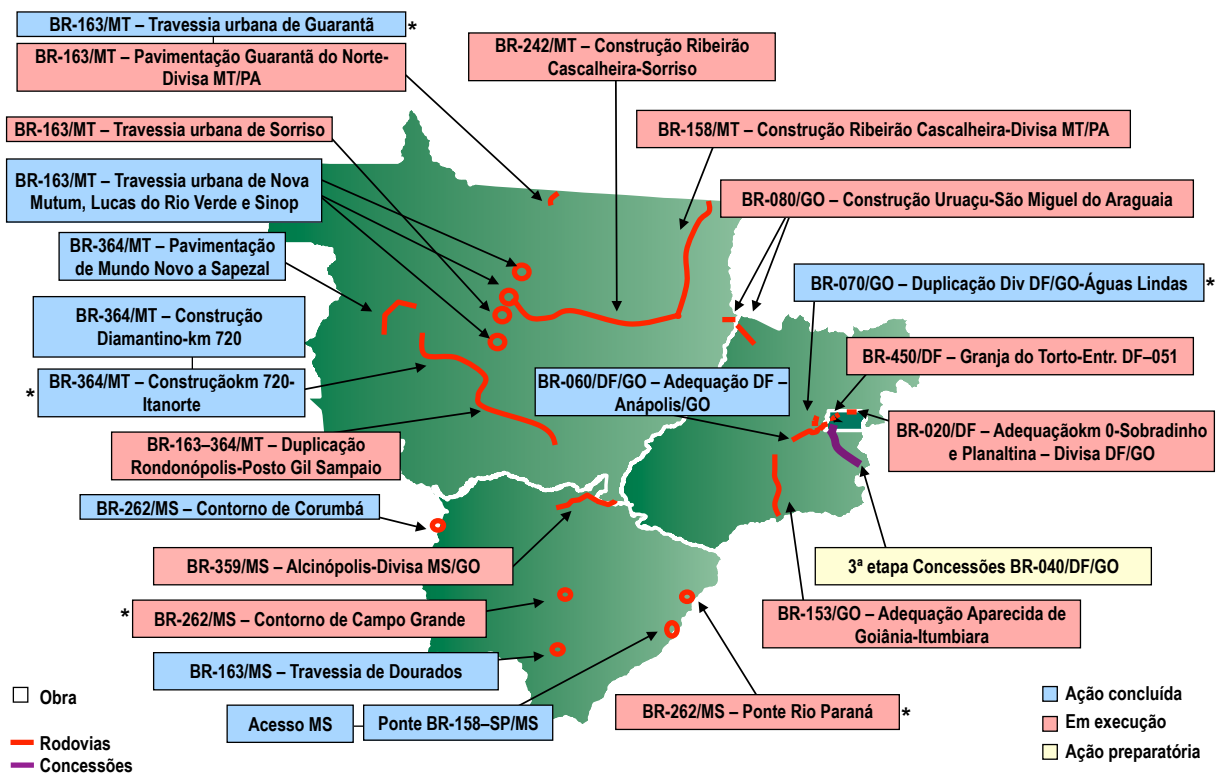

RODOVIAS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras concluídas* – 6.377 km

Destaques

Duplicação/Adequação* – 1.306 km

- BR-101/RN – Natal-Arês – 46 km*
- BR-101/PE – Acesso Cabo-Ribeirão – 51 km
- BR-050/MG – Uberaba-Uberlândia – 100 km
- BR-101/RJ – Santa Cruz-Mangaratiba – 26 km
- BR-101/RS – Divisa SC/RS-Osório – 89 km*
- BR-163/MT – Travessia de Lucas do Rio Verde – 3 km
- BR-101/PB – Divisa RN/PB-Lucena//PB – 74 km
- BR-135/MA – Acesso ao Porto de Itaqui – 15 km
- BR-040/MG – Curvelo-Sete Lagoas – 48 km*
- BR-101/SC – Palhoça-Divisa SC/RS – 4 Lotes– 107 km
- BR-116/PR – Contorno Leste Curitiba – 32 km
- BR-116/RS – Complexo Viário de Canoas – 1 km
- BR-060/GO/DF – Brasília-Divisa DF/GO – 94 km
- BR-163/MT – Travessias de Sinop e Nova Mutum – 19 km*

Pavimentação/Construção* – 1.789 km

- BR-163/PA – km 914-km 893 – 21 km
- BR-319/AM/RO – Humaitá-Porto Velho – 198 km
- BR-242/TO – Peixe-km 233 – 57 km
- BR-324/BA – Rótula do Abacaxi – 2,5 km
- Rodoanel de São Paulo – 61 km
- BR-364/MT – Diamantino-Itanorte – 185 km*
- BR-020/DF – Colorado-Divisa DF/GO – 44 km*
- BR-156/AP – Igarapé do Breu-Calçoene – 85 km
- BR-156/AP – Calçoene-Oiapoque – Lote 4 – 56 km
- BR-230/PA/TO – Ponte sobre o rio Araguaia – 1 km
- BR-135/PI – Jerumenha-Bertolínea – 79 km
- BR-146/MG – Patos de Minas-Araxá – 115 km
- BR-282/SC – Lajes-Paraíso – 133 km
- BR-364/MT – Mundo Novo-Sapezal – 106 km

Concessão de rodovias – 3.282 km

- 2ª Etapa de Concessões – Fase 1 – MG/SP/RJ/PR/SC – 2.601 km – deságio médio de 46,4%
- 2ª Etapa de Concessões – Fase 2 – BA – 681 km

*Previsão em 31/12/2010

RODOVIAS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras de duplicação em andamento* – 1.592 km

Destaques

- BR-101/Nordeste
 - Lucena/PB-Divisa PB/PE – 55 km – 85% realizados*
 - Arês/RN-Divisa RN/PB – 35 km – 94% realizados*
 - Divisa PB/PE-Igarassu/PE – 41 km – 81% realizados*
 - Ribeirão/PE-Palmares/PE – 40 km – 92% realizados*
- Arco Rodoviário do Rio de Janeiro – BR-493 – Entr. BR-040–Entr. BR-101 – 71 km – em andamento 48% de terraplanagem e 30 Obras de Arte Especiais*
- BR-101/ES – Contorno de Vitória – 19 km – 86% realizados*
- BR-262/MG – Betim-Nova Serrana – 83 km – 90% realizados*
- BR-050/MG – Duplicação – Uberlândia-Araguari – 33 km – 20% realizados*
- BR-101/SC – Palhoça/SC-Divisa SC/RS – Lotes 22, 23, 25, 26 e 29 – 141 km – 50% realizados*
- BR-392/RS – Pelotas-Rio Grande – km 8-km 60 – 52 km – 20% realizados*
- BR-386/RS – Duplicação – Tabai-Estrela – 38 km – obra iniciada

*Previsão em 31/12/2010

RODOVIAS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras de construção e pavimentação em andamento* – 3.524 km

Destaques

- BR-163/PA – Santarém-Rurópolis – 125 km – 41% realizados*
- BR-163/PA – Divisa MT/PA-Guarantã do Norte-Travessia Guarantã – 53 km – 70% realizados*
- BR-319/AM
 - km 198-km 250 – 52 km – 27% realizados*
 - Ent. BR-230 – Humaitá – 29 km – 70% realizados
- BR-364/AC – Sena Madureira-Feijó – 225 km – 60% realizados*
- BR-230/PA – Marabá-Altamira-Medicilândia – 139 km – obra iniciada
- BR-135/BA – São Desidério-Correntina – 138 km – 82% realizados*
- Via Expressa Baía de Todos os Santos – 4,3 km – 55% realizados*
- BR-135/MG – Divisa BA/MG-Manga – 82 km – obra iniciada
- BR-448/RS – Sapucaia-Porto Alegre – 22 km – 10% realizados*
- BR-359/MS – Silvolândia-Divisa MS/GO – 224 km – 60% realizados*

*Previsão em 31/12/2010

RODOVIAS

Principais Resultados – 2007 a 2010


- **Manutenção – Extensão da Malha Contratada – 53.652 km**
- **Sinalização – Executados* – 53.890 km**
- **Controle de Peso**
 - 41 postos fixos e 28 bases móveis em operação*
 - Monitoramento por sistema CFTV (internet), em tempo real, de 10 postos de pesagem (RO/PE/BA/MT/MS/GO/MG/ES/RS/SC)
- **Estudos e projetos de restauração e manutenção – CREMA**
 - Realizados* – 17.639 km
 - CREMA 1ª Etapa – 3.607 km
 - CREMA 2ª Etapa* – 13.762 km
 - Em elaboração* – 16.953 km – CREMA 2ª Etapa

*Previsão em 31/12/2010

RODOVIAS

Evolução das Ações Significativas

Concessões Rodoviárias – 2ª etapa
Concessão da BR-116/324/BA
Rodoanel de São Paulo – Trecho Sul
BR-101–Sul/RS
Manutenção de rodovias
BR-365/MG
Arco rodoviário – BR-493/RJ
Arco rodoviário – BR-101/RJ
BR-101/RN
BR-101/PB
BR-101/PE
BR-163/PA
Concessões rodoviárias – 3ª etapa – Fase 1
BR-319/AM
BR-101–Sul/SC



*Previsão em 31/12/2010

CONCESSÕES RODOVIÁRIAS – 2ª ETAPA – FASE I



Mapa de localização

2ª etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais – Fase I

UF: MG/SP/RJ/PR/SC META: 2.600,8 km
INVESTIMENTO PREVISTO: R\$ 17,1 bilhões
EXECUTOR: Concessionárias

RESULTADOS

- Leilão realizado em 09/10/2007 – deságio médio de 46,4%
- Ato de outorga e assinatura do Contrato de Concessão dos Editais 001 a 006, em 14/02/2008, e do Edital 007 em 26/03/2008



CONCESSÕES RODOVIÁRIAS – BR-116-324/BA



2ª etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais – Fase II

UF: BA

EXECUTOR: Concessionária

META: 680 km

INVESTIMENTO PREVISTO: R\$ 1,9 bilhão


RESULTADOS

- Leilão realizado em 21/01/2009 - deságio médio de 21%
- Publicado Ato de Outorga em 03/09/2009
- Assinatura do Contrato de Concessão em 03/09/2009



RODOANEL DE SÃO PAULO – TRECHO SUL

Rodoanel de São Paulo/SP – Trecho Sul

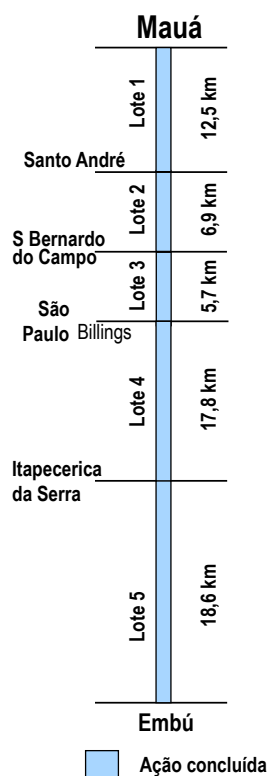

EXECUTOR: Estado de São Paulo (DERSA) META: 61,5 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 3,6 bilhões (R\$ 1,2 bilhão – União)
 CONCLUSÃO: 30/06/2010


RESULTADO

- Obra concluída em 30/06/2010



BR-101/SUL – TRECHO RS

Duplicação Divisa SC/RS-Osório



EXECUTOR: DNIT META: 88,5 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 853 milhões
 CONCLUSÃO: Obras de Duplicação – 30/12/2010
 Obras do Túnel do Morro Alto – 30/12/2010

RESULTADOS

- Pista Nova – concluídos 84 km
 - Concluídos 22 viadutos, 8 passagens inferiores, 3 passarelas e 9 pontes
 - Em execução 4 OAEs
 - Lote 1 – concluídos 24 km de pavimentação
 - Lote 2 – concluídos 24 km de pavimentação
 - Lote 3 – concluído em 15/05/2010
 - Túnel do Morro Alto – obras concluídas e executados 56% do sistema operacional
 - Lote 4 – concluído em 12/2007

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras concluídas

Ação concluída



*Previsão em 31/12/2010

MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Restauração e Conservação

UF: Nacional META: contratar conservação de 53,6 mil km de rodovias
 EXECUTOR: DNIT
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 12,3 bilhões
 CONCLUSÃO: 2010

Extensão Contratada


em km

| Tipo de Intervenção | dez/10 |
|---------------------|---------------|
| Restauração | 4.907 |
| Conserva | 19.842 |
| CREMA 1ª Etapa | 28.475 |
| CREMA | 428 |
| TOTAL | 53.652 |



*Previsão em 31/12/2010

BR-365/MG Duplicação Trevão-Uberlândia



EXECUTOR: DNIT META: 95 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 171 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 280,5 milhões
 CONCLUSÃO: 30/12/2011 – Uberlândia-Trevão
 30/05/2010 – Travessia Uberlândia

RESULTADOS

- Uberlândia-Trevão
 - Lote 02 – concluídos 6 km de terraplenagem
 - Lote 03 – em execução 5 km de terraplenagem
 - Lote 4.1 – em execução 7 km de terraplenagem
 - Lote 4.2 – concluídas 60% da superestrutura ponte do rio das Pedras e 50% da infra do Viaduto Xapetuba
 - Trevão – Lote 4.3 – Edital de licitação de obras publicado em 26/10/2010
- Travessia de Uberlândia – obras concluídas e liberadas ao tráfego em 30/05/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Uberlândia-Trevão
 - Lote 02 – concluir 2 km de pavimentação
 - Lote 03 – concluir 2 km de pavimentação
 - Lote 4.1 – concluir 4 km de pavimentação
 - Lote 4.2 – concluir 95% da ponte do rio das Pedras


PROVIDÊNCIAS

- Uberlândia-Trevão
 - Lote 02 – concluir mais 8 km de pavimentação até 31/03/2011
 - Lote 03 – concluir mais 2 km de pavimentação até 31/03/2011
 - Lote 4.1 – concluir mais 5 km de pavimentação até 31/03/2011
 - Lote 4.2 – concluir superestrutura do Viaduto Xapetuba até 31/03/2011
 - Trevão – Lote 4.3 – contratar obras até 15/01/2011 e iniciar obras até 15/02/2011

■ Ação concluída
 ■ Em execução
 ■ Em licitação



ARCO RODOVIÁRIO RJ – TRECHO BR-493 Construção do Arco Rodoviário do RJ



EXECUTOR: DNIT e Governo do Estado (DER/RJ) META: 97 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 600 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 639 milhões
 CONCLUSÃO: 30/12/2012 – Entr. BR-101-Entr BR-040
 15/11/2012 – Santa Guilhermina-Manilha

RESULTADOS

- Subtrecho Entr BR-101–Entr BR-040 – 71 km
 - L1 – 7 km de terraplenagem em execução e 2,5 km concluídos, e 5 OAEs com 55% concluídos
 - L2 – 13 km de terraplenagem em execução e 1 km concluído, e 11 OAEs com 53% concluídos
 - L3 – 4,5 km de terraplanagem em execução e 0,5 km concluído, e 8 OAEs com 48% concluídos
 - L4 – 5 km de terraplenagem em execução, e 6 OAEs com 50% concluídos
- Subtrecho Santa Guilhermina-Manilha – 26 km
 - Iniciada 1 OAE com 1% concluída
 - Em execução 1 km de terraplenagem

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010


- Subtrecho Entr. BR-101-Entr. BR-040 – 71 km
 - L1 – 7 km de terraplanagem em execução e 3 km concluídos, e 60% das 5 OAEs
 - L2 – 55% das 11 OAEs
 - L3 – 4,5 km de terraplanagem em execução e 0,7 km concluídos, e 51% das 8 OAEs
 - L4 – 5 km de terraplanagem em execução e 0,3 km concluídos, e 60% das 6 OAEs
- Subtrecho Santa Guilhermina-Manilha – 26 km
 - Iniciada 1 OAE com 5% concluída
 - 2 km de terraplenagem concluídos

■ Em execução
 ■ Preexistente



ARCO RODOVIÁRIO RJ – TRECHO BR-493

Construção do Arco Rodoviário do RJ



EXECUTOR: DNIT e Governo do Estado (DER/RJ) META: 97 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 600 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 639 milhões
 CONCLUSÃO: 30/12/2012 – Entr. BR-101-Entr BR-040
 15/11/2012 – Santa Guilhermina-Manilha


PROVIDÊNCIAS

- Subtrecho Entr .BR-101-Entr. BR-040 – 71 km
 - L1 – 7km de terraplanagem em execução e 3,4 km concluídos, e 67% das 5 OAEs até 31/03/2011
 - L2 – 13km de terraplanagem em execução, 1,4 km concluído, e 60% das 11 OAEs até 31/03/2011
 - L3 – 4,9km de terraplanagem em execução e 1 km concluído, e 59% das 8 OAEs até 31/03/2011
 - L4 – 5km de terraplanagem em execução e 0,7 km concluído, e 65% das 6 OAEs até 31/03/2011
- Subtrecho Entr BR-101-Entr BR-040 – 74 km – concluir mais 5 km de terraplanagem até 31/03/2011



ARCO RODOVIÁRIO RJ – TRECHO BR-101

BR-101 – Dup. Santa Cruz–Mangaratiba, incluindo acesso ao Porto de Itaguaí



EXECUTOR: DNIT META: 29 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 233,2 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 27,6 milhões
 CONCLUSÃO: 30/09/2010 – Sta Cruz-Mangaratiba
 Acesso Porto de Itaguaí – 30/06/2011
 Obras complementares – 30/06/2011

RESULTADOS

- Santa Cruz-Mangaratiba – duplicação concluída em 30/10/2010
- Acesso ao Porto de Itaguaí – concluído 1 km de terraplanagem
- Obras complementares – concluídas fundações de passarelas, recuperação de encabeçamento de 10 pontes e viaduto da BR-493

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Acesso ao Porto de Itaguaí – DNIT apresentar cronograma para o remanejamento da adutora da CEDAE
- Obras complementares – iniciar os serviços de execução das alças e acessos ao viaduto da BR-493


PROVIDÊNCIAS

- Acesso ao Porto de Itaguaí – DNIT concluir 2 km de pavimento no acesso a NUCLEP até 30/03/2011
- Obras complementares – concluir as alças do viaduto sobre a BR-493 até 30/06/2011



BR-101/NE – TRECHO RN

Duplicação e Modernização Natal-Divisa RN/PB



EXECUTOR: DNIT e Exército **META:** 81 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 334,9 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 2,1 milhões
CONCLUSÃO: Natal-Arês – 30/12/2010
 Arês-Divisa RN/PB – 31/03/2011

RESULTADOS

- Ponta Negra-Arês
 - Pista nova – 10 km concluídos antes do PAC – concluídas 12 OAE e a pavimentação
 - Pista existente – 55 km – concluídos 51 km de restauração
- Arês-Divisa RN/PB
 - Pista nova – concluídos 33 km de pavimentação e 17 OAEs
 - Pista existente – concluídos 28 km de restauração

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Ponta Negra-Arês – obras concluídas
- Arês-Divisa RN/PB – concluir mais 3 km de restauração


PROVIDÊNCIA

- Arês-Divisa RN/PB – concluir obras até 31/03/2011



BR-101/NE – TRECHO PB

Duplicação e Modernização Divisa RN/PB-Divisa PB/PE

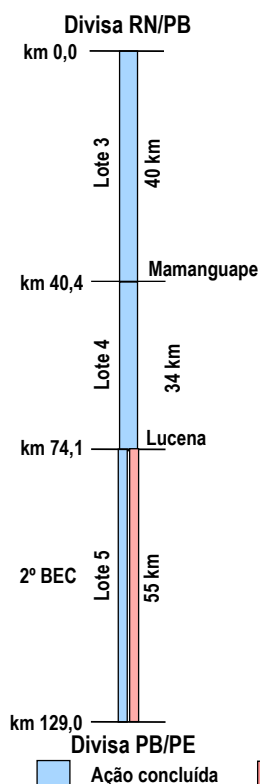

EXECUTOR: DNIT e Exército **META:** 129 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 582 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 0,4 milhão
CONCLUSÃO: Div. RN/PB-Mamanguape – 15/07/2010
 Mamanguape-Lucena – 22/09/2010
 Duplicação Lucena-Div. PB/PE – 30/12/2010
 Restauração Lucena-Div. PB/PE – 30/06/2011

RESULTADOS

- Divisa RN/PB-Mamanguape – pavimentação concluída
- Mamanguape-Lucena – pavimentação concluída
- Lucena-Divisa PB/PE – 11 km duplicados antes do PAC
 - Pista nova – concluídos 36 km de pavimentação e 25 OAEs
 - Pista existente – concluídos 20 km de restauração e restauradas as 8 OAEs

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Lucena-Divisa PB/PE
 - Pista nova – concluir pavimentação
 - Pista existente – concluir mais 3 km de restauração


PROVIDÊNCIA

- Lucena-Divisa PB/PE – Pista existente – restaurar mais 20 km até 31/03/2011



BR-101/NE – TRECHO PE

Duplicação e Modernização Divisa PB/PE-Palmares-Divisa PE/AL



EXECUTOR: DNIT, Exército e Estado (DER/PE) META: 199 km

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 892,1 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 363,8 milhões

CONCLUSÃO : Divisa PB/PE-Igarassu – 30/03/2011

Contorno de Recife – 30/12/2012

Cabo-Ribeirão – 30/06/2010; Ribeirão-Palmares – 28/02/2011

Palmares-Divisa PE/AL – 30/10/2011

RESULTADOS

- Divisa PE/PB-Igarassu – 3º e 4º BEC
 - Pista nova – concluídos 31 km de pavimentação e 12 OAEs
 - Pista existente – concluída demolição de 2 km de placas para restauração
- Contorno de Recife – 41 km – projetos executivos em elaboração
- Acesso ao Cabo – concluído em 01/2/2008
- Cabo-Ribeirão – obras concluídas em 30/06/2010
- Ribeirão-Palmares
 - Pista nova – concluídos 32 km de pavimentação e 5 OAEs
 - Pista existente – Restaurados 38 km e 4 OAEs
- Palmares-Divisa PE/AL – 12 km de terraplenagem em execução

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010


- Divisa PE/PB-Igarassu – 3º e 4º BEC
 - Pista nova – concluir mais 2 km de pavimento e 100% das OAEs
 - Pista existente – concluir 4 km de restauração
- Ribeirão-Palmares – concluir mais 7 km da duplicação
- Palmares-Divisa PE/AL – concluir 12 km de terraplenagem



■ Ação concluída
 ■ Em execução
 ■ Ação preparatória
 ■ Preexistente

BR-101/NE – TRECHO PE

Duplicação e Modernização Divisa PB/PE-Palmares-Divisa PE/AL



EXECUTOR: DNIT, Exército e Estado (DER/PE) META: 199 km

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 892,1 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 363,8 milhões

CONCLUSÃO : Divisa PB/PE-Igarassu – 30/03/2011

Contorno de Recife – 30/12/2012

Cabo-Ribeirão – 30/06/2010; Ribeirão-Palmares – 28/02/2011

Palmares-Divisa PE/AL – 30/10/2011


PROVIDÊNCIAS

- Divisa PE/PB-Igarassu – concluir obras até 30/03/2011
- Contorno de Recife – 41 km
 - Subtrecho de 10 km – aprovar projeto executivo até 30/01/2010
 - Subtrecho de 31 km – Governo do Estado entregar Projeto Executivo ao DNIT até 28/02/2011
- Ribeirão-Palmares – concluir obras até 28/02/2011
- Palmares-Divisa – concluir 22 km de terraplenagem até 30/03/2011



■ Ação concluída
 ■ Em execução
 ■ Ação preparatória
 ■ Preexistente


BR-163/PA/MT

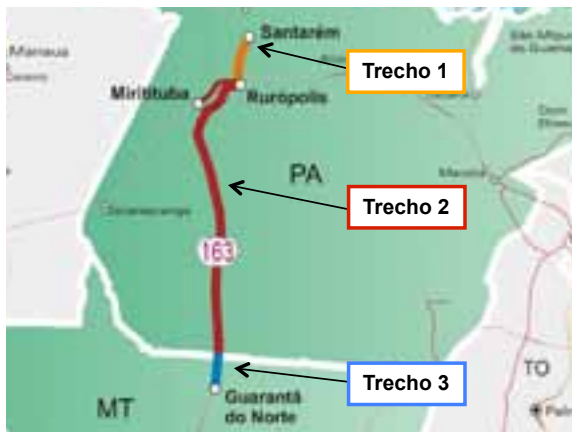


Pavimentação Guarantã do Norte-Santarém/PA, incluindo o acesso a Miritituba BR-230/PA

UF: PA META: 1.000 km
 DATA DE CONCLUSÃO: 4º trimestre/2011
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$654,3 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 858,7 milhões
 EXECUTOR: DNIT, Exército 8º e 9º BEC's e Prefeitura Municipal de Guarantã

- TRECHO 1 – RURÓPOLIS-SANTARÉM
- TRECHO 2 – DIVISA MT/PA km 0-RURÓPOLIS km 789 – incluindo o acesso a Miritituba
- TRECHO 3 – GUARANTÃ DO NORTE-DIVISA MT/PA



BR-163/PA/MT – TRECHO 1 Pavimentação Santarém-Rurópolis



EXECUTOR: Exército (8º BEC) META: 125 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 55 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 93 milhões
 CONCLUSÃO: km 914-km 893 – 30/12/2008
 km 893-km 873 – 30/04/2011
 km 873-km 789 – 30/12/2011

RESULTADOS

- km 914-km 893 – Tapajós 1 – concluído em 30/12/2008
- km 893-km 873 – Tapajós 2 – concluídos 19 km de pavimentação
- km 873-km 789 – Tapajós 3 – executados 7 km de pavimentação

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- km 893-km 873 – Tapajós 2 – concluir 30% ponte do rio Moju
- km 873-km 789 – Tapajós 3 – concluir mais 2 km de pavimentação

PROVIDÊNCIAS


- km 893-km 873 – concluir obras até 30/04/2011
- km 873-km 789 – concluir mais 4 km de pavimentação 31/03/2011



■ Ação concluída
 ■ Em execução
 ■ Preexistente

BR-163/PA/MT – TRECHO 2

Pavimentação Divisa MT/PA-Rurópolis e Acesso a Miritituba (BR-230/PA – 33 km)

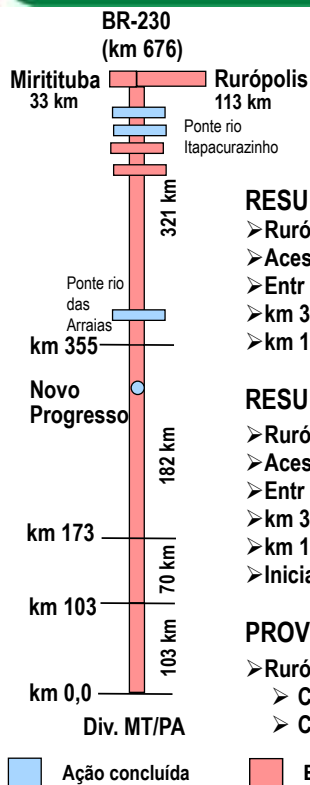

EXECUTOR: DNIT e Exército (9º BEC) META: 822 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 510,6 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 765,3 milhões
 CONCLUSÃO: Rurópolis, km 789-Entr BR-230, km 676 – 30/12/2011
 Acesso a Miritituba – 30/12/2011 km 676-km 355 – 30/12/2011
 km 355-km 103 – 30/12/2011 km 103-Divisa MT/PA – 30/12/2011

RESULTADOS

- Rurópolis-Entr. BR-230 – Iniciada em 01/07/2009 – concluídos 54 km de terraplenagem
- Acesso a Miritituba – 33 km – concluídos 11 km de pavimentação
- Entr BR-230-km 355 – executados 21 km de terraplenagem e 3 pontes
- km 355-km 103 – 5 lotes – executados 60 km de pavimentação e a Travessia de Novo Progresso
- km 103-Divisa MT/PA – executados 9 km de terraplenagem

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Rurópolis-Entr BR-230 – concluir mais 18 km de pavimentação
- Acesso a Miritituba – 33km – concluir mais 10 km de pavimentação
- Entr BR-230-km 355 – concluir mais 20 km de terraplenagem
- km 355-km 103 – 4 lotes – concluir mais 67 km de pavimentação
- km 103-Divisa MT/PA – concluir mais 10 km de terraplenagem
- Iniciar a execução de 60 pontes ao longo do trecho até 30/12/2010

PROVIDÊNCIAS


- Rurópolis-km 0
 - Concluir mais 35 km de pavimento até 30/03/2011
 - Concluir 10% das obras nas 60 pontes até 30/03/2011



■ Ação concluída ■ Em execução

BR-163/PA/MT – TRECHO 3

Guarantã do Norte-Divisa MT/PA e Travessia Urbana de Guarantã



EXECUTOR: PM Guarantã e Exército (9º BEC) META: 53 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 88,9 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 0,2 milhão
 CONCLUSÃO: Div. MT/PA-Guarantã – 30/12/2011
 Travessia Urbana e Marginais – 30/12/2010

RESULTADOS

- Guarantã-Divisa MT/PA – concluídos 28 km de pavimentação
- Travessia Urbana de Guarantã – concluídos 5 km de pavimentação

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Guarantã-Divisa MT/PA – concluir mais 4 km de pavimentação
- Travessia Urbana de Guarantã – concluir obras


PROVIDÊNCIA

- Guarantã-Divisa MT/PA – concluir mais 6 km de pavimento até 30/03/2011



■ Ação concluída ■ Em execução

CONCESSÕES RODOVIÁRIAS – 3ª ETAPA – FASE 1

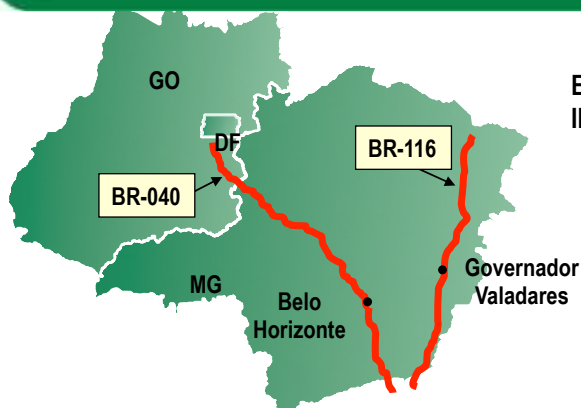

EXECUTOR: Concessionária

META: 1.754 km

INVESTIMENTO PREVISTO: R\$ 6,5 bilhões

RESULTADO

- Entrega ao TCU dos resultados da consulta pública, em 27/02/2009

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- ANTT se comprometeu a entregar ao TCU a memória de cálculo dos quantitativos dos investimentos estimados para as Rodovias BR-116/MG e BR-040/MG até 31/12/2010



RESTRIÇÃO

- TCU solicitou complementações aos estudos apresentados pela ANTT

PROVIDÊNCIA

- TCU analisar documentos apresentados pela ANTT até 15/02/2011

BR-319/AM



Restauração e pavimentação Manaus/AM-Porto Velho/RO

UF: AM META: 685 km

DATA DE CONCLUSÃO : 4º trimestre/2012

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 547,3 Milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 439,1 Milhões

EXECUTOR: DNIT e Exército 5º, 6º e 7º BEC's

- TRECHO 1 – km 198-km 656




- TRECHO 2 – km 656-PORTO VELHO



BR-319/AM – TRECHO 1

Restauração e Pavimentação BR-319/AM (km 198-km 656)



EXECUTOR: DNIT e Exército META: 458 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 277,3 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 418,6 milhões
 CONCLUSÃO: Pontes – 30/11/2010
 km 198 ao km 250 – 30/12/2011
 km 250 ao km 656 – 30/12/2012



RESULTADOS

- Pontes do Careiro-Castanho e do Tupanã – obras concluídas
- km 198-km 250 – concluídos 8km de pavimento, 15 km de terraplenagem em execução
- km 250-km 656 – Ibama informou que se posicionará a respeito de nota técnica com vistas a reavaliar as condicionantes necessárias à emissão da LP em 04/08/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Pontes do Careiro-Castanho e do Tupanã – DNIT aprovar os projetos executivos dos acessos

RESTRICÇÕES

- km 198-km 250 – concluir 5km de pavimento
- km 250-km 656 – Emissão da LP adiada em função da necessidade de complementações do EIA/RIMA


PROVIDÊNCIAS

- Pontes Careiro-Castanho e Tupanã – início de obras dos acessos até 30/03/2011
- km 198-km 250 – concluir mais 5km de pavimento até 30/03/2011
- km 250-km 656 – Ibama apresentar manifestação acerca do parecer emitido para análise do EIA-RIMA até 30/03/2011

■ Ação concluída
 ■ Em execução
 ■ Ação preparatória
 ■ Preexistente

BR-319/AM/RO – TRECHO 2

Restauração e Pavimentação – km 656-Porto Velho (km 877)



EXECUTOR: DNIT/Exército META: 227 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 270 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 20,5 milhões
 EXECUTOR: DNIT/Exército META: 227km
 CONCLUSÃO: Entr. BR-230-Humaitá – 30/12/2011 Humaitá-km719 – 30/08/2010
 km 719-km 764 – 30/10/2009 km 764-km 814 – 30/04/2010
 km 814-P. Velho– 30/07/2010

RESULTADOS

- Entr. BR-230-Humaitá e o acesso a Humaitá – executados 3 km de pavimento
- Humaitá-km 719 – pavimentação concluída em 20/08/2010
- km 719-km 764 – pavimentação concluída em 31/12/2008
- km 764-km 814 – pavimentação concluída em 30/04/2010 e alargadas 7 OAE' s em 20/07/2010
- km 814/AM-Porto Velho – pavimentação concluída em 30/07/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Entr. BR-230-Humaitá e o acesso a Humaitá – concluir 9 km de pavimento e 50% da ponte sobre o Igarapé Retiro

PROVIDÊNCIA


- Entr. BR-230-Humaitá e o acesso a Humaitá – concluir mais 5 km de pavimento e 100% da ponte sobre o Igarapé Retiro até 31/03/2011

■ Ação concluída
 ■ Em execução



BR-101/SUL – TRECHO SC

Duplicação Palhoça-Divisa SC/RS



EXECUTOR: DNIT META: 249 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1.209,3 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 1.032,3 milhões
 CONCLUSÃO: Duplicação – 30/06/2011 Túnel Morro dos Cavalos – 30/06/2012
 Túnel Morro do Formigão – 28/02/2012 Lagoa do Imaruí – 30/12/2011

RESULTADOS

- Duplicação
 - Lotes 24, 27, 28 e 30 – concluídos e entregues ao tráfego em 13/09/2010
 - Lote 29 – emitida ordem de reinício de obras em 13/09/2010
 - Pista nova – concluídos 173 km de pavimentação, 34 pontes, 35 passagens inferiores, 30 viadutos
 - Pista antiga – restaurados 159 km
- Túnel do Morro dos Cavalos – DNIT encaminhou revisão da metodologia para estudos de fauna em 16/11/2010
- Lagoa do Imaruí – edital de licitação publicado em 16/09/2010
- Túnel do Morro do Formigão – edital de licitação publicado em 16/09/2010
- Túnel do Morro Agudo – concluída a escavação

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010


- Duplicação
 - Pista nova – concluir 200 km de pavimentação até 30/12/2010
 - Pista antiga – concluir 172 km de restauração até 30/12/2010
- Túnel do Morro dos Cavalos – DNIT concluir os estudos de fauna até 15/12/2010
- Lagoa do Imaruí – contratar obras até 25/12/2010
- Túnel do Morro do Formigão – contratar obras até 25/12/2010
- Túnel do Morro Agudo – concluir obra até 30/12/2010



■ Ação concluída
 ■ Em execução
 ■ Em licitação
 ■ Ação preparatória

BR-101/SUL – TRECHO SC

Duplicação Palhoça-Divisa SC/RS



EXECUTOR: DNIT META: 249 km
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1.209,3 milhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 1.032,3 milhões
 CONCLUSÃO: Duplicação – 30/06/2011 Túnel Morro dos Cavalos – 30/06/2012
 Túnel Morro do Formigão – 28/02/2012 Lagoa do Imaruí – 30/12/2011

RESTRIÇÃO

- Lotes 22, 23, 25 e 26 – baixa mobilização do construtor


PROVIDÊNCIAS

- Duplicação
 - Lote 23 concluído e entregue ao tráfego até 30/03/2011
 - Pista nova – concluir 220 km de duplicação até 30/03/2011
 - Pista antiga – concluir 200 km de restauração até 30/03/2011
 - Lote 29 – Executar 15 km de terraplenagem e 3 km de pavimentação até 30/03/2011
- Túnel Morro dos Cavalos – aprovar projeto executivo até 30/03/2011
- Travessia da Lagoa do Imaruí – iniciar obras até 30/03/2011
- Túnel do Morro do Formigão – iniciar obras até 30/03/2011




■ Ação concluída
 ■ Em execução
 ■ Em licitação
 ■ Ação preparatória

FERROVIAS




RESULTADOS 2007 A 2010

FERROVIAS – SISTEMA DE BITOLA LARGA

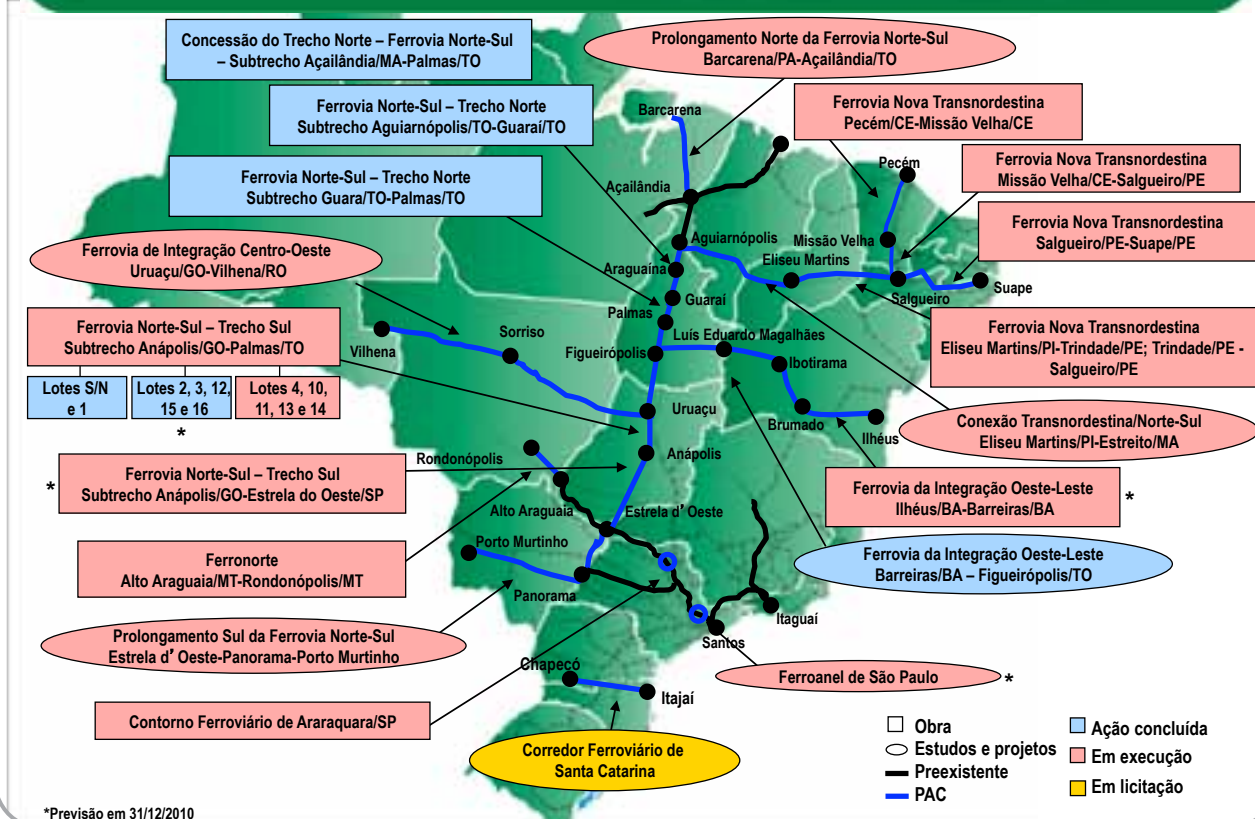

FERROVIAS – SISTEMA DE BITOLA ESTREITA

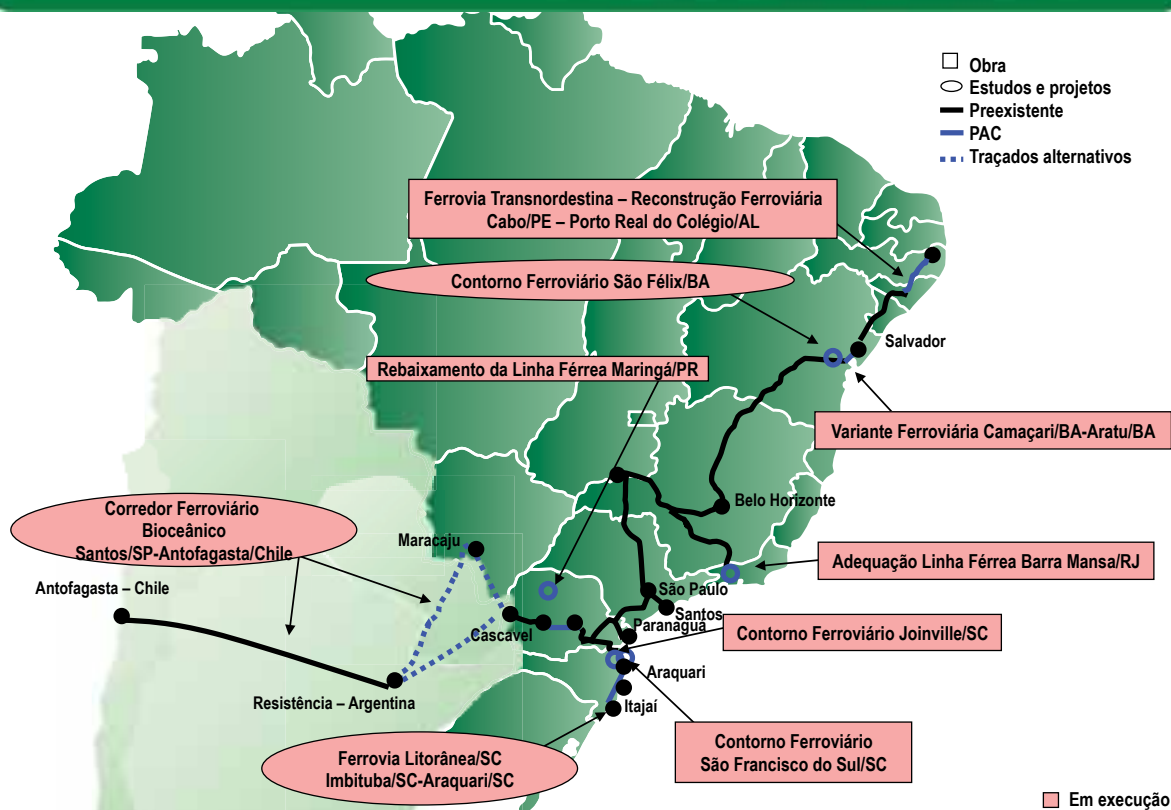

FERROVIAS Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras Concluídas* – 909 km

- Ferrovia Norte-Sul – Aguiarnópolis/TO-Palmas/TO – 504 km realizados em 30/08/2010
- Ferrovia Norte-Sul – Ouro Verde/GO-Anápolis/GO-Porto Seco/GO – 51 km realizados em 30/08/2010
- Extensão da Ferronorte – Alto Araguaia/MT-Rondonópolis/MT – Segmento 1 – 13 km realizados em 10/09/2010
- Ferrovia Norte-Sul – Palmas/TO-Córrego do Jabuti/TO – 99 km realizados em 20/12/2010*
- Ferrovia Norte – Sul – Divisa TO/GO-GO 244 – 118 km realizados em 20/12/2010*
- Ferrovia Norte-Sul – Pátio de Santa Isabel/GO-Ouro Verde/GO – 124 km realizados em 20/12/2010*

Obras em andamento* – 3.757 km

- Ferrovia Norte-Sul* – 1.133 km
 - Palmas/TO-Uruaçu/GO – 358 km – 74% realizados*
 - Uruaçu/GO-Anápolis/GO – 105 km – 86% realizados*
 - Anápolis/GO-Estrela D' Oeste – 670 km – início até 22/12/2010*
- Ferrovia Nova Transnordestina* – 1.801 km em obras
 - Missão Velha/CE-Salgueiro/PE – 96 km – 100% da infraestrutura, 96% das OAEs e 20% da superestrutura*
 - Salgueiro/PE-Trindade/PE – 163 km – 90% da infraestrutura e 66% das OAEs*
 - Eliseu Martins/PI-Trindade/PE – 420 km – 19% da infraestrutura e 10% das OAEs*
 - Salgueiro/PE-Suape/PE – 522 km – 27% da infraestrutura e 10% das OAEs*
 - Pecém/CE-Missão Velha/CE – 527 km – iniciados 50 km em agosto/2010 – 3% da infraestrutura*
 - Cabo/PE-Porto Real do Colégio/AL – 550 km – trecho concluído em julho/2010 e atingido por enchentes
- Ferrovia de Integração Oeste-Leste – Ilhéus-Barreiras – 537 km – início em 10/12/2010
- Extensão da Ferronorte – Alto Araguaia/MT-Rondonópolis/MT – 163 km – 70% da infraestrutura e 10% de superestrutura*
- Contornos Ferroviários de Araraquara/SP, Joinville/SC e São Francisco do Sul/SC – 82 km
- Rebaixamento Linha Férrea Maringá/PR – 13,2 km – 77% do rebaixamento e 100% das vias expressas*
- Adequação da Linha Férrea de Barra Mansa/RJ – 10 km – 1% executado
- Variante Ferroviária de Camaçari – 18 km – iniciada em 22/11/2010

*Previsão em 31/12/2010

FERROVIAS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Projetos e Estudos em elaboração* – 6.925 km


- Ferrovia de Integração Centro-Oeste – Uruaçu-Vilhena – 1.630 km
- Corredor Bioceânico – Bitola Métrica – 2.930 km
- Ferrovia Litorânea – Imbituba-Araquari – 236 km
- Prolongamento – Norte da Ferrovia Norte-Sul – Açailândia-Barcarena – 480 km
- Prolongamento Sul da Ferrovia Norte-Sul – 970 km
- Contorno Ferroviário de São Félix – 17 km
- Conexão da Ferrovia Transnordestina com a Norte-Sul – 596 km – previsão para início até 30/12/2010
- Ferroanel de São Paulo – 66 km – previsão para início até 30/12/2010

*Previsão em 31/12/2010


FERROVIAS

Evolução das Ações Significativas

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Norte




Ferrovia Norte-Sul – Trecho Sul




Ferrovia Transnordestina



Trem de Alta Velocidade



Ferrovia da Integração Oeste-Leste



Ferroanel de São Paulo



Ferronorte Rondonópolis



FERROVIA NORTE-SUL

Construção



EXECUTOR: VALEC META: 2.244 km PAC: jan/2007
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 4,9 bilhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 2,8 bilhões
 DATA DE CONCLUSÃO: UF: MA/TO/GO/MG/SP
 Açailândia/MA-Palmas/TO: 30/08/2010
 Palmas /TO-Anápolis/GO: 30/04/2011
 Anápolis/GO-Estrela d' Oeste: 30/12/2012

Trecho Norte – Açailândia/MA-Palmas/TO – 719 km


- Subconcessão realizada em 20/12/2007
- Açailândia-Aguiarnópolis – 215 km concluídos antes do PAC
- Aguiarnópolis-Colinas do Tocantins – 240 km – concluídos
- Colinas do Tocantins-Guarai – 116 Km – concluídos
- Guarai-Palmas – 148 km – concluídos

Trecho Sul – Palmas/TO-Estrela d' Oeste/SP – 1.525 km

- Palmas-Anápolis – 855 km
 - Lotes 1 e S/N – 51 km – concluídos em 30/08/2010
 - Lotes 2, 3, 12, 15 e 16 – concluir 341 km até 20/12/2010
 - Lotes 4, 10, 11, 13 e 14 – 462 km em obras – conclusão até 30/04/2011
- Anápolis-Estrela d' Oeste – 670 km – concluída a licitação para construção com início de obras até 22/12/2010

FERROVIA NORTE-SUL – TRECHO NORTE

Açailândia/MA-Palmas/TO

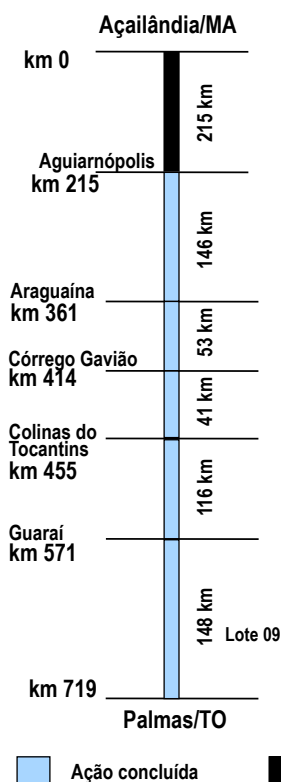

EXECUTOR: VALEC META: 719 km PAC: jan/2007
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1,65 bilhão
 DATA DE CONCLUSÃO: 30/08/2010 UF: MA/TO


RESULTADOS

- Subconcessão do trecho Açailândia/MA-Palmas/TO – 719 km – realizada em 20/12/2007
- Açailândia/MA-Aguiarnópolis/TO – 215 km – concluído antes do PAC
- Aguiarnópolis/TO-Araguaína/TO – 146 km – concluído em 18/05/2007
- Araguaína/TO-Córrego Gavião/TO – 53 km – concluído em 30/08/2008
- Córrego Gavião/TO-Colinas do Tocantins/TO – 41 km – concluído em 31/10/2008
- Colinas do Tocantins/TO-Guarai/TO – 116 km – concluído em 30/04/2009
- Guarai/TO-Palmas/TO – 148 km – concluído em 30/08/2010



FERROVIA NORTE-SUL – TRECHO SUL

Palmas/TO–Estrela d’ Oeste/SP

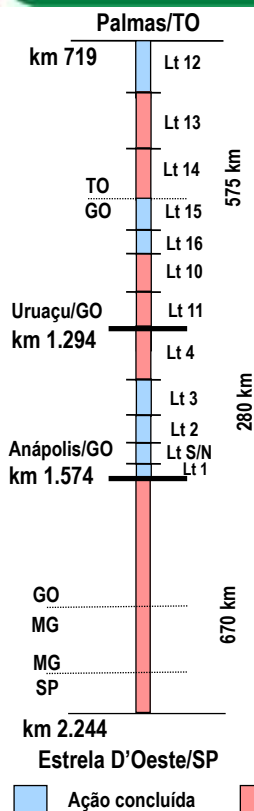

EXECUTOR: VALEC META: 1.525 km UF: TO/GO/SP
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 3,25 bilhões
 INVESTIMENTO PÓS 2010: R\$ 2,8 bilhões
 CONCLUSÃO: Palmas/TO-Uruaçu/GO: 30/04/2011
 Uruaçu/GO-Anápolis/GO: 30/04/2011
 Anápolis/GO-Estrela d’ Oeste/SP: 30/12/2012

RESULTADOS

- Palmas/TO-Uruaçu/GO – 63% realizados
- Uruaçu/GO-Anápolis/GO – 78% realizados – Lotes S/N e 1 – 51 km – concluídos em 30/08/2010
- Anápolis/GO-Estrela D’ Oeste/SP – publicado resultado final da licitação das obras em 05/10/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Palmas/TO-Uruaçu/GO – realizar 74% físico até 30/12/2010
 - Concluir obras nos lotes 12, 15 e 16 – 217 km até 20/12/2010
 - Lote 10 – Executar 65% e Lote 11 – realizar 85%
 - Lote 13 – Executar 51% e Lote 14 – realizar 57%
- Uruaçu/GO-Anápolis/GO – realizar 86% até 30/12/2010
 - Concluir obras nos lotes 2 e 3 – 124 km – até 20/12/2010
 - Lote 4 – realizar 80%
- Anápolis/GO-Estrela D’ Oeste/SP
 - Emitir LI até 20/12/2010
 - Iniciar obras até 22/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- Palmas/TO-Uruaçu/GO – concluir obras até 30/04/2011
- Uruaçu/GO-Anápolis/GO – concluir obras até 30/04/2011
- Anápolis/GO-Estrela D’ Oeste/SP – realizar 2% até 30/03/2011



FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA



EXECUTOR: Concessionária TL S.A.
 META: Construção: 1.728 km – Remodelação: 550 km
 UF: CE/PE/PI/AL
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 2,16 bilhões
 INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 3,25 bilhões
 CONCLUSÃO: 2012



RESULTADOS

- Missão Velha/CE-Salgueiro/PE – 96km – 99% da infraestrutura, 88% das OAEs e 5% da superestrutura realizados
- Salgueiro/PE-Trindade/PE – 163km – 78% da infraestrutura e 44% das OAEs realizados
- Trindade/PE-Eliseu Martins/PI – 420 km – obras em 261 km – 4 lotes – 13% da infraestrutura e 5% das OAEs realizados
- Salgueiro/PE-Suape/PE – 522 km – obras em 306km – 5 lotes – 17% da infraestrutura e 6% das OAEs realizados
- Pecém/CE-Missão Velha/CE – 527 km – obra iniciada em 50 km – 1 lote – 1% da infraestrutura realizado
- Cabo/PE-Porto Real do Colégio/AL – 550 km – trecho concluído em julho/2010 e atingido por enchentes

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Missão Velha/CE-Salgueiro/PE – concluir infraestrutura, 96% das OAEs e 20% da superestrutura
- Salgueiro/PE-Trindade/PE – concluir 90% da infraestrutura e 66% das OAEs
- Trindade/PE-Eliseu Martins/PI – concluir 19% da infraestrutura, 10% das OAEs e iniciar obras nos lotes 3, 4 e 5 – 167 km
- Salgueiro/PE-Suape/PE – concluir 27% da infraestrutura, 10% das OAEs e iniciar obras nos lotes 6 a 9 – 216 km
- Pecém/CE-Missão Velha/CE – contratar obras dos lotes 2 a 11 até 13/12/2010 e concluir 3% da infraestrutura

FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA




EXECUTOR: Concessionária TL S.A.
META: Construção: 1.728 km – Remodelação: 550 km
UF: CE/PE/PI/AL
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 2,16 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 3,25 bilhões
CONCLUSÃO: 2012

PROVIDÊNCIAS

- Missão Velha/CE-Salgueiro/PE – concluir OAEs e 50% da superestrutura até 30/03/2011
- Salgueiro/PE-Trindade/PE – concluir 99% da infraestrutura e 98% das OAEs até 30/03/2011
- Trindade/PE-Eliseu Martins/PI – concluir 29% da infraestrutura e 17% das OAEs até 30/03/2011
- Salgueiro/PE-Suape/PE – concluir 39% da infraestrutura e 20% das OAEs até 30/03/2011
- Pecém/CE-Missão Velha/CE – concluir 6% da infraestrutura e 4% das OAEs até 30/03/2011



TREM DE ALTA VELOCIDADE Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas



EXECUTOR: A definir **META:** 511 km **UF:** SP/RJ
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 33,1 bilhões
DATA DE CONCLUSÃO: 2015

RESULTADOS

- TCU aprovou estudo para licitação em 30/06/2010
- ANTT publicou edital de licitação em 14/07/2010
- Publicada MP 511/2010, que dispõe sobre medidas para assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do BNDES e autorização para garantia do financiamento do TAV, em 08/11/2010

PROVIDÊNCIAS


- Entrega das propostas até 12/04/2011
- Realizar leilão até 29/04/2011
- Assinatura do contrato de concessão até 20/10/2011

Em licitação



FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE

Figueirópolis/TO-Ilhéus/BA

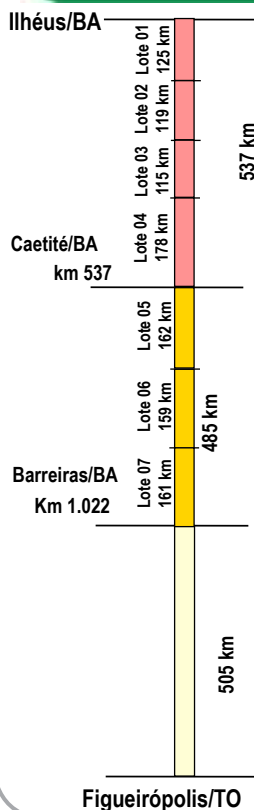

EXECUTOR: VALEC META: 1.527 km UF: BA/TO
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 431,1 milhões
 INVESTIMENTO PÓS 2010: R\$ 4,4 bilhões
 CONCLUSÃO: Ilhéus/BA-Caetité/BA – 30/12/2012
 Caetité/BA-Barreiras/BA – 30/12/2013
 Barreiras/BA-Figueirópolis/TO – A definir

RESULTADOS

- Ilhéus/BA-Barreiras/BA
 - Contrato das obras dos lotes 1 a 7 assinado em 29/10/2010
 - Lotes 1 a 4
- Emitida a LI em 30/11/2010
- Ordem de início em 10/12/2010
- Barreiras/BA-Figueirópolis/TO – projeto executivo contratado em 04/05/2010

PROVIDÊNCIAS

- Ilhéus/BA-Barreiras/BA
 - Lotes 1 a 4 – realizar 3% das obras até 30/03/2011
 - Lote 5 – concluir estudos necessários à emissão da LI até 15/01/2011
 - Lotes 6 e 7 – contratar estudo espeleológico até 15/02/2011
- Barreiras/BA-Figueirópolis/TO – concluir projeto executivo até 25/02/2011

Em execução Em licitação Ação preparatória



FERROANEL DE SÃO PAULO

Estudos



EXECUTOR: ANTT
 META: Conclusão de estudos
 UF: SP
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 0,4 milhão
 INVESTIMENTO PÓS 2010: R\$ 3,5 milhões
 CONCLUSÃO: 30/12/2011



RESULTADOS

- MT/ANTT e Governo de São Paulo realizaram reunião estabelecendo procedimentos para contratação de estudo que avalie todas as alternativas relativas à implementação do projeto do Ferroanel. Os recursos para o estudo serão executados com apoio do Banco Mundial
- Iniciado pela ANTT o processo de seleção de empresas para elaboração dos estudos em 08/02/2010
- Assinado protocolo entre a ANTT e o Governo de São Paulo para acompanhamento dos estudos em 05/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010


- Assinar contrato para elaboração de Estudo de Avaliação de Alternativas até 15/12/2010

PROVIDÊNCIA

- ANTT apresentar relatório com consolidação dos estudos existentes e Relatório Parcial Ambiental até 31/03/2011

EXTENSÃO DA FERRONORTE

Rondonópolis/MT-Alto Araguaia/MT



EXECUTOR: Ferronorte META: 260 km

UF: MT

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 293,5 milhões

INVESTIMENTO PÓS 2010: R\$ 486,5 milhões

CONCLUSÃO: 30/07/2012

RESULTADOS

- Segmento 1 – 13 km – concluído em 10/09/2010
- Segmento 2 – 163 km – concluídos 66% da infraestrutura e 4% de superestrutura
- Segmento 3 e Pátio de Rondonópolis – 84 km
 - Decreto de Utilidade Pública publicado em 16/07/2010
 - ALL protocolou no Ibama as complementações ao EIA/RIMA em 29/10/2010



RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Segmento 2 – 163 km – concluir 70% da infraestrutura e 10% da superestrutura até 30/12/2010
- Segmento 3 – ANTT autorizar projeto executivo até 20/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- Segmento 2 – 163 km – concluir 85% da infraestrutura e 40% da superestrutura até 30/03/2011
- Segmento 3 e Pátio de Rondonópolis – 84 km – Ibama emitir LP até 28/02/2011

Ação concluída Em execução Ação preparatória




Estaleiro Atlântico Sul • PE

PORTOS



RESULTADOS 2007 A 2010

PORTOS

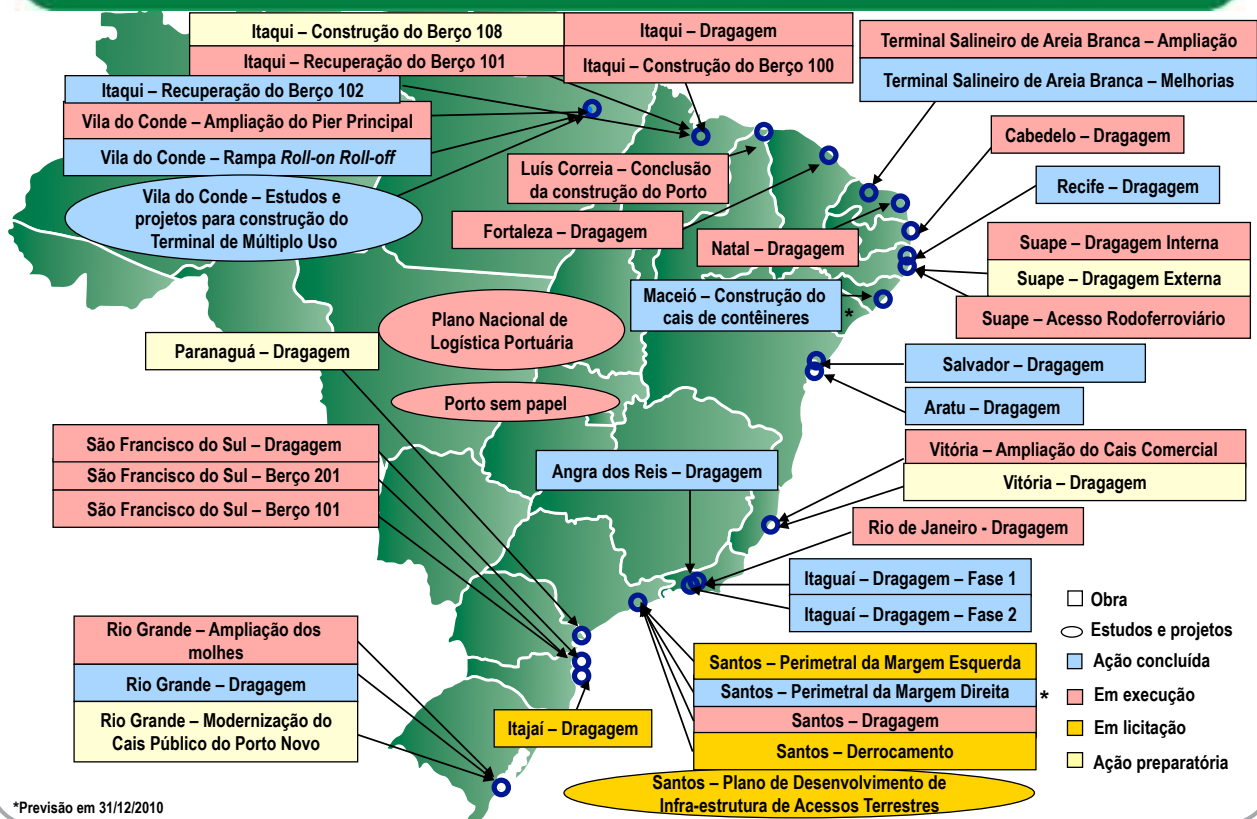

*Previsão em 31/12/2010

PORTOS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras Concluídas

- Areia Branca/RN – Repotencialização do Terminal Salineiro de Areia Branca – 22/04/2008
- Vila do Conde/PA – Construção da Rampa *Roll-On Roll-Off* – 28/06/2009
- Itaguaí/RJ – Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso – Fase 1 – 15/09/2009
- Santos/SP – Avenida Perimetral Portuária Margem Direita – Trecho 1 – 09/07/2010
- Santos/SP – Avenida Perimetral Portuária Margem Direita – Trecho 2 – 20/12/2010
- Itaquí/MA – Recuperação do Berço 102 – 30/08/2010
- Maceió/AL – Conclusão do Cais para Contêineres – 20/12/2010

Obras em Andamento – Destaques

- Rio Grande/RS – Ampliação dos molhes – 98% realizados
- São Francisco do Sul/SC – Berço 201 – 72% realizados e Berço 101 – 82% realizados
- Maceió/AL – Conclusão da Construção do Cais para Contêineres 3ª fase – 98% realizados
- Vila do Conde/PA – Ampliação do Pier Principal – 27% realizados
- Areia Branca/RN – Ampliação e Adequação do Terminal Salineiro – 43% realizados
- Itaquí/MA – Construção do Berço 100 – 55% realizados

Programa Nacional de Dragagem

- Obras concluídas em 6 portos
 - Recife/PE – 12/12/2009, Rio Grande/RS – 20/07/2010, Angra dos Reis/RJ – 30/07/2010, Itaguaí/RJ – Fase 2 – 29/11/2010, Aratu e Salvador/BA – 30/11/2010
- Obras em andamento em 7 portos
 - Suape/PE – Canal Interno – 89%, Natal/RN – 45%, Santos/SP – Dragagem – 40%, Rio de Janeiro/RJ – 35%, São Francisco do Sul/SC – 34%, Fortaleza/CE – 30% e Cabedelo/PB – 12%
- Licitações em andamento em Itajaí/SC e Santos/SP – derrocamento

PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM

| Porto | Estágio | Execução Física em 31/10/2010 | Execução Física em 31/12/2010 | Data de Conclusão | Modernização dos Acessos Aquaviários (PAC) | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--------------------------|------------|----------------------------|
| | | | | | Profundidade | Dragagem | Derrocagem | Total Estimado R\$ Milhões |
| | | | | | (m) | Volume Estimado (m³ mil) | | |
| Recife/PE | Concluída | 100% | 100% | 12/12/09 | 11,5 | 2.637 | - | 31,1 |
| Aratu/BA | | | | 20/11/10 | 15 | 3.300 | 5 | 54,8 |
| Salvador/BA | | | | 20/11/10 | 12 / 15 | 2.986 | - | 58,7 |
| Itaguaí/RJ - Fase 2 | | | | 24/11/10 | 17,5 | 4.900 | - | 94,4 |
| Angra dos Reis/RJ | | | | 30/07/10 | 10 | 100 | - | 5 |
| Rio Grande/RS | | | | 20/07/10 | 16 / 18 | 16.000 | - | 207,9 |
| Suape/PE – Canal Interno | Em obra | 89% | 89% | 28/02/11 | 16,5 / 11 | 3.900 | - | 105,3 |
| Natal/RN | | 45% | 70% | 30/01/11 | 12,5 | 2.079 | 25 | 41,2 |
| Santos/SP | | 40% | 60% | 30/06/11 | 15 | 9.135 | 33 | 151,1 |
| Rio de Janeiro/RJ | | 35% | 45% | 30/06/11 | 15 / 13 / 11 / 9,5 / 9 | 3.500 | - | 159,2 |
| S. F. do Sul/SC | | 34% | 34% | 30/08/11 | 14 | 4.258 | 105 | 115,1 |
| Fortaleza/CE | | 30% | 60% | 30/03/11 | 14 | 5.947 | - | 66,7 |
| Cabedelo/PB | | 12% | 30% | 28/02/11 | 11 | 1.996 | 225 | 47,5 |
| Suape/PE – Canal Externo | | Licitação | - | - | 30/12/11 | 20 | 4.699 | 64 |
| Vitória/ES | 30/01/12 | | | | 14 | 1.866 | 96 | 108,8 |
| Santos/SP - derrocagem | 30/04/12 | | | | 16 | - | 33 | 30,2 |
| Itajaí/SC | 30/08/11 | | | | 12 / 12,5 | 6.300 | - | 68,3 |
| Paranaguá/PR | Ação Preparatória | | | | - | - | 30/01/12 | 16 / 15 / 14,5 |
| TOTAL GERAL PND | | | | | | 78.903 | 553 | 1.511,4 |

PORTOS

Evolução das Ações Significativas

Itaguaí – Dragagem do Canal de Acesso ao Porto – Fase 1



Santos – Construção da Avenida Perimetral Portuária – Margem Direita – Trecho 1



Santos – Construção da Avenida Perimetral Portuária – Margem Direita – Trecho 2



Itaqui – Recuperação do Berço 102



Programa Nacional de Dragagem



Rio Grande – Ampliação dos Molhes



Itaqui – Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto



Itaqui – Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroárea dos Berços 100 e 101



Itaqui – Recuperação do Berço 101



*Previsão em 31/12/2010

ITAGUAÍ – DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO AO PORTO – FASE 1



Draga "Breydel"

DESCRIÇÃO: Dragagem do canal de acesso e bacia de evolução de uma profundidade de 17m para 20m (Fase 1)

UF: RJ META: 4,5 milhões de m³

DATA DE CONCLUSÃO: 15/09/2009

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 72,9 milhões

EXECUTOR: Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

RESULTADO

➤ Obra concluída em 15/09/2009



SANTOS/SP – AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA MARGEM DIREITA – TRECHO 1



Vista aérea do viaduto

DESCRIÇÃO: Implantação da Avenida Perimetral no município de Santos, margem direita, com extensão de 4,64 km e construção de um pontilhão e de uma alça de viaduto

UF: SP META: 4,64 km
DATA DE CONCLUSÃO: 02/07/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 91,6 milhões
EXECUTOR: Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

RESULTADO

- Obra concluída em 02/07/2010, com liberação ao tráfego a partir de 09/07/2010



SANTOS/SP – AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA MARGEM DIREITA – TRECHO 2



Viaduto Praça da Santa

DESCRIÇÃO: Implantação da Avenida Perimetral no município de Santos, margem direita, com extensão de 1,35 km e construção de um viaduto de 410m

UF: SP META: 1,35 km
DATA DE CONCLUSÃO: 20/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 54,1 milhões
EXECUTOR: Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

RESULTADOS

- Executada a cravação de 100% das estacas das fundações do Viaduto da Praça da Santa (pilares concluídos, estacas de encontro e mesoestrutura em andamento), em 05/10/2010
- Tráfego normalizado nas proximidades do Terminal de Passageiros CONCAIS (Canal 4) em 07/10/2010

RESULTADO ATÉ 31/12/2010

- Obra concluída e pista liberada ao tráfego em 20/12/2010



* Previsão em 31/12/2010

ITAQUI – RECUPERAÇÃO DO BERÇO 102 – SÃO LUIS/MA



Berço 102 – Conclusão do piso em bloquete

DESCRIÇÃO: Recuperação do Berço 102 com 46,2m de comprimento

UF: MA

META: 100%

DATA DE CONCLUSÃO: 30/08/2010

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 28,3 milhões

OGU: R\$ 25,5 milhões

EMAP: R\$ 2,8 milhões

EXECUTOR: Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

RESULTADO

- Obra concluída em 30/08/2010



PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM



Dragagem de Rio Grande/RS

DESCRIÇÃO: Dragagem de aprofundamento nos principais portos brasileiros

UF: BR

META: 78,9 milhões de m³

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 1,5 bilhão

EXECUTOR: Secretaria de Portos – SEP/PR

RESULTADOS

- Concluídas as dragagens de 6 portos – Recife/PE – 12/12/2009; Rio Grande/RS – 20/07/2010; Angra dos Reis/RJ – 30/07/2010; Itaguaí/RJ – Fase 2 – 24/11/2010; Aratu/BA e Salvador/BA – 20/11/2010
- Obras em andamento em 7 portos
 - Suape/PE – Canal Interno – 89%; Natal/RN – 45%; Santos/SP – Dragagem – 40%; Rio de Janeiro/RJ – 35%; São Francisco do Sul/SC – 34%; Fortaleza/CE – 30% e Cabedelo/PB – 12%

PROVIDÊNCIAS

- Concluir dragagem de Suape/PE – Canal Interno até 28/02/2011
- Iniciar as obras de Itajaí/SC e Santos/SP – derrocagem até 28/02/2011
- Concluir as obras de Natal/RN e Fortaleza/CE até 30/03/2011



RIO GRANDE/RS – AMPLIAÇÃO DOS MOLHES



Cabeço do Molhe Oeste

DESCRIÇÃO: Prolongamento dos molhes do Porto de Rio Grande

UF: RS

META: 1,3 milhão de m³

DATA DE CONCLUSÃO: 30/01/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 462,4 milhões

EXECUTOR: Secretaria de Portos/Presidência da República

RESULTADOS

- Obras em andamento com 98% realizados até 30/10/2010
- Concluída elevação do molhe oeste para a cota +5 em 30/07/2010
- Concluída pavimentação e instalação de trilhos para vagoneteiros no Molhe Oeste em 30/09/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Concluir o prolongamento de toda a extensão do Molhe Leste em cota +2 até 31/12/2010
- Obra em andamento com 99% de execução física

PROVIDÊNCIA

- Concluir elevação do Molhe Leste para a cota +5 até 30/01/2011



ITAQUI – CONSTRUÇÃO DO BERÇO 100, ALARGAMENTO DO CAIS SUL E AMPLIAÇÃO DO PORTO – SÃO LUÍS/MA



Construção do Berço 100

DESCRIÇÃO: Construção do berço com 320m de comprimento e 26m de largura; alargamento do Cais Sul para 26m de plataforma

UF: MA

META: 100%

DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 126 milhões

OGU: R\$ 113 milhões

EMAP: R\$ 13 milhões

EXECUTOR: Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

RESULTADOS

- Obras em andamento com 55% realizados até 31/10/2010
- Conclusão da cravação, armação e concretagem de 150 estacas até 30/10/2010
- Concluída cravação das 192 estacas até 16/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras em andamento com 65% realizados

PROVIDÊNCIAS

- Conclusão da superestrutura do Cais Sul até 30/04/2011
- Conclusão das obras até 31/07/2011



ITAQUI – DRAGAGEM DOS BERÇOS 100 A 103 E DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO DA RETROÁRIA DOS BERÇOS 100 E 101 – SÃO LUÍS/MA



Dragagem do Berço 101

DESCRIÇÃO: Dragagem de aprofundamento do canal de acesso e da bacia de atracação dos berços 100 a 103, dragagem e construção do aterro hidráulico da retroárea dos berços 100 e 101 no Porto do Itaqui

UF: MA META: 1,8 milhão de m³
DATA DE CONCLUSÃO: 30/07/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 55 milhões
OGU: R\$ 49,5 milhões
EMAP: R\$ 5,5 milhões
EXECUTOR: Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

RESULTADOS

- Obra com 45 % de execução física
 - Dragagem do berço 100 – concluída
 - Dragagem dos berços 101 a 103 – concluída
 - Dragagem e construção da retroárea do berço 100 – obra paralisada

RESTRIÇÃO

- Obra paralisada em 13/11/2010 devido a inconsistências no projeto – contrato suspenso

PROVIDÊNCIAS

- EMAP deverá realizar novos levantamentos de campo
- Redefinir metodologia para dragagem e construção da retroárea



ITAQUI – RECUPERAÇÃO DO BERÇO 101 – SÃO LUÍS/MA



Berço 101 – Enrocamento

DESCRIÇÃO: Recuperação do Berço 101 – com 130,8m de comprimento; e retroárea: Berço 100 (28.000 m² de pavimentação) – 801.000 m³ de aterro e Berço 101 (33.900 m³)

UF: MA META: 100%
DATA DE CONCLUSÃO: 30/07/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 45,1 milhões
OGU: R\$ 39,5 milhões
EMAP: R\$ 5,6 milhões
EXECUTOR: Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

RESULTADOS

- Executado 10% do Berço 101 até 30/09/2010
- Contrato suspenso em 13/11/2010

RESTRIÇÃO

- Contrato suspenso: execução da obra depende da conclusão da dragagem do berço 100

PROVIDÊNCIA

- Aguardar solução técnica das obras de dragagem e compatibilizá-la com o projeto




HIDROVIAS



RESULTADOS 2007 A 2010

HIDROVIAS

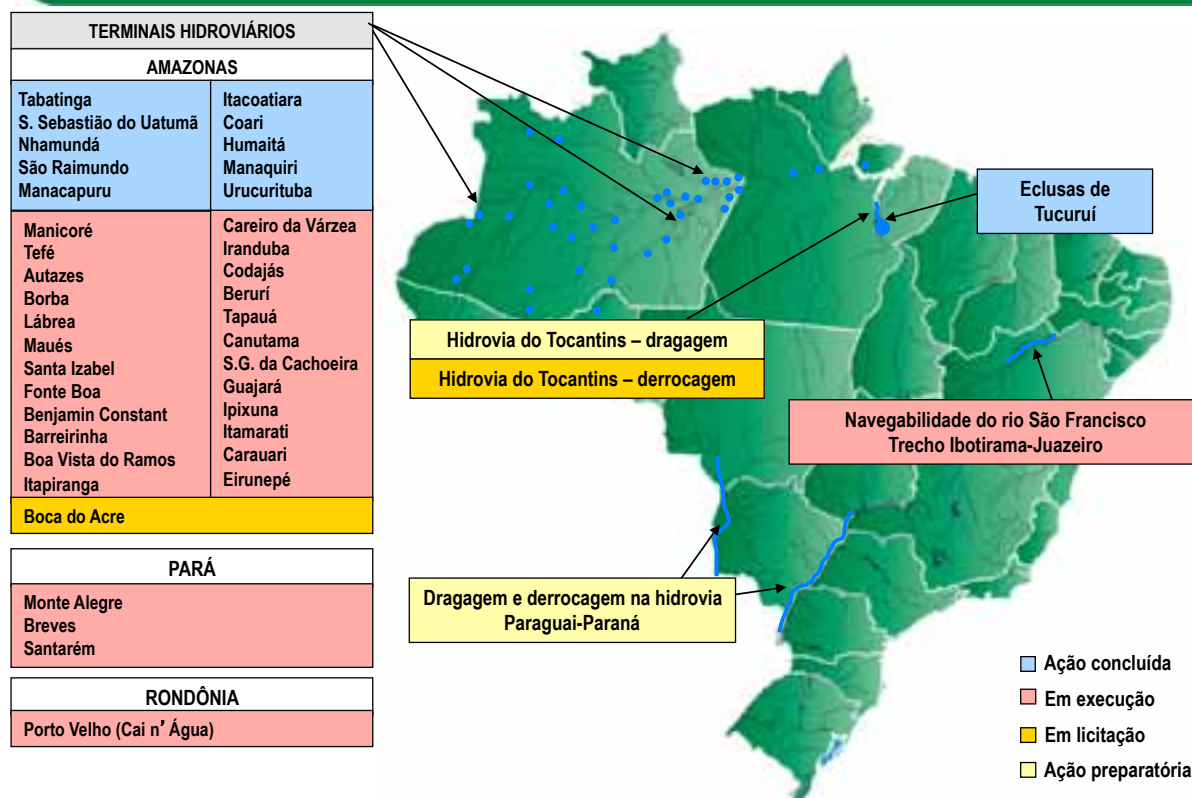

HIDROVIAS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras concluídas

- Eclusas de Tucuruí – Início da operação assistida em 30/11/2010
- 10 Terminais Hidroviários no Amazonas – Tabatinga, Coari, Itacoatiara, São Raimundo, Manacapuru, Humaitá, Manaquiri, Urucurituba, Nhamundá e São Sebastião do Uatumã

HIDROVIAS

EVOLUÇÃO DAS AÇÕES SIGNIFICATIVAS

Eclusas de Tucuruí



Dragagem e Derrocamento na Hidrovia Paraguai-Paraná



ECLUSAS DE TUCURUÍ



Vista a jusante da Eclusa 1 com o canal cheio

Construção das Eclusas de Tucuruí no rio Tocantins

UF: PA

META: 2 (duas) eclusas

DATA DE CONCLUSÃO: 30/11/2010

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 965,5 milhões

EXECUTOR: Eletronorte

RESULTADO

- Início da operação assistida em 30/11/2010

PROVIDÊNCIA

- Liberar navegação comercial até 30/03/2011



DRAGAGEM E DERROCAMENTO NA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ



Ponte Ayrton Sena – Rio Paraná

Paraná – Derrocamento de 29,6 mil m³ para uma extensão de 3 km, dragagem de 200 mil m³ para uma extensão de 10 km, sinalização e balizamento

UF: MS/PR

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 20 milhões

EXECUTOR: DNIT

RESULTADOS

- Rio Paraná – sentença da Justiça Estadual do Paraná determinou elaboração de EIA/RIMA para o derrocamento em 09/12/2009
- Rio Paraguai – contratado RCA com a Universidade Federal do Paraná em 10/08/2010

RESULTADO ATÉ 31/12/2010

- Rio Paraguai – concluir RCA até 15/12/2010

RESTRIÇÃO

- Rio Paraná – sentença judicial está em fase de recursos

PROVIDÊNCIAS

- Rio Paraná – Aguardar resultado dos recursos da decisão judicial para obter licenciamento
- Rio Paraguai – Publicar edital para obras de dragagem até 15/05/2011



AEROPORTOS



RESULTADOS 2007 A 2010

AEROPORTOS



AEROPORTOS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras concluídas

- Congonhas/SP – Pista de Pouso Principal em 14/09/2007 e Terminal de Passageiros em 30/11/2007
- João Pessoa/PB – Terminal de Passageiros em 26/11/2007
- Santos Dumont/RJ – Terminal de Passageiros em 30/11/2007
- Salvador/BA – Acesso Viário em 15/12/2008
- Boa Vista/RR – Terminal de Passageiros em 17/04/2009
- Fortaleza/CE – Terminal de Cargas em 10/11/2008 e Torre de Controle em 14/12/2009
- Parnaíba/PI – Ampliação e reforço da Pista de Pouso e Decolagem em 13/01/2010
- Confins/MG – Ampliação do Estacionamento de Veículos em 10/05/2010

Etapas concluídas de obras

- Galeão/RJ – Sistema de pistas e pátios – 2ª fase – reforma das pistas de táxi e pátio em 30/04/2010

Projetos concluídos – 4 aeroportos

- Curitiba/PR – Ampliação do Sistema de Pátios em 15/07/2010
- Confins/MG – Projeto básico de ampliação do Terminal de Passageiros em 31/08/2010
- Santarém/PA – Projeto básico do novo Terminal de Passageiros em 31/08/2010
- Galeão/RJ – Projeto básico de modernização e revitalização do Terminal de Passageiros em 31/12/2010

AEROPORTOS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras em andamento

- Galeão/RJ – Terminal de Cargas – 35% realizados*
- Galeão/RJ – Terminal de Passageiros 1 – obras emergenciais – concluídas a recuperação das fachadas em 18/04/2010 e a substituição de 37.600 m² de forro *Baffle* e luminárias em 18/11/2010
- Congonhas/SP – Construção da Torre de Controle – obra civil – 70% realizados*
- Recife/PE – Conector do atual TPS com instalação de 4 pontes de embarque – 72% realizados*
- Guarulhos/SP – Sistema de pistas e pátios – obras reiniciadas em 14/05/2010 – 66% realizados*
- São Gonçalo do Amarante /RN – Sistema de pistas – 1ª etapa – 86% realizados*
- Porto Alegre/RS – Construção do Terminal de Cargas – iniciada em 01/11/2010
- Parnaíba/PI – Pátio de aeronaves – iniciada em 03/11/2010
- Curitiba/PR – Ampliação do Terminal de Cargas – iniciada em 29/11/2010
- Guarulhos/SP – Pista de táxi saída rápida – iniciar até 15/12/2010

Projetos em elaboração – 8 aeroportos

- Foz do Iguaçu/PR, Florianópolis/SC, Guarulhos/SP, Manaus/AM, Teresina/PI, Brasília/DF, Fortaleza/CE e Campinas/SP

* Previsão em 31/12/2010

AEROPORTOS

Evolução das Ações Significativas

Aeroporto de Congonhas – Pista



Aeroporto Santos Dumont – Terminal de Passageiros



Aeroporto de Salvador – Acesso Viário



Aeroporto de Boa Vista – Terminal de Passageiros



Aeroporto de Fortaleza – Torre e Terminal de Cargas



Aeroporto de Guarulhos – Sistema de pista e pátio



Aeroporto de Brasília – Terminal de Passageiros



Aeroporto de Vitória – Terminal de Passageiros



Aeroporto de Macapá – Terminal de Passageiros



CONGONHAS/SP

Pista de Pouso Principal



Pista Principal

DESCRIÇÃO: Recuperação do pavimento da pista de pouso principal e pistas de táxi

UF: SP

META: 1.940m

DATA DE CONCLUSÃO: 14/09/2007

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 20 milhões

RESULTADO

➤ Obra iniciada em 14/05/2007 – concluída em 14/09/2007



SANTOS DUMONT/RJ

Terminal de Passageiros



Terminal de Passageiros

DESCRIÇÃO: Reforma e ampliação do terminal de passageiros, pistas, pátios e obras complementares

UF: RJ

META: 61.000m²

DATA DE CONCLUSÃO: 30/11/2007

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 88,1 milhões

RESULTADO

➤ Obra concluída em 30/11/2007



SALVADOR/BA

Acesso Viário



Sistema Viário

DESCRIÇÃO: Ampliação e readequação do sistema viário de acesso

UF: BA

META: 7 km

DATA DE CONCLUSÃO: 15/12/2008

INVESTIMENTO 2007 – 2010: R\$ 29,5 milhões

RESULTADO

➤ Obras iniciadas em 02/01/2008 e concluídas em 15/12/2008



BOA VISTA/RR

Terminal de Passageiros



Terminal de Passageiros

DESCRIÇÃO: Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros, reurbanização do acesso e construção de edificações complementares ampliando sua capacidade de 270 para 330 mil passageiros/ano

UF: RR

META: 7.003m²

DATA DE CONCLUSÃO: 17/04/2009

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 9,1 milhões

RESULTADO

➤ Obra concluída em 17/04/2009



FORTALEZA/CE

Terminal de Cargas e Torre de Controle



Terminal de Cargas e Torre

DESCRIÇÃO: Construção do Terminal de Cargas, de vias de acesso, reforço do pátio e pista de táxi e construção da Torre de Controle e destacamento de controle do espaço aéreo

UF: CE

META: 3.200m²

DATA DE CONCLUSÃO DO TECA: 10/11/2008

DATA DE CONCLUSÃO DA TORRE: 14/12/2009

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 25,6 milhões

RESULTADOS

➤ Obra do TECA concluída em 10/11/2008

➤ Obra da Torre concluída em 14/12/2009



GUARULHOS/SP

Sistema de Pista e Pátio



Sistema de pistas e pátios

DESCRIÇÃO: Implantação, adequação, ampliação e revitalização do sistema de pistas e pátios, de recuperação e revitalização do sistema de macrodrenagem existente

UF: SP META: 11 km

DATA DE CONCLUSÃO: 11/01/2012

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 103,3 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 179,1 milhões

EXECUTOR: Infraero

RESULTADOS

- Infraero foi autorizada pela Justiça a retomar a execução das obras, que não constavam do contrato rescindido, em 30/04/2010
- Reiniciadas as obras com o Exército em 14/05/2010
- Obras do Exército – realizados 20% até 31/10/2010, elevando o percentual total das obras para 62%
- Juiz nomeou Instituto Mauá para realização da perícia nas demais frentes de obra – início dos trabalhos em 16/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras do Exército – 30% realizados, elevando o percentual total das obras para 66%

RESTRIÇÃO

- Impossibilidade de retomada integral da obra até a conclusão da perícia

PROVIDÊNCIAS

- Reiniciar a execução de 1/3 da pista, paralisadas em função de solicitação das companhias aéreas com a concordância da ANAC, até 30/03/2011, após término da temporada de férias de verão e período chuvoso
- Instituto Mauá – concluir perícia até 10/04/2011
- Concluir as obras que já estão em andamento, executadas pelo Exército, até 05/06/2011
- Iniciar as obras que serão liberadas após perícia até 30/05/2011



BRASÍLIA/DF

Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros



Reforma e Ampliação Sul do TPS

DESCRIÇÃO: Execução das obras e serviços de engenharia para ampliação sul do Terminal de Passageiros

UF: DF META: 160.000m²

DATA DE CONCLUSÃO: 10/04/2013

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 9,7 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 139,3 milhões

EXECUTOR: Infraero

RESULTADOS

- Projeto básico – 48% realizados
- MOP – Módulo Operacional – obra concluída em 07/09/2010 – entrada em operação em 10/11/2010
- Projeto do Lote 1 – Reforma do corpo central do TPS – concluído e aprovado em 13/10/2010
- Projeto Executivo iniciado em 01/11/2010
- Publicação do edital de licitação da obra de reforma do corpo central do TPS em 02/12/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Projeto Básico – 55% realizados

RESTRIÇÃO

- Morosidade na elaboração do projeto básico por parte da empresa projetista contratada

PROVIDÊNCIAS

- Concluir projeto básico até 09/05/2011
- Concluir projeto executivo até 17/11/2011
- Obra de reforma do corpo central do TPS – iniciar até 15/05/2011
- Obra do pátio de aeronaves – publicar o edital até 01/03/2011
- Obra de ampliação do Terminal de Passageiros – publicar o edital até 30/06/2011



VITÓRIA/ES

Terminal de Passageiros e Pista



Local do Terminal de Passageiros e Pista

DESCRIÇÃO: Construção do novo Terminal de Passageiros, Torre de Controle, Central de Utilidades, Edifício do Corpo de Bombeiros e Sistema de Pista 01/19, ampliando a capacidade de 560 mil para 2,1 milhões de passageiros por ano

UF: ES META: 26.578m²
DATA DE CONCLUSÃO: 12/09/2013
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 43,2 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 257,7 milhões
EXECUTOR: Infraero

RESULTADOS

- Assinado contrato com IPT-USP para perícia técnica, em 12/02/2010
- Assinada Ordem de Serviço para a obra de instalação do Módulo Operacional Provisório em 10/03/2010
- Início da revisão dos projetos em 24/09/2010
- Aberta a licitação da obra do Edifício do Corpo de Bombeiros em 27/09/2010
- Republicação do edital da obra da Torre de Controle em 12/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Iniciar obra do Edifício do Corpo de Bombeiros

RESTRIÇÕES

- Obra paralisada desde 30/07/2008
- Nova licitação da obra depende de acordo judicial quanto aos serviços já realizados

PROVIDÊNCIAS

- ANAC aprovar, em definitivo, Plano Diretor e de Zona de Proteção do Aeródromo até 30/01/2011
- Iniciar obra da Torre de Controle até 10/02/2011
- Exército – revisão e complementação de projetos executivos para a infraestrutura – concluir até 19/10/2011
- Iniciar obras de infraestrutura até 30/09/2011
- Publicar o edital de licitação da complementação do projeto executivo do TPS e edificações complementares até 30/01/2011
- Concluir instalação do Módulo Operacional Provisório em 31/01/2011



MACAPÁ/AP

Terminal de Passageiros, Sistema Viário e Pátio



Construção novo Terminal de Passageiros

DESCRIÇÃO: Construção de novo Terminal de Passageiros, Sistema Viário, Edificações de Apoio, Ampliação do Pátio de Aeronaves e Obras Complementares, ampliando a capacidade de 170 para 700 mil passageiros por ano

UF: AP META: 17.000m²
DATA DE CONCLUSÃO: 20/07/2013
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 15,7 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 99,2 milhões
EXECUTOR: Infraero

RESULTADOS

- Obra da cobertura do TPS – 95% realizados
- Rescisão contratual publicada em 27/11/2008
- MOP – Módulo Operacional – obra iniciada em 13/09/2010
- Execução das obras complementares – sistema de pátio, pista de rolamento e decolagem: projeto concluído em 15/10/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Conclusão da obra da cobertura do TPS

RESTRIÇÃO

- Paralisação das obras devido a questionamento judicial da empresa cujo contrato foi rescindido

PROVIDÊNCIAS

- Infraero obter decisão favorável sobre a ação ordinária que contesta a rescisão contratual
- Concluir instalação do MOP até 19/02/2011
- Publicar edital da complementação do Projeto Executivo do TPS até 28/02/2011






CABO 12km
RECIFE 46km



**OBRA
CONCLUÍDA**
PROGRAMA DE
PAC ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO

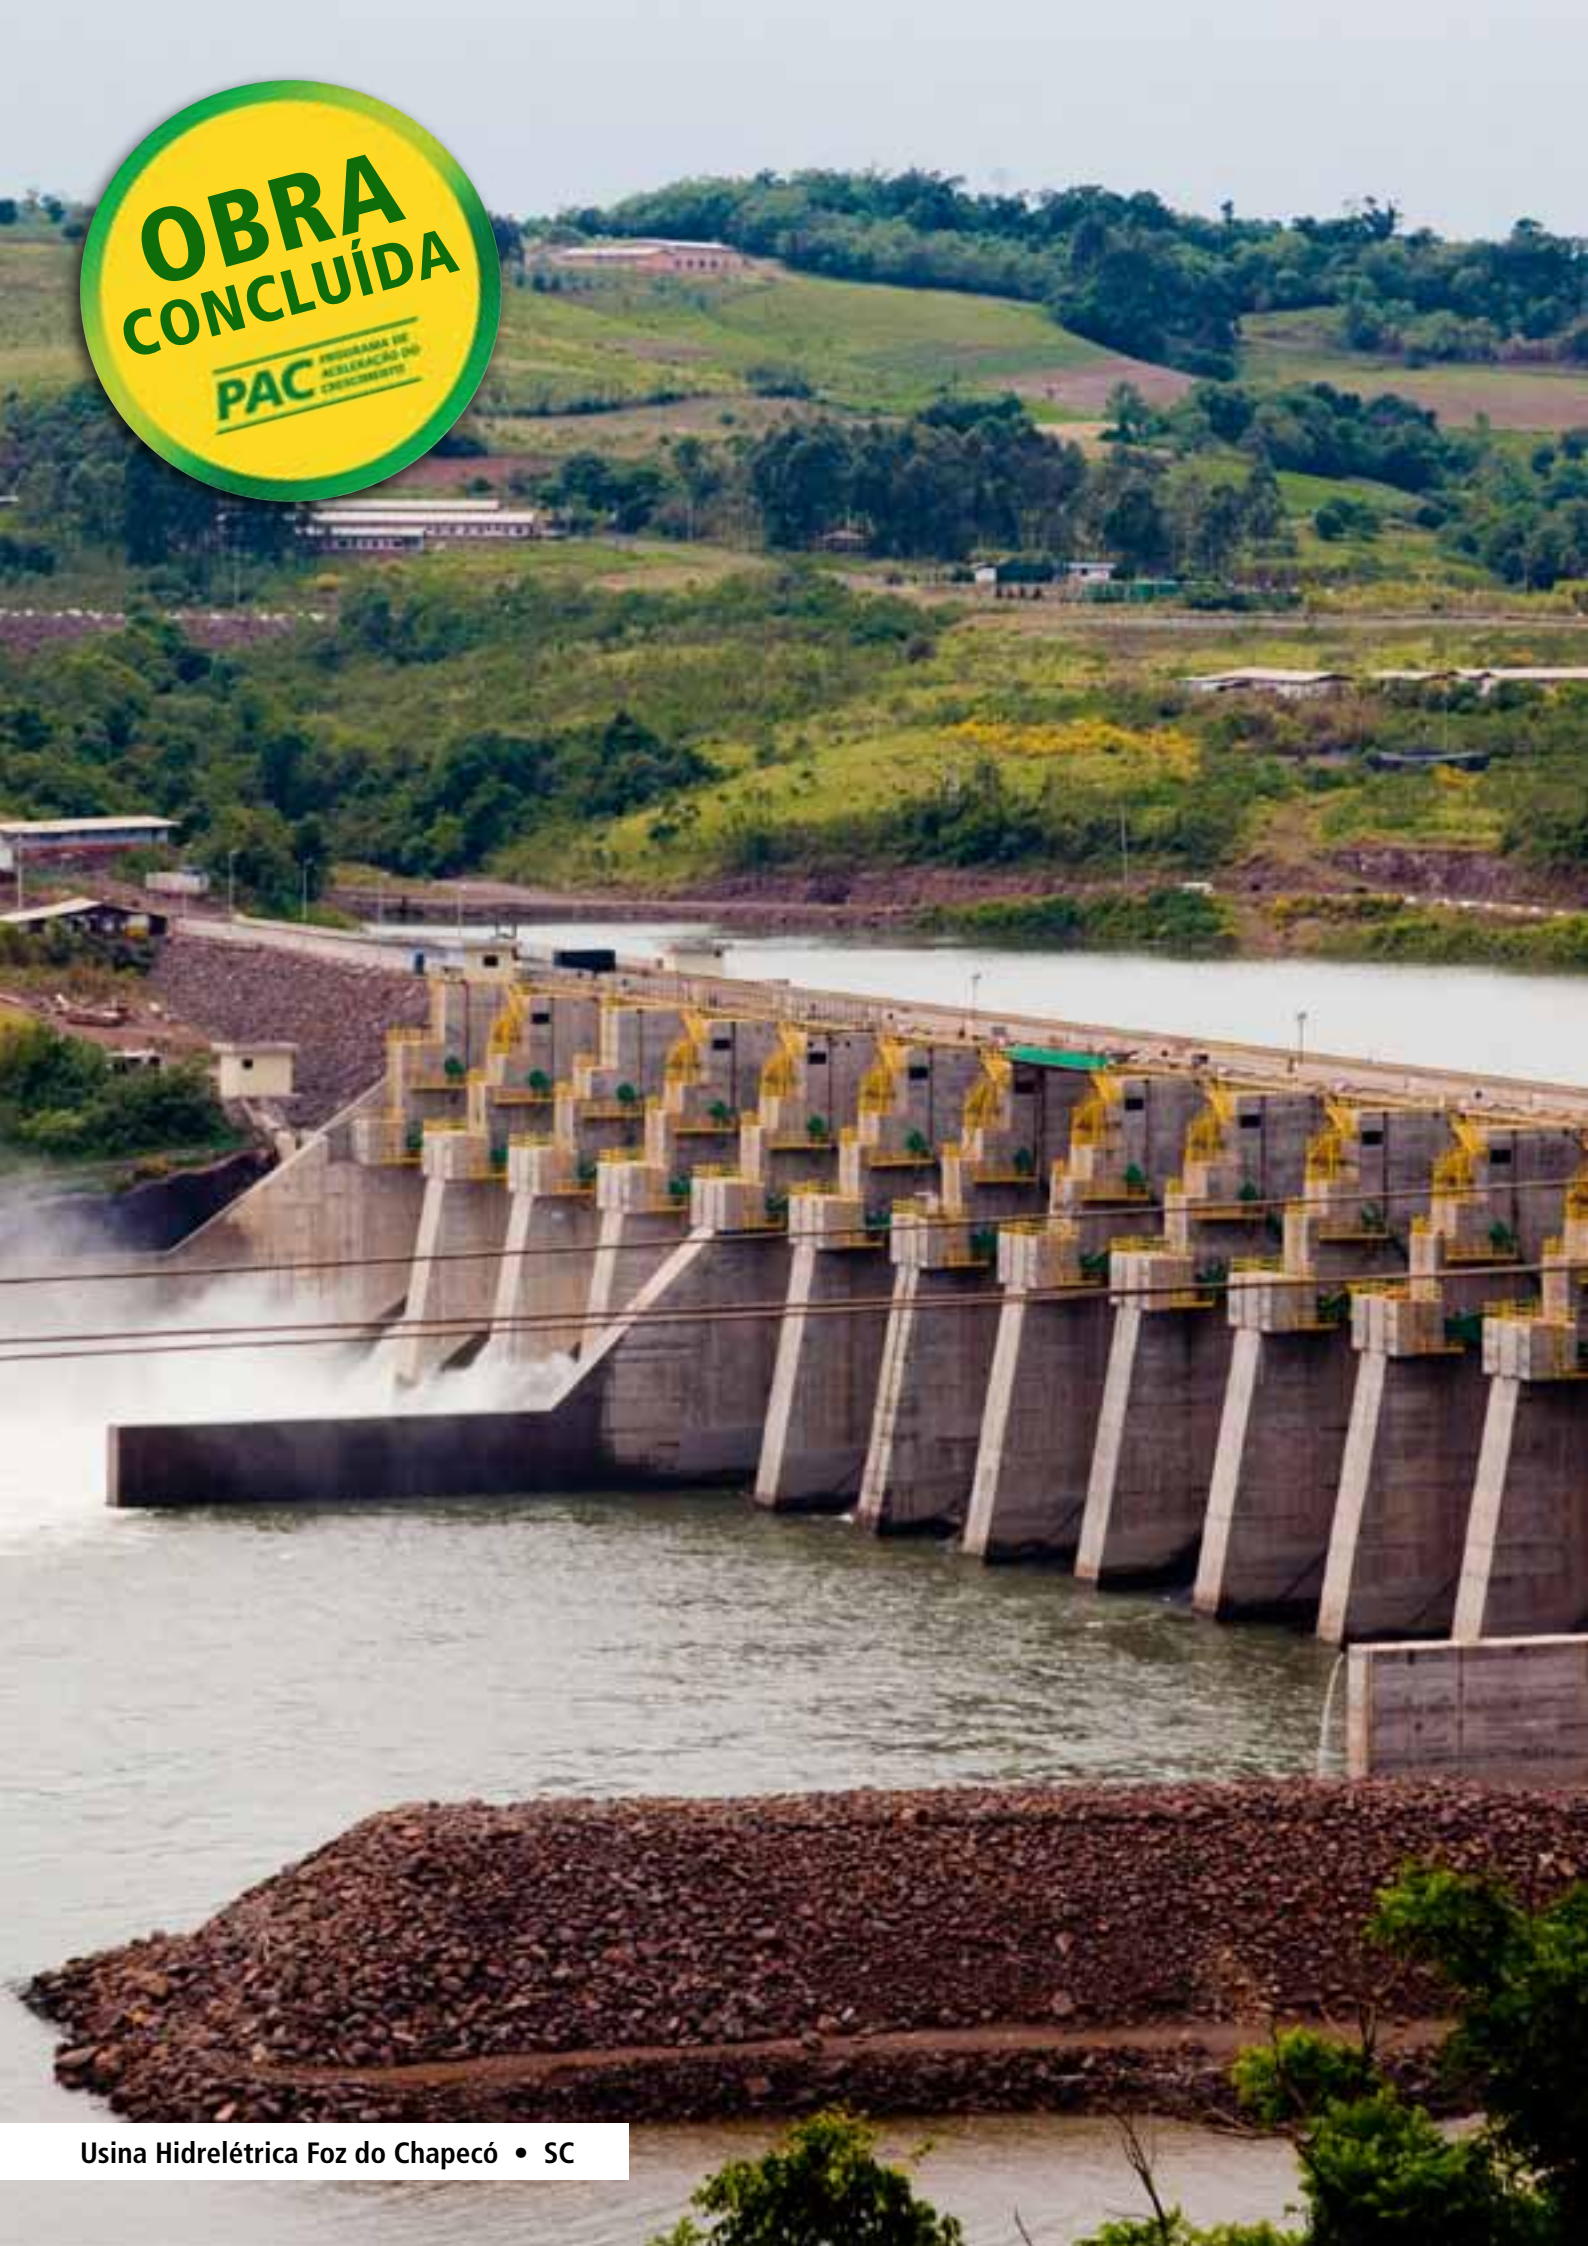

Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó • SC



Infraestructura Energética

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

No final de outubro de 2010 eram monitoradas 705 ações do eixo de Energia.

A evolução das ações monitoradas mostra que, por valor, 43% foram concluídas e 56% estão com execução adequada, enquanto 1% merece atenção.

Pelo critério de quantidade, o índice de concluídas é de 51% e o de ações em ritmo adequado, de 42%. As ações em atenção somam 6% e as com situação preocupante, 1%.

Em relação à evolução do estágio das ações monitoradas desde 2007, por valor, 49% foram concluídas e 50% estão em obras. Há, ainda, 1% em licitação da obra.

Dos empreendimentos incluídos no PAC após 2008, 51%, em valor, foram concluídos e 26% estão em obras. Outros 22% estão em licitação e 1% em licenciamento ou projeto.

Pelo critério de quantidade, 61% das ações do eixo de Energia acompanhadas desde 2007 foram concluídas, 28% estão em obras, 6% em licitação e 5% em projeto ou licenciamento.

No grupo de ações incluídas após 2008, considerada a quantidade, 29% foram concluídas, 35% estão em obras, 31% em licitação da obra e 5% em fase de projeto ou licenciamento.



Usina Hidrelétrica Estreito • TO/MA

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Evolução do Monitoramento do PAC



Dezembro/2009 – 694 ações monitoradas

Abril/2010 – 694 ações monitoradas

Outubro/2010 – 705 ações monitoradas devido a desmembramentos

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA


Evolução da Situação das Ações Monitoradas

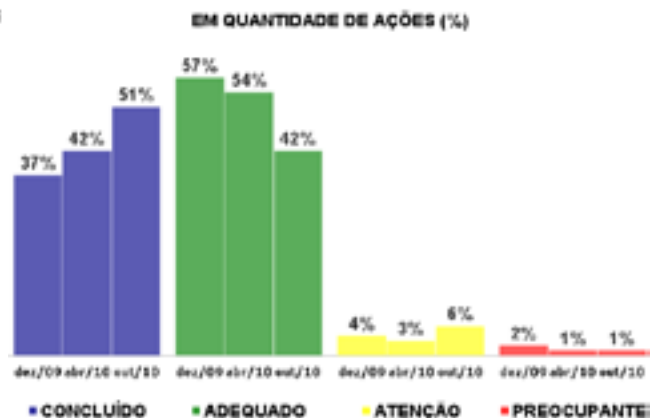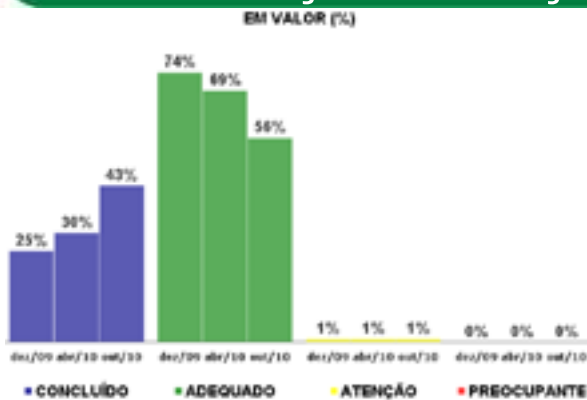

Posição: 31 de outubro de 2010


INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Valor

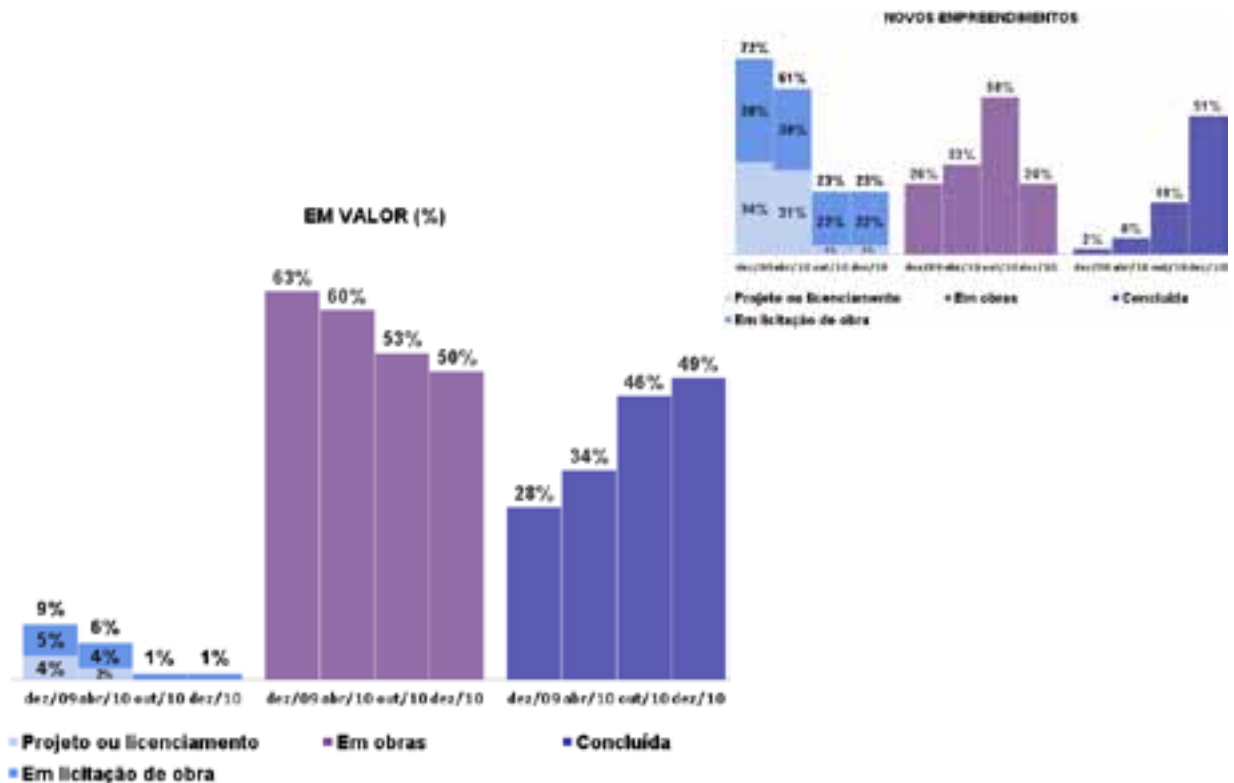

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Quantidade

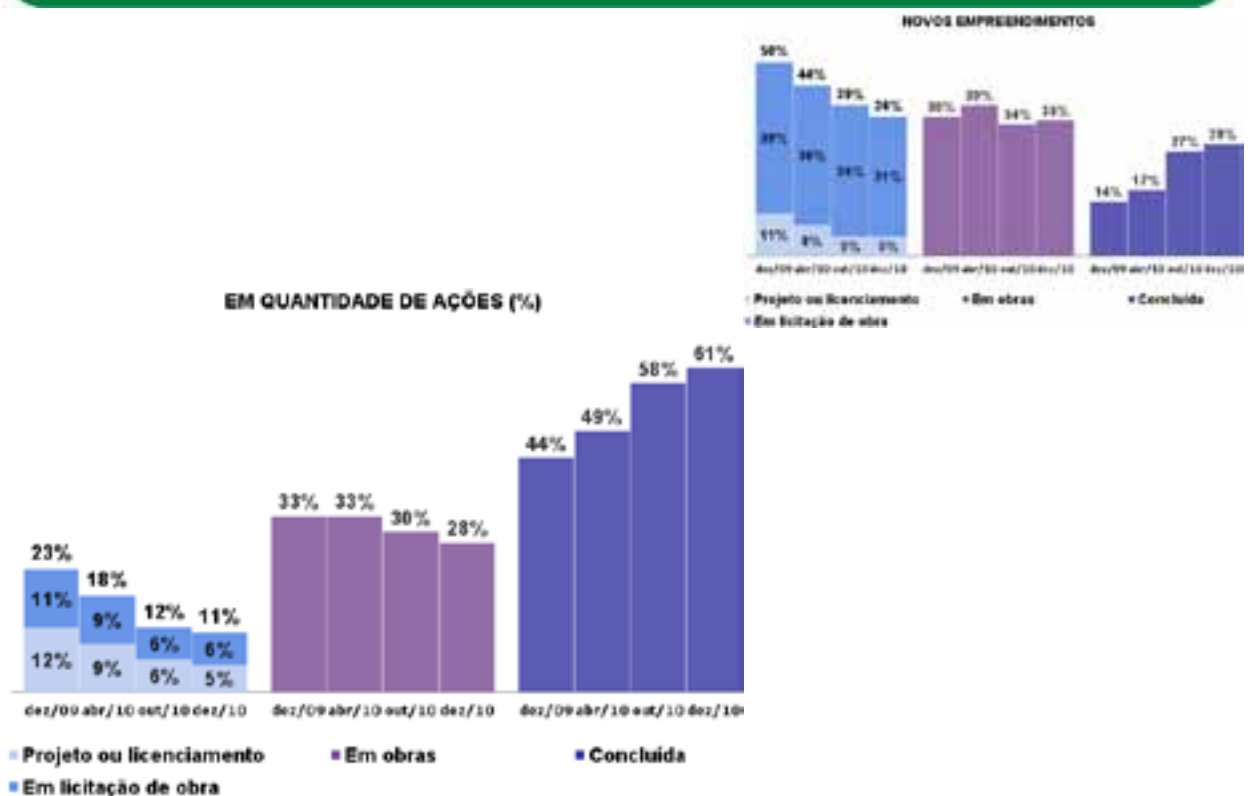


GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA



RESULTADOS 2007 A 2010


GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A licitar e em implantação

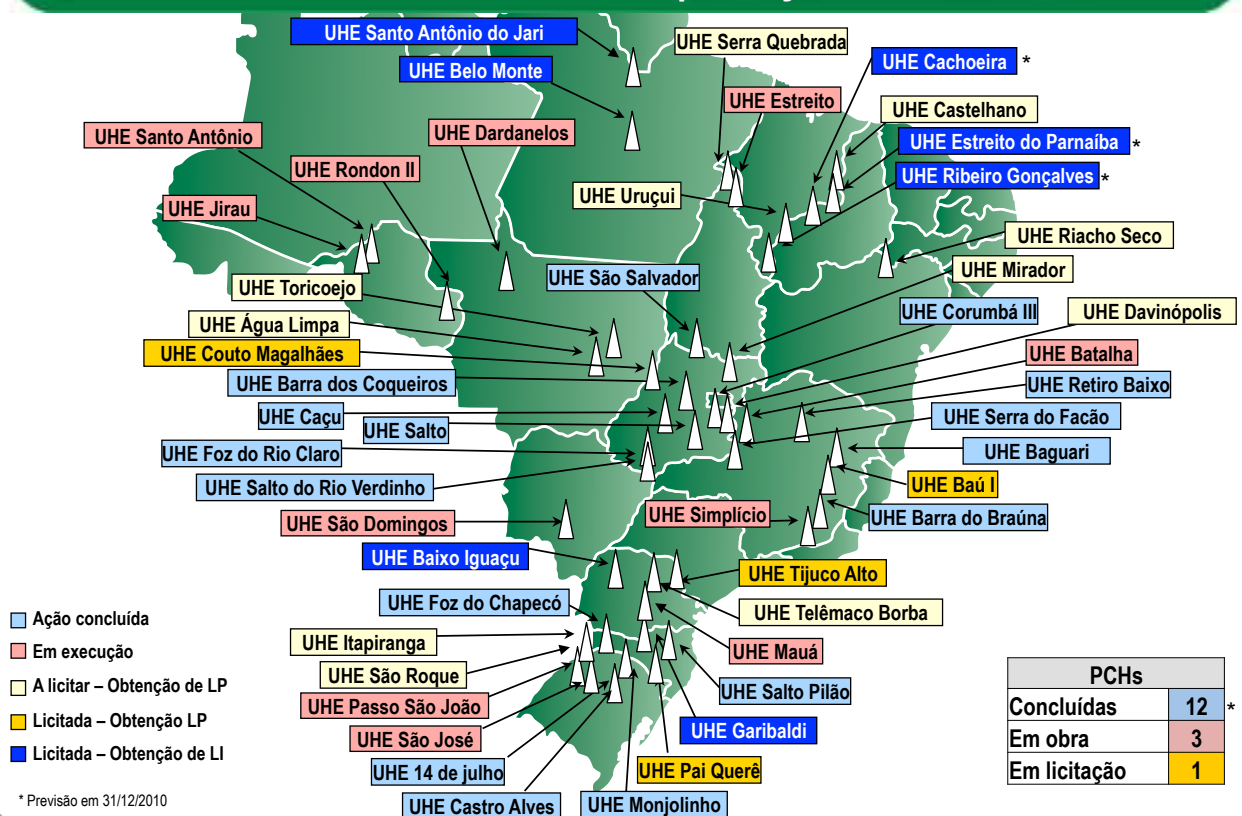


GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

UTES

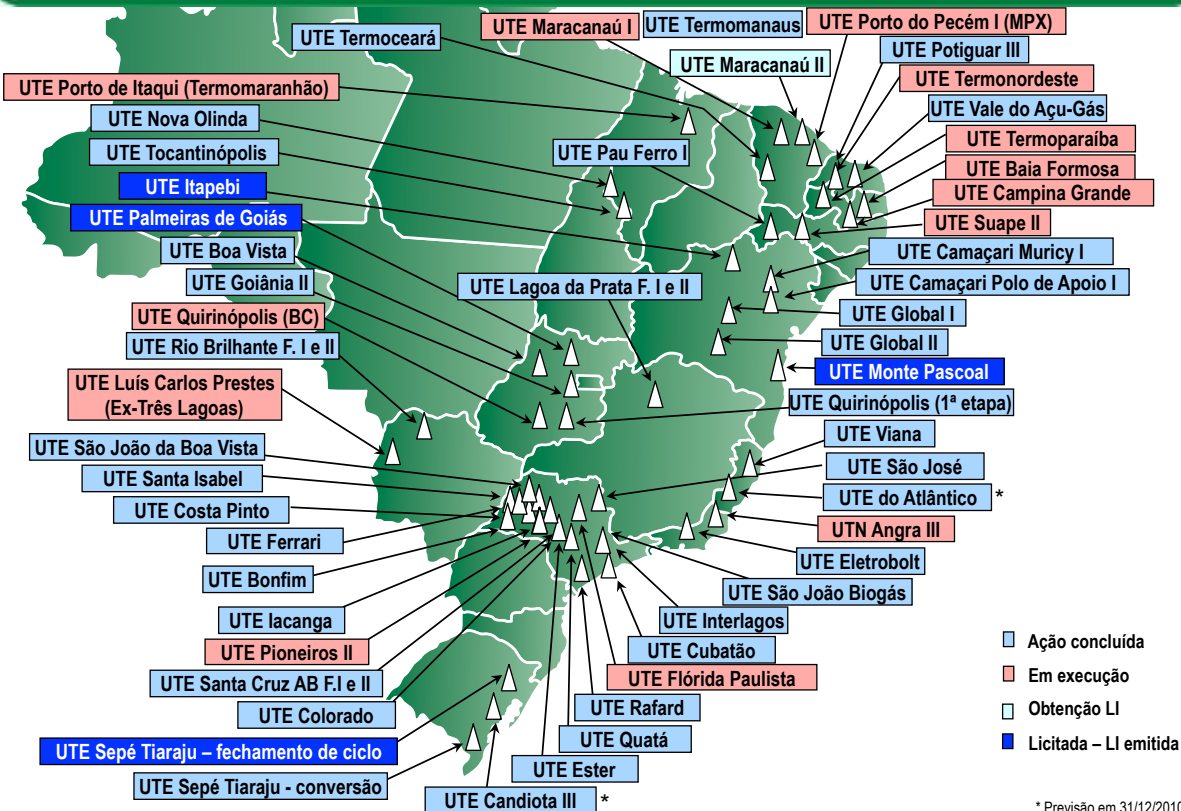


GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Usinas Termelétricas A-3 e A-5 – 2008

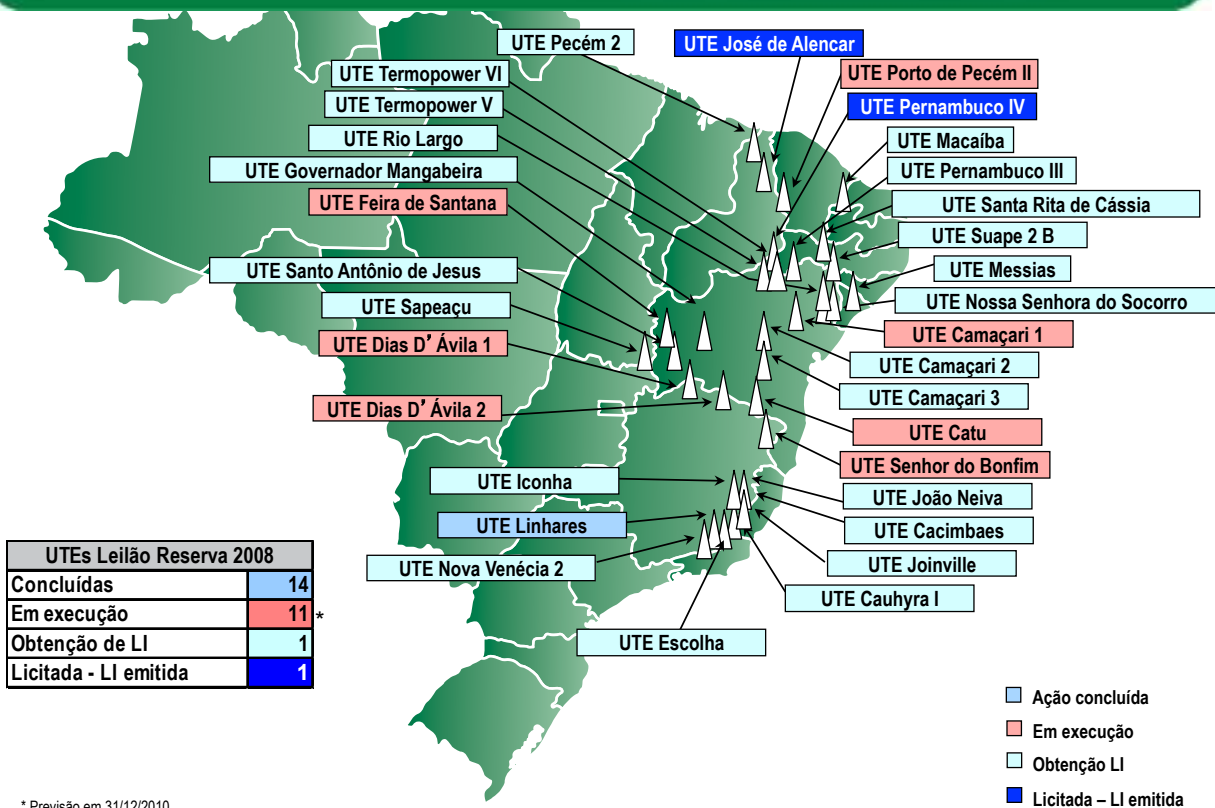

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Inventário e Viabilidade

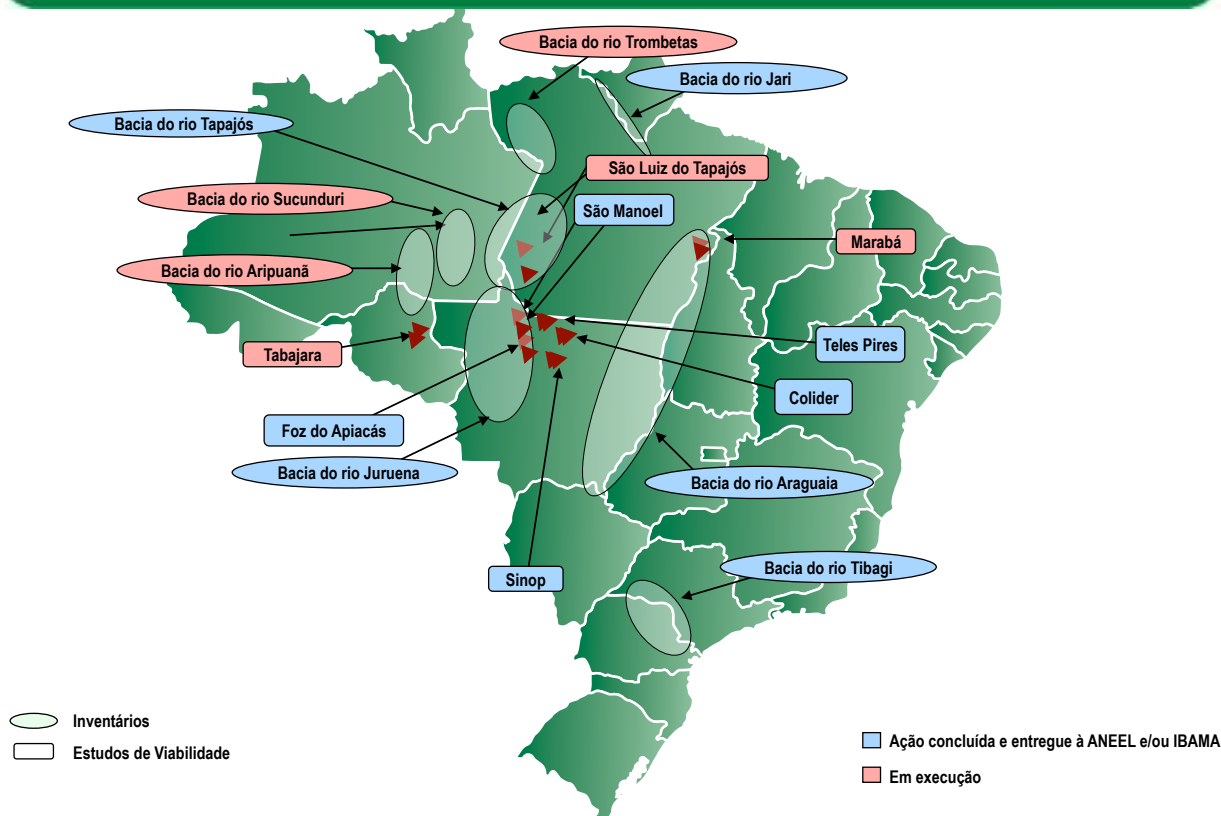

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Principais Resultados 2007 a 2010

Operação Comercial* – 10.852 MW

16 UHEs – 2.586 MW – 57 UTEs – 6.311 MW – 62 PCHs – 1.245 MW – 35 UEEs – 710 MW

Destaques

- UHE Foz do Chapecó – 855 MW
- UHE São Salvador – 243 MW
- UHE Serra do Facão – 212,6 MW
- UHE Salto Pilão – 182 MW
- UHE Baguari – 140 MW
- UHE Castro Alves – 130 MW
- UHE Salto – 116 MW
- UHE Salto do Rio Verdinho – 93 MW
- UHE Barra dos Coqueiros – 90 MW
- UTE do Atlântico – 490 MW *
- UTE Candiota III – 350 MW *
- UTE Eletrobolt – 386 MW
- UTE Cubatão – 216 MW
- UTEs Global I e II – 297,6 MW
- UTE Linhares – 204 MW
- UEE Volta do Rio – 42 MW

Em andamento* – 15.274 MW

11 UHEs – 8.797 MW – 31 UTEs – 6.069 MW – 5 PCHs – 78 MW – 11 UEEs – 330 MW

Destaques

- UHE Santo Antônio – RO – 3.150 MW – 38% realizados*
- UHE Jirau – RO – 3.300 MW – 37% realizados*
- UHE Estreito – TO/MA – 1.087 MW – 95% realizados*
- UHE Dardanelos – MT – 261 MW – 92% realizados*
- UHE Simplicio – MG/RJ – 334 MW – 75% realizados*
- UTE Angra III – RJ – 1.405 MW – 8% realizados*

Concluídos – 5 Inventários – 24.737 MW – 6 Viabilidades – 14.789 MW

- Viabilidades – Belo Monte – 11.233 MW, Teles Pires – 1.820 MW, São Manoel – 746 MW, Sinop – 461 MW, Colider – 342 MW e Foz do Apicás – 275 MW
- Inventários dos rios: Tapajós – 14.245 MW, Araguaia – 3.100 MW, Jurueña – 5.000 MW, Tibagi – 1.291 MW e Jari – 1.100 MW
- Em execução 3 Estudos de viabilidade e 3 Inventários

* Previsão em 31/12/2010

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Resultados 2007 a 2010

15 Leilões realizados* – 42.711 MW – R\$ 105 Bilhões – Deságio médio 10,5 %

| Leilões | Data de Realização | Fonte | Potência (MW) | Deságio | Investimento (R\$ Milhões) |
|------------------------------|--------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|
| 4º Energia Nova (A - 3) | 26/07/07 | Termo | 1.782 | 3,8% | 2.877,4 |
| 1º Fontes Alternativas | 18/06/07 | Termo | 542 | 0,8% | 11.736,3 |
| | | Hidro | 102 | 0,0% | |
| 5º Energia Nova (A-5) | 16/10/07 | Termo | 1.970 | 9,0% | 4.287,4 |
| | | Hidro | 2.383 | -2,5% | |
| UHE Santo Antônio | 10/12/07 | Hidro | 3.150 | 35,4% | 9.495,4 |
| UHE Jirau | 19/05/08 | Hidro | 3.300 | 21,6% | 8.699,1 |
| 1º Energia Reserva | 14/08/08 | Biomassa | 2.379 | -5,1% | 4.590,2 |
| 6º Energia Nova (A-3) | 17/09/08 | Termo | 1.935 | 14,4% | 3.491,8 |
| 7º Energia Nova (A-5) | 30/09/08 | Termo | 5.577 | 0,5% | 11.281,5 |
| | | Hidro | 350 | 19,5% | |
| 8º Energia Nova (A-3) | 27/08/09 | Termo | 45 | 1,0% | 95,7 |
| | | Hidro | 6 | 0,0% | |
| Energia de reserva - Eólicas | 14/12/09 | Eólica | 1.805 | 21,5% | 9.398,9 |
| UHE Belo Monte | 20/04/10 | Hidro | 11.233 | 6,0% | 19.000,0 |
| 10º Energia Nova (A-5) | 30/07/10 | Hidro | 809 | 12,0% | 3.212,5 |
| | | Eólica | 1.520 | 20,0% | 6.474,0 |
| 2º Fontes Alternativas | 26/08/10 | Hidro | 101 | 5,0% | 588,2 |
| | | Biomassa | 65 | 17,0% | 98,3 |
| | | Eólica | 528 | 27,0% | 2.336,7 |
| 3º Energia Reserva | 25 e 26/08/2010 | Hidro | 31 | 16,0% | 173,0 |
| | | Biomassa | 648 | 7,0% | 1.133,1 |
| 11º Energia Nova (A-5) * | 17/12/10 | Hidro | 2.452 | - | 6.099,7 |

* Previsão em 31/12/2010

GERAÇÃO DE ENERGIA

Evolução das Ações Significativas

Em implantação

UTE Interlagos



UHE Jirau



UHE Castro Alves



UHE Belo Monte



UHE São Salvador



UHE Estreito



UHE Corumbá III



UHE Dardanelos



UHE Foz do Chapecó



UHE Simplício




UTE do Atlântico



UTN Angra III




UTE Candiota III



UHE Pai Querê



UHE Santo Antônio



UHE Baixo Iguaçu



* Previsão em 31/12/2010

UTE INTERLAGOS



Vista geral da usina

DESCRIÇÃO: UTE à biomassa (bagaço de cana) com 15,6 MW médios.

UF: SP

META: 40 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 31/05/2007

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 68,80 milhões

EMPREENDEDOR: Usina Interlagos

RESULTADO

- Usina iniciou operação comercial em 31/05/2007



UHE CASTRO ALVES



Vista Geral

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 64 MW médios no rio das Antas.

UF: RS

META: 130 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 04/03/2008

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 132,93 milhões

EMPREENDEDOR: CERAN (CPFL 65,00%; DESENVIX 5%; CEEE 30%)

RESULTADOS

- Operação comercial da primeira unidade iniciada em 04/03/2008
- Operação comercial da segunda unidade iniciada em 02/04/2008



UHE SÃO SALVADOR



Vista Geral

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 148,5 MW médios no rio Tocantins

UF: TO/GO

META: 243 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 30/05/2009

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 641,8 milhões

EMPREENDEDOR: Companhia Energética São Salvador (TRACTEBEL 100%)

RESULTADO

- Iniciada a operação em teste da UG-1 em 21/05/2009



UHE CORUMBÁ III



Tomada D' água

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 50,9 MW médios no Rio Corumbá.

UF: GO

META: 95,5 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 24/10/2009

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 340,2 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 0,4 milhão

EMPREENDEDOR: Consórcio Empreendedor Corumbá III
(NEOENERGIA 60%; CEB 15%; CELG 15%; STRATA 5%;
ENERG POWER 5%)

RESULTADO

- Operação comercial iniciada em 24/10/2009



UHE FOZ DO CHAPECÓ



Vista Aérea

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 432 MW médios no rio Uruguai

UF: SC/RS

META: 855 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 14/10/2010

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 2,1 bilhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 54,1 milhões

EMPREENDEDOR: Consórcio Energético Foz do Chapecó (FURNAS 40%, CEEE 9% e CPFL 51%)

RESULTADOS

- Liberada a Unidade Geradora UG-01 para início da operação comercial em 14/10/2010
- Liberada a Unidade Geradora UG-02 para início da operação comercial em 23/11/2010



UTE DO ATLÂNTICO



Vista Aérea do Empreendimento

DESCRIÇÃO: Construção de UTE a gás de processo com 419,8 MW médios

UF: RJ

META: 490 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 20/12/2010

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1,2 bilhão

EMPREENDEDOR: Thyssenkrupp CSA Companhia Siderúrgica

RESULTADOS

- Obras em andamento com 99% realizados
- Unidades geradoras – operação em teste

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Emissão de LO até 15/12/2010
- Entrada em operação comercial até 20/12/2010



* Previsão em 31/12/2010

UTE CANDIOTA III



Vista Geral

DESCRIÇÃO: Construção de UTE a carvão mineral com 303,5 MW médios

UF: RS META: 350 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 20/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1,2 bilhão
EMPREENDEDOR: CGTEE (100%)

RESULTADOS

- Obras em andamento com 99% realizados, sendo 21% em 2010
- Iniciada a operação em teste em 08/11/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Emissão de LO até 15/12/2010
- Entrada em operação comercial até 20/12/2010



* Previsão em 31/12/2010

UHE SANTO ANTÔNIO



Vista Jusante - Vertedouro Principal

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 2.218 MW médios no rio Madeira

UF: RO META: 3.150 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 20/12/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 6,1 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 8,2 bilhões
EMPREENDEDOR: Santo Antônio Energia S.A.
(ODEBRECHT 18,6%, Construtora Andrade Gutierrez S.A. 12,4%, FURNAS 39%, CEMIG 10% e FIP 20%)

RESULTADOS

- Obras em andamento com 34% realizados, sendo 14% em 2010
- Em andamento a concretagem das estruturas principais e montagem eletromecânica das turbinas

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras em andamento com 38% previstos, sendo 18% em 2010

PROVIDÊNCIA

- Executar 42% até 30/04/2011



UHE JIRAU



Casa de Força

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 1.975,3 MW médios no rio Madeira

UF: RO

META: 3.300 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 5,4 bilhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 4,2 bilhões

EMPREENDEDOR: Consórcio Energia Sustentável do Brasil (SUEZ 50,1%, Camargo Corrêa Investimentos em Infraestrutura 9,9%, ELETROSUL 20% e CHESF 20%)

RESULTADOS

- Obras em andamento com 34% realizados, sendo 22% em 2010
- Em andamento a concretagem das estruturas principais e a montagem eletromecânica das turbinas

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras em andamento com 37% previstos, sendo 25% em 2010

PROVIDÊNCIA

- Executar 41% até 30/04/2011



UHE BELO MONTE



Local da Usina

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 4.571 MW médios no Rio Xingu

UF: PA

META: 11.233 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2015

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: 19 bilhões

EMPREENDEDOR: Norte Energia S.A (ELETRONORTE 19,98%; CHESF 15%; Outros 16,02%; ELETROBRÁS 15%; Bolzano 10%; Petros 10%; Gaia Energia e Participações 9%; Caixa FIP Cevix 5%)

RESULTADOS

- Leilão realizado em 20/04/2010
- Celebrado contrato de concessão em 26/08/2010
- Protocolado o PBA no IBAMA em 30/09/2010
- Realizada vistoria técnica no período de 16 a 20/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Emissão da licença para instalações específicas até 22/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Iniciar obras das instalações específicas até 15/01/2011



UHE ESTREITO



Vertedouro

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 641,1 MW médios no rio Tocantins

UF: TO/MA

META: 1.087 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 30/04/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 3,7 bilhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 207 milhões

EMPREENDEDOR: Consórcio Estreito Energia (Camargo Corrêa 4,4%, SUEZ 40,1%, ALCOA 25,5% e CVRD 30%)

RESULTADOS

- Obras em andamento com 94% realizados, sendo 13% em 2010
- Em andamento a montagem eletromecânica das turbinas e geradores
- LO emitida pelo Ibama em 24/11/2010
- Início do enchimento do reservatório em 30/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras em andamento com 95% previstos, sendo 14% em 2010

PROVIDÊNCIA

- Concluir o empreendimento até 30/04/2011



UHE DARDANELOS



Vista Geral

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 154,9 MW médios no rio Aripuanã

UF: MT

META: 261 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 30/01/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 748,8 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 12 milhões

EMPREENDEDOR: Energética Água das Pedras S.A.

(CHESF 24,5%, ELETRONORTE 24,5% e NEOENERGIA 51%)

RESULTADOS

- Obras em andamento com 90% realizados, sendo 10% em 2010
- Emitida a Licença de Operação pela SEMA/MT em 10/05/2010
- Em andamento o comissionamento das Unidades Geradoras UG-01 e UG-02

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras em andamento com 92% previstos, sendo 12% em 2010

PROVIDÊNCIA

- Concluir o empreendimento até 30/03/2011



UHE SIMPLÍCIO



Vista Geral

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 191,3 MW médios no rio Paraíba do Sul

UF: MG/RJ

META: 334 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 30/08/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 2 bilhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 187,3 milhões

EMPREENDEDOR: FURNAS

RESULTADOS

- Obras em andamento com 74,5% realizados, sendo 2,5% em 2010
- Em andamento a concretagem das estruturas principais e montagem eletromecânica das turbinas e geradores

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras em andamento com 75% previstos, sendo 3% em 2010

PROVIDÊNCIA

- Executar 78% até 30/04/2011



UTN ANGRA III



Vista geral

DESCRIÇÃO: Construção de Usina Termonuclear com 1.124 MW médios

UF: RJ

META: 1.405 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2015

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 977,3 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 9 bilhões

EMPREENDEDOR: Eletrobrás Termonuclear S.A.

RESULTADOS

- Obras em andamento com 6,4% realizados, sendo 3,9% em 2010
- Concluída a concretagem da laje de fundação do edifício do reator

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obras em andamento com 8% previstos, sendo 4,2% em 2010

PROVIDÊNCIA

- Realizar 10% até 30/04/2011



UHE PAI QUERÊ



Foto do local da usina

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 186,6 MW médios no rio Pelotas. Usina não considerada no PMO

UF: SC/RS

META: 292 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 20/12/2014

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 968,9 milhões

EMPREENDEDOR: Consórcio Empresarial Pai Querê (VOTORANTIM 80,1%, ALCOA 15,4%, DME 4,5%)

RESULTADOS

- Ibama emitiu, em 21/10/2010, novo parecer do check-list solicitando adequações ao EIA/RIMA
- Empreendedor encaminhou a adequação do EIA/RIMA ao Ibama em 19/11/2010

RESTRIÇÃO

- Necessidade de aprovação dos estudos ambientais

PROVIDÊNCIAS

- Ibama realizar audiências públicas até 28/02/2011
- Ibama emitir LP até 31/03/2011



UHE BAIXO IGUAÇU



Localização do eixo da barragem

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 172 MW médios no rio Iguaçu

UF: PR

META: 350 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 1,6 bilhão

EMPREENDEDOR: NEOENERGIA (NEOENERGIA 90% e DESENVIX 10%)



RESULTADOS

- Empreendedor protocolou os estudos complementares ao EIA/RIMA no ICMBio em 16/7/2010 e no IAP em 19/7/2010
- Instituído um Grupo de Trabalho pelo ICMBio em 06/10/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Grupo de trabalho do ICMBio analisar o EIA e as complementações até 20/12/2010

RESTRIÇÃO

- Em recurso interposto pelo ICMBio, foi suspensa a liminar concedida no mandado de segurança impetrado pelo responsável pelos estudos, o que manteve a anuência prévia daquele órgão, interrompendo o processo de licenciamento

PROVIDÊNCIA


- ICMBio apresentar posicionamento decorrente do resultado do GT até 15/01/2010

GERAÇÃO DE ENERGIA


Evolução das Ações Significativas

Previstas

UHE Ribeiro Gonçalves



UHE Telêmaco Borba



UHE RIBEIRO GONÇALVES



DESCRIÇÃO: Aproveitamento hidrelétrico no rio Parnaíba

UF: PI/MA

META: 113 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 14/12/2014

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 397,9 milhões

EMPREENDEDORES (responsáveis pelos estudos): CHESF, Queiroz Galvão e CNEC Engenharia

RESULTADOS

- Ibama realizou vistorias de 16 a 20/08/2010
- Em 31/08/2010, empreendedor protocolou no Ibama as complementações solicitadas
- ANEEL aprovou a inclusão da usina no segundo leilão de energia A-5 de 2010 em 16/11/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Emissão da LP pelo Ibama até 15/12/2010
- Aprovação do EVTE pela ANEEL até 16/12/2010
- Participação no Leilão A-5 de 17/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- Obter a outorga até 16/03/2011
- Celebrar contrato de concessão até 16/03/2011



UHE TELÊMACO BORBA



DESCRIÇÃO: Aproveitamento hidrelétrico no rio Tibagi

UF: PR

META: 120 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2015

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 276 milhões

EMPREENDEDOR (responsável pelos estudos): Promon Engenharia

RESULTADO

- EPE entregou a revisão dos estudos de inventário na ANEEL em 29/07/2010

RESTRIÇÃO

- Aprovação do inventário e AAI do rio Tibagi para posterior revisão dos estudos da usina

PROVIDÊNCIA

- ANEEL aprovar o estudo de inventário até 28/02/2011



GERAÇÃO DE ENERGIA

Evolução das ações significativas

Inventário e Viabilidade

Bacia do rio Tapajós – inventário




Teles Pires – viabilidade



Bacia do rio Juruena – inventário



Tabajara – viabilidade



BACIA DO RIO TAPAJÓS Inventário



Vista de corredeira nas imediações do eixos JMX-166 no rio Jamaxim

DESCRIÇÃO: Inventário da Bacia do rio Tapajós a jusante dos formadores Teles Pires e Juruena 127.350 km²

UF: AM/PA

META: 11.000 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 22/05/2009

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 13,2 milhões


RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS: ELETRONORTE 41,8%, e Camargo Corrêa Construções e Comércio S/A 58,2%

RESULTADO

- ANEEL concluiu a análise dos estudos de inventário em 22/05/2009



TELES PIRES Estudo de Viabilidade

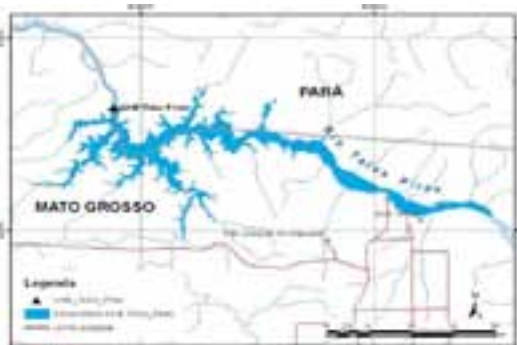

Eixo em estudos

DESCRIÇÃO: Estudos de viabilidade de um aproveitamento resultante do inventário da Bacia do rio Teles Pires

UF: MT

META: 1.820 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 14/05/2010

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 31,1 milhões

RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS: EPE

RESULTADOS

- ANEEL emitiu o aceite do EVTE em 19/10/2009
- EPE protocolou o EIA/RIMA no Ibama em 14/05/2010



BACIA DO RIO JURUENA Inventário



Área de estudos

DESCRIÇÃO: Estudos de reinventário sendo realizados em uma área de 190.940 km²

UF: AM/MT

META: 5.000 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 31/05/2010

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 15,3 milhões

RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS: EPE

RESULTADO

- Protocolado na ANEEL no dia 31/05/2010



TABAJARA Estudo de Viabilidade



DESCRIÇÃO: Estudos de viabilidade de um aproveitamento resultante do reinventário da Bacia do rio Ji-Paraná

UF: RO

META: 350 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1 milhão

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 0,4 milhão

RESPONSÁVEIS PELOS ESTUDOS: ELETRONORTE e Queiroz Galvão

RESULTADOS

- Em 26/09/2010, ICMBio encaminhou Nota Técnica referente ao levantamento socioeconômico das novas áreas incluídas no PARNA Campos Amazônicos à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
- Realizada reunião entre comunidade da Estrada do Estanho, Terra Legal, ICMBio e Governo do Estado do Amazonas, em 27/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- PL de redefinição dos limites do PARNA Campos Amazônicos encaminhado pelo ICMBio ao MMA até 30/12/2010

RESTRIÇÃO


- Impacto do empreendimento no PARNA Campos Amazônicos

PROVIDÊNCIA

- Encaminhamento do PL ao Congresso Nacional até 28/01/2010




TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA




RESULTADOS 2007 A 2010

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Grandes Interligações

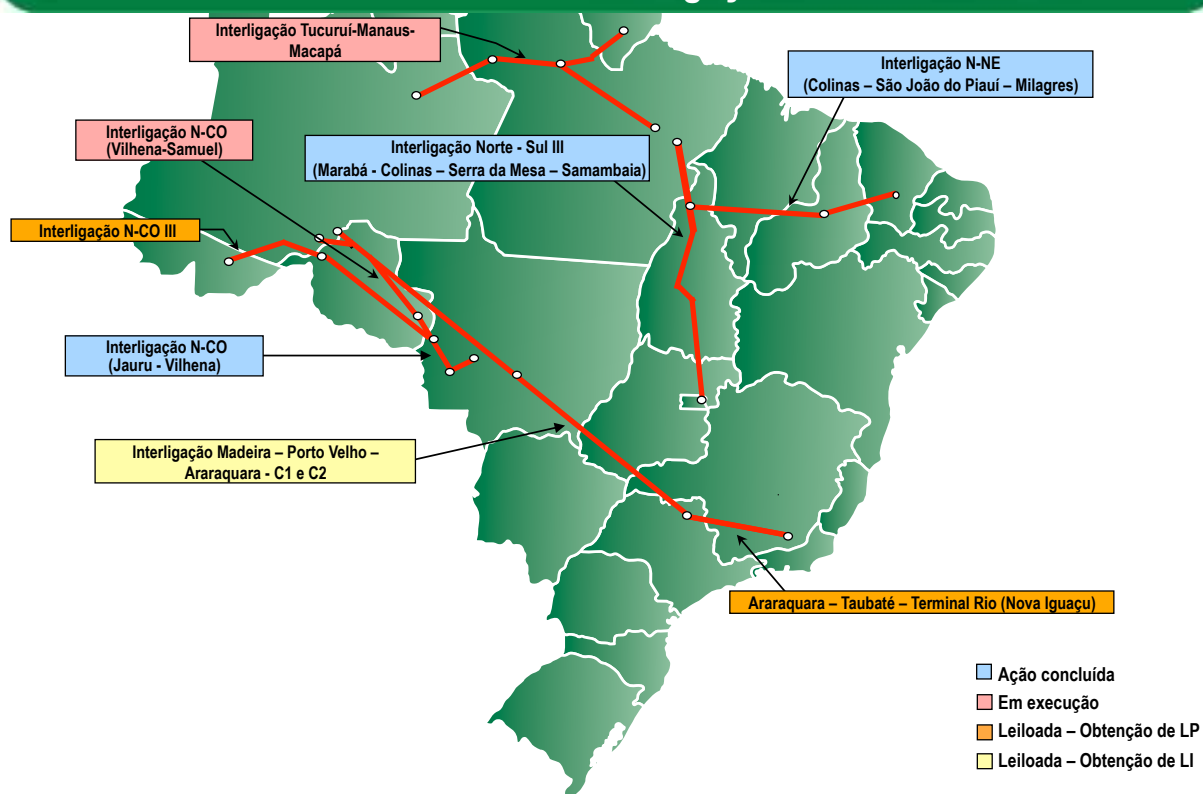

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Linhas de Transmissão

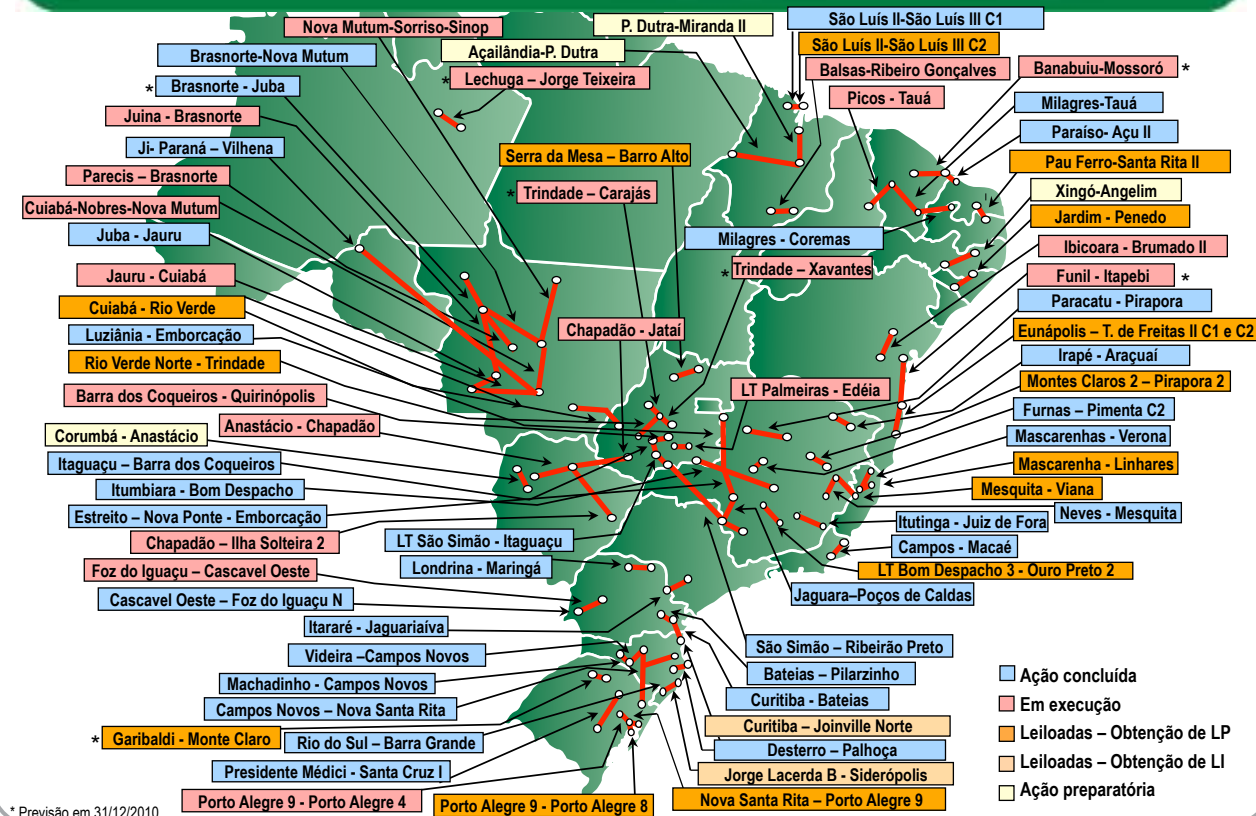

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Principais Resultados 2007 a 2010

Concluídas* – 40 LTs – 9.139 km – 7 SE – 2.700 MVA – R\$ 7 bilhões

Destaque

- Interligação N-S III – 1.674 km – R\$ 1,3 bilhão
- Interligação N-NE (Colinas-S. João do Piauí-Milagres) – 1.120 km – R\$ 756,8 milhões
- Interligação N-CO (Jauru-Vilhena) – 708 km – R\$ 239,2 milhões
- LT Jaraguá-Poços de Caldas – 308 km – R\$ 386,2 milhões
- LT Brasnorte-Nova Mutum – 273 km – R\$ 125,5 milhões
- LT Desterro-Palhoça – 130 km – R\$ 178 milhões

Obras em andamento* – 24 LTs – 5.491 km – 14 SEs – 9.633 MVA – R\$ 7 bilhões

Destaque

- Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus – 1.826 km – R\$ 3,3 bilhões*
- Interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara – SE Coletora Porto Velho e SE Araraquara II – 4.550 MVA – R\$ 738 milhões
- LT Anastácio-Chapadão – 444 km – R\$ 217 milhões
- LT Jauru-Cuiabá – 335 km – R\$ 222 milhões
- LT Juína-Brasnorte – 246 km – R\$ 164,4 milhões

Realizados* 10 Leilões de LTs – 17.779 km – R\$ 19,7 bilhões e deságio médio de 34%

| Leilões - Transmissão | Km | Investimento | Deságio |
|-----------------------|-------|---------------|---------|
| Leilão 2007 | 1.930 | 1,05 bilhão | 54% |
| Leilão jun/2008 | 3.030 | 4.87 bilhões | 20% |
| Leilão out/2008 | 275 | 589 milhões | 46% |
| Leilão 24/nov/2008 | 930 | 969 milhões | 47% |
| Leilão 26/nov/2008 | 5.756 | 7,2 bilhões | 7% |
| Leilão mai/2009 | 2.414 | 1,9 bilhão | 20% |
| Leilão nov/2009 | 1.079 | 1,3 bilhão | 28,4% |
| Leilão jun/2010 | 806 | 699 milhões | 31,5% |
| Leilão set/2010 | 486 | 347,3 milhões | 50,9% |
| Leilão 09/12/2010 * | 1.073 | 767 milhões | |

* Previsão em 31/12/2010

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Evolução das Ações Significativas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interligação N-S III (Marabá-Colinas-Serra da Mesa-Samambaia) |  | → |  |
| LT Desterro-Palhoça |  | → |  |
| Interligação N-CO (Jauru-Vilhena) |  | → |  |
| Interligação N-NE (Colinas-S. J. do Piauí - Milagres) |  | → |  |
| Interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara |  | → |  |
| Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus | | | |
| Trecho Jurupari-Oriximiná e Jurupari-Macapá |  | → |  |
| Trecho Tucuruí-Jurupari |  | → |  |
| Trecho Oriximiná-Cariri (Manaus) |  | → |  |
| Interligação N-CO (Vilhena-Samuel) |  | → |  |

INTERLIGAÇÃO N-S III

Colinas-Serra da Mesa



Colinas - Serra da Mesa

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Colinas / Miracema / Gurupi e da LT 500 kV Peixe 2 / Serra da Mesa II

UF: TO/GO

META: 695 km

DATA DE CONCLUSÃO: 04/06/2008

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 458,2 milhões

EMPREENDEDOR: INTEGRAÇÃO S.A. (ELETRONORTE 37%; CHESF 12%; ENGEVIX 3%; FIA ENERGIA 48%)

RESULTADO

➤ Entrada em operação em 23/05/2008



INTERLIGAÇÃO N-S III Marabá-Colinas



Marabá - Colinas

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Marabá/Itacaiúnas/Colinas e da LT 230 kV Itacaiúnas/Carajás

UF: PA/TO

META: 604 km

DATA DE CONCLUSÃO: 21/05/2008

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 263 milhões

EMPREENDEDOR: ABENGOA TRANSMISSORA DE ENERGIA III (ABENGOA 100%)

RESULTADO

- Entrada em operação em 23/05/2008



INTERLIGAÇÃO N-S III Serra da Mesa-Samambaia



Serra da Mesa - Samambaia

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Serra da Mesa II / Luziânia / Samambaia

UF: GO/DF

META: 375 km

DATA DE CONCLUSÃO: 28/05/2008

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 530 milhões

EMPREENDEDOR: SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA (COBRA 33,3%; ISOLUX 33,3%; ELEC NOR 33,3%)

RESULTADO

- Entrada em operação em 23/05/2008



LT DESTERRO - PALHOÇA



Pórtico Insular

DESCRIÇÃO: Construção da LT 230 kV Biguaçu / Palhoça C1 e C2 e da LT 230 kV Desterro / Palhoça, seccionamentos em 230 kV e 138 kV

UF: SC

META: 130 km

DATA DE CONCLUSÃO: 29/12/2008

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 178 milhões

EMPREENDEDOR: ELETROSUL (ELETROSUL 100%)

RESULTADO

- Entrada em operação em 29/12/2008



INTERLIGAÇÃO N-CO Jauru-Vilhena



Trecho de Linha (torres estaiadas)

DESCRIÇÃO: Construção da LT 230 kV Jauru-Vilhena CD

UF: RO/MT

META: 708 km

DATA DE CONCLUSÃO: 02/10/2009

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 239,2 milhões

EMPREENDEDOR: Jauru Transmissora (ELEC NOR 100%)

RESULTADO

- Entrada em operação em 06/10/2009



INTERLIGAÇÃO N-NE Colinas-S. J. do Piauí



LT Colinas - Ribeiro Gonçalves

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Colinas-São João do Piauí

UF: PI/MA/TO

META: 720 km

DATA DE CONCLUSÃO: 22/11/2010

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 533,6 milhões

EMPREENDEDOR: Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A (ISA 100%)

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Entrada em operação em 08/12/2010



INTERLIGAÇÃO N-NE S. J. do Piauí-Milagres



LT São João do Piauí - Milagres

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV São João do Piauí / Milagres

UF: PI/CE

META: 400 km

DATA DE CONCLUSÃO: 20/11/2010

INVESTIMENTO 2007-2010: R\$ 223,3 milhões

EMPREENDEDOR: Iracema Transmissora de Energia S.A. (CYMI 100%)

RESULTADO

- Obra energizada em 07/12/2010



INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA

Circuito 1



Interligação Porto Velho - Araraquara - Circuito 1

DESCRIÇÃO: Construção das conversoras CA-CC e CC- CA (1ª etapa) e da LT 600 kV SE Coletora Porto Velho - Araraquara II C.1.

UF: RO/MT/GO/SP/MG

META: 2.375 km

DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2012

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 3,3 bilhões

EMPREENDEDOR: Interligação Elétrica do Madeira S.A.
(CHESF 24,5%; FURNAS 24,5%; CTEEP 51%)

RESULTADOS

- Realizadas as audiências públicas no período de 18 a 22/09/2010
- LP emitida pelo Ibama em 29/11/2010
- Lis das Subestações emitidas pelo Ibama em 29/11/2010

PROVIDÊNCIA

- Empreendedor protocolar o PBA até 31/12/2010



INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA

Circuito 2



Interligação Porto Velho - Araraquara - Circuito 2

DESCRIÇÃO: Construção das conversoras CA-CC e CC- CA (2ª etapa) e da LT 600 kV SE Coletora Porto Velho - Araraquara II C.2.

UF: RO/MT/GO/SP/MG

META: 2.375 km

DATA DE CONCLUSÃO: 28/04/2013

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 2,7 bilhões

EMPREENDEDOR: Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
(ELETROSUL 24,5%; ELETRONORTE 24,5%; Construtora Andrade Gutierrez S/A 25,5%; ABENGOA 25,5%)

RESULTADOS

- Realizadas as audiências públicas no período de 18 a 22/09/2010
- LP emitida pelo Ibama em 07/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Empreendedor protocolar o PBA até 31/12/2010



INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA LT Cuiabá-Ribeirãozinho-Rio Verde



DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Cuiabá – Ribeirãozinho – Rio Verde

UF: MT/GO

META: 606 km

DATA DE CONCLUSÃO: 26/04/2012

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 374 milhões

EMPREENDEDOR: Catxerê Transmissora de Energia S.A.
(CYMI 100%)

RESULTADO

- LP emitida pelo Ibama em 19/11/2010

PROVIDÊNCIAS

- Empreendedor protocolar PBA até 20/12/2010
- Ibama emitir a LI e ASV até 31/01/2011



INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA SE Araraquara II 500/440 kV



SE Araraquara II

DESCRIÇÃO: Construção da SE Araraquara e da LT 500 kV Araraquara / Araraquara(Furnas) e da LT 440 kV Araraquara / Araraquara(CTEEP)

UF: SP

META: 3.750 MVA

DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2012

INVESTIMENTO PREVISTO ATÉ 2010: R\$ 71,4 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 166,5 milhões

EMPREENDEDOR: Araraquara Transmissora de Energia S.A.
(CYMI 100%)

RESULTADOS

- Obra em andamento com 30% de realização
- Terraplenagem com 95% realizados

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Realizar 35% da obra até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Realizar 40% da obra até 30/04/2011



INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA SE Coletora Porto Velho



Subestação Coletora

DESCRIÇÃO: Construção da LT 230 kV Coletora Porto Velho – Porto Velho e 2 estações conversoras CA-CC-CA 500/230 kV

UF: RO

META: 800 MW

DATA DE CONCLUSÃO: 26/02/2012

INVESTIMENTO PREVISTO ATÉ 2010: R\$ 280 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 220 milhões

EMPREENDEDOR: Porto Velho Transmissora de Energia (ELETROSUL 24,5%; ELETRONORTE 24,5%; ABENGOA 25,5%; Construtora Andrade Gutierrez S/A 25,5%)

RESULTADOS

- Obra em andamento com 30% de realização
- Terraplenagem concluída em 12/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Realizar 35% da obra até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Realizar 38% da obra até 30/04/2011



INTERLIGAÇÃO TUCURUÍ-MACAPÁ-MANAUS Jurupari-Oriximiná e Jurupari-Macapá



Jurupari-Oriximiná Jurupari-Macapá

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Jurupari /Oriximiná e da LT 230 kV Jurupari/Macapá

UF: AP/ PA

META: 713 km

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012

INVESTIMENTO PREVISTO ATÉ 2010: R\$ 2 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 997,6 milhões

EMPREENDEDOR: Isolux Energia e Participação Ltda (ISOLUX 100,00%)

RESULTADOS

- Emitida a LI pelo Ibama em 22/10/2010
- Obra em andamento com 1% de realização
- Emitida a autorização para coleta e captura de fauna em 30/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Realizar 2% da obra até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Realizar 5% da obra até 30/04/2011



INTERLIGAÇÃO TUCURUÍ-MACAPÁ-MANAUS

Tucuruí-Jurupari



Tucuruí - Jurupari

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Tucuruí/Xingu/Jurupari e subestações associadas.

UF: PA META: 527 km

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012

INVESTIMENTO PREVISTO TOTAL: R\$ 1,2 bilhão

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 1,2 bilhão

EMPREENDEDOR: Isolux Energia e Participação Ltda (ISOLUX 100,00%)

RESULTADOS

- LP emitida pelo Ibama em 08/09/2010
- Protocolados no Ibama o atendimento de condicionantes da LP, o PBA e o Inventário Florestal em 14/10/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Emissão da LI em 22/12/2010

RESTRIÇÃO

- O atraso na emissão da LI pode postergar a entrada em operação da Interligação

PROVIDÊNCIA

- Realizar 3% da obra até 30/04/2011



INTERLIGAÇÃO TUCURUÍ-MACAPÁ-MANAUS

Oriximiná-Cariri (Manaus)



Oriximiná - Cariri

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Oriximiná/Cariri (Manaus).

UF: PA/AM META: 586 km

DATA DE CONCLUSÃO: 30/04/2012

INVESTIMENTO PREVISTO ATÉ 2010: R\$ 2 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 1,2 bilhão

EMPREENDEDOR: Manaus Transmissora de Energia S.A. (ELETRONORTE 30,00%; ABENGOA 30,00%; CHESF 19,50%; FIPBE 20,50%)

RESULTADOS

- Emitida a LP pelo Ibama em 10/08/2010
- Emitida a LI pelo Ibama em 04/11/2010
- Emitidas a ASV das SEs em 18/11/2010 e da Linha em 19/11/2010
- Emissão da autorização de coleta de fauna em 23/11/2010

PROVIDÊNCIA

- Realizar 10% da obra até 30/04/2011



INTERLIGAÇÃO N-CO Vilhena-Samuel



Subestação Vilhena

DESCRIÇÃO: Construção da LT 230 kV Vilhena / Ji-Paraná / Pimenta Bueno / Ariquemes / Samuel

UF: RO

META: 595 km

DATA DE CONCLUSÃO: 31/03/2012

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 201 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO ATÉ 2010: R\$ 38,2 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R\$ 163 milhões

EMPREENDEDOR: Jauru Transmissora (ELEC NOR 100%)

RESULTADO

- Obra em andamento com 19% realizados

RESTRIÇÃO

- A obra está paralisada em função do processo de reequilíbrio econômico-financeiro


PROVIDÊNCIA

- Empreendedor retomar a obra e realizar 25% até 30/04/2011




Usina Hidrelétrica Jirau • RO

PETRÓLEO E GÁS NATURAL



RESULTADOS 2007 A 2010

DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

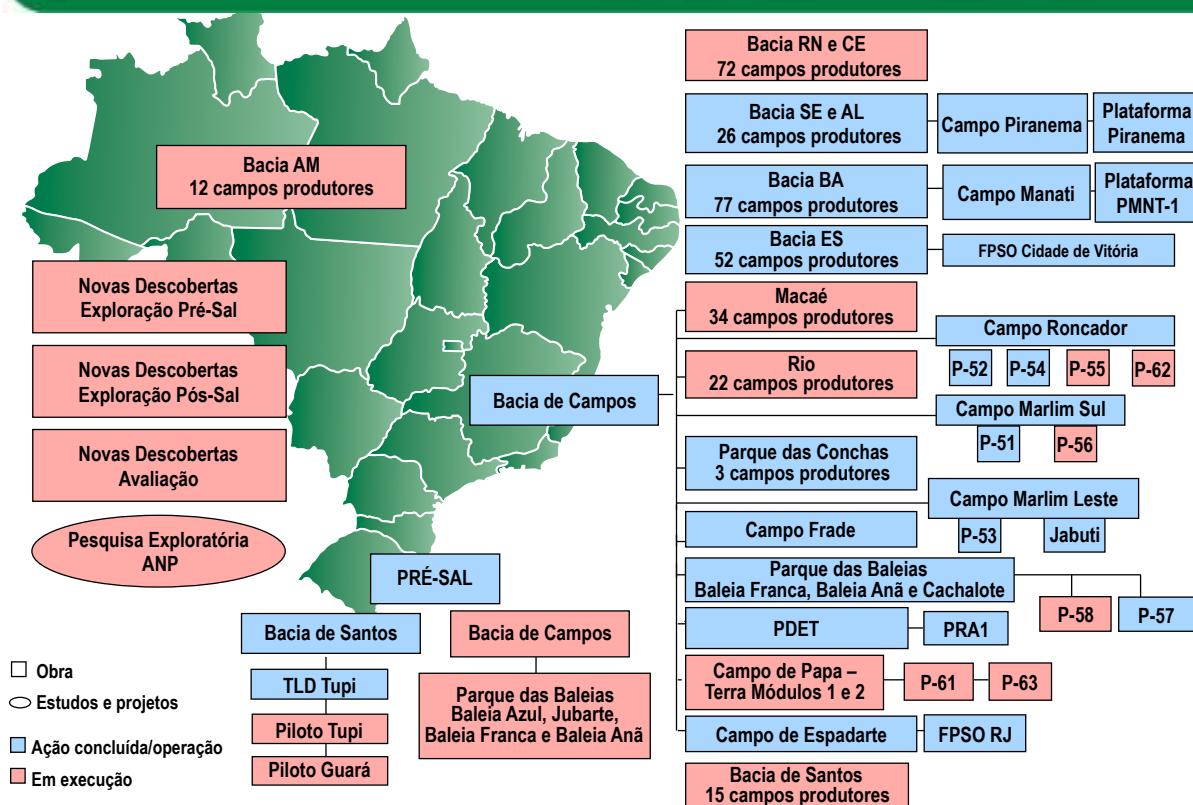

EXPLORAÇÃO

Principais Resultados – 2007 a 2010

Exploração – Aumento de Reservas

PRÉ-SAL

- Principais Descobertas – totalizando 22 a 33,5 bilhões de boe
 - Nov/2007 – Tupi – reserva de gás e óleo prevista em 5 a 8 bilhões de boe
 - Dez/2007 – Caramba – descoberta de óleo leve a 280 km da costa
 - Jan/2008 – Júpiter – importante jazida de gás e condensado
 - Mar/2008 – Carioca – relevante descoberta de óleo leve e gás
 - Mai/2008 – Bem-te-vi – acumulação de óleo e gás – 25 a 28 API – águas ultraprofundas
 - Jun/2008 – Guará – reserva de óleo e gás, próximo a Carioca
 - Set/2008 – Iara – reservas da ordem de 3 a 4 bilhões de barris, próximo a Tupi
 - Nov/2008 – Parque das Baleias – reservas de 1,5 a 2 bilhões de barris
 - Jan/2009 – Azulão – primeira operadora privada a encontrar óleo no Pré-Sal da Bacia de Santos
 - Abr/2009 – Corcovado-1 – águas profundas da Bacia de Santos
 - Abr/2009 – Iguaçu – descoberta de óleo leve na mesma área de avaliação de Carioca e Guará
 - Jun/2009 – Iracema – novo poço confirma potencial de petróleo leve em Tupi
 - Mar/2010 – Franco – poço da ANP, em área da União, não concedida, próximo ao prospecto de Iara, na Bacia de Santos
 - Abr/2010 – Tupi OW – novo poço confirma potencial de óleo leve em Tupi, na Bacia de Santos
 - Mai/2010 – Duas novas acumulações de óleo leve no Campo de Caratinga, Bacia de Campos
 - Jun/2010 – Nova acumulação de óleo leve no Campo de Marlim, Bacia de Campos
 - Jun/2010 – Perfurado novo poço e encontrado óleo leve na área de Tupi, conhecido como Tupi Alto
 - Out/2010 – Confirmado potencial de óleo leve em perfuração de novo poço em Tupi, denominado Iracema Norte
 - Out/2010 – Confirmado, após perfuração do novo poço em Tupi, óleo leve e gás natural recuperável estimado de 5 a 8 milhões de barris
 - Out/2010 – Anunciada a descoberta de óleo na área de Libra, com potencial para ser o maior reservatório já descoberto no Brasil
- Concluído Teste de Longa Duração (TLD) da área de Tupi – Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, em 27/08/2010 – Produção atual de 14,7 mil bpd de óleo

EXPLORAÇÃO

Principais Resultados – 2007 a 2010

Exploração – Aumento de Reservas

PÓS-SAL

- Principais Descobertas
 - Mai/2008 – Tiro e Sidon – descoberta de acumulação de óleo leve na Bacia de Santos
 - Jan/2009 – Pialamba – descoberta de acumulação de gás em águas rasas ao sul da Bacia de Santos
 - Abr/2009 – Declarada a comercialidade da área de Pialamba, Campo Piracucá – águas rasas da Bacia de Santos – BM-S-7
 - Mai/2009 – Panoramix – descoberta de gás condensado – águas rasas da Bacia de Santos – bloco BM-S-8
 - Ago/2009 – Nova descoberta de óleo leve em Aruanã – reservatórios carbonáticos em lâmina d'água de 976 metros na Bacia de Campos – bloco BM-C-36
 - Fev/2010 – Descoberta de acumulação de óleo leve em águas rasas na Bacia de Campos – áreas adjacentes ao Campo de Pampo
 - Mar/2010 – Bacia de Sergipe – Descoberta de nova acumulação de óleo leve em Piranema, estimada em 15 milhões de barris
 - Fev/2010 – Descoberta de duas novas acumulações de óleo leve em águas profundas na Bacia de Campos – na área de concessão de Barracuda
 - Mai/2010 – Descoberta de duas novas acumulações de óleo leve em águas profundas na Bacia de Campos – no poço Carimbé, localizado no Campo de Caratinga
 - Out/2010 – Perfuração do primeiro poço em águas ultraprofundas da Bacia de Sergipe-Alagoas identificou a presença de petróleo médio a leve abrindo uma nova fronteira exploratória
 - Nov/2010 – Comprovada a presença de óleo leve em poço situado ao sul da Bacia de Santos

Exploração – Perfuração de Poços Exploratórios

PRÉ E PÓS-SAL

- 629 poços exploratórios perfurados até out/10 *
 - Terra – 378 poços
 - Mar – 251 poços, dos quais 76 atingiram a zona do Pré-Sal

* Fonte: ANP/2010

PRODUÇÃO

Principais Resultados – 2007 a 2010

Aumento da Produção

- Entrada em operação de 12 novas plataformas – PRA 1, P-51, P-52, P-53, P-54, P-57, FPSO-RJ, Manati, Piranema, FPSO Cidade de Niterói, FPSO Frade e FPSO Espírito Santo
- Início da Produção no Pré-Sal, por meio do FPSO JK (P-34), no Campo de Jubarte na Bacia de Campos no Espírito Santo, em set/2008
- Início da conversão da P-63, a ser instalada no campo de Papa-Terra, em mar/2010
- Início da conversão do FPSO para o Piloto de Guará em abr/2010
- Entrada em operação do FPSO Cidade de Santos no Campo de Uruguá Tambaú em jul/2010
- Iniciada produção do FPSO Capixaba no Campo de Cachalote em mai/2010
- Iniciada a produção, através do FPSO Capixaba, do primeiro óleo da camada Pré-sal do Campo de Baleia Franca, localizado no complexo denominado Parque das Baleias, em jul/2010
- Início da produção no sistema definitivo instalado na área de Tupi, no Pré-sal da Bacia de Santos, em out/2010
- Recorde da produção atingida, com 2.165 mil barris por dia, em ago/2010
- Produção de óleo (óleo + líquido de gás natural):

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 * |
|-------|-------|-------|--------|
| 1.854 | 1.903 | 2.024 | 2.119 |

Em mil barris

Licitações


- Realizadas duas Rodadas de Licitações de Blocos (9ª e 10ª Rodadas)
 - 2007 – 117 blocos arrematados por 36 empresas – bônus arrecadado – R\$ 2,1 bilhões em Assinatura e R\$ 1,4 bilhão em Programa Exploratório
 - 2008 – 54 blocos arrematados por 17 empresas – bônus arrecadado – R\$ 89,9 milhões em Assinatura e R\$ 611 milhões em Programa Exploratório

* Fonte: ANP - média até outubro/2010


EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Evolução das Ações Significativas


Plataforma P-52 – Campo Roncador Módulo 1A




Campo de Piranema




Plataforma P-54 – Campo Roncador Módulo 2




Pré-Sal – Teste de Longa Duração de Tupi




Plataforma P-51 – Campo Marlim Sul Módulo 1




Plataforma P-53 – Campo Marlim Leste



Plataforma P-57 – Campo Jubarte Fase 2



Pré-Sal – Piloto de Produção do Campo de Tupi



PLATAFORMA P-52 – CAMPO RONCADOR MÓDULO 1A



P-52

DESCRIÇÃO: Projeto Módulo 1A – Fase 2 do campo de Roncador. Compreende 18 poços produtores e 11 injetores, sendo 11 remanejados do Módulo 1A – Fase 1, a construção e instalação de plataforma de produção, com capacidade de processamento de 180 mil bpd, 7,5 milhões de m³/dia de gás, e injeção de 300 mil bpd de água, além da instalação de oleoduto e de gasoduto de exportação

UF: RJ META: 180 mil bpd de óleo e 7,5 MM m³/dia de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 23/11/2007
DATA DE CONCLUSÃO: 26/05/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 3,7 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100%

RESULTADOS

- Empreendimento concluído em 26/05/2009
- Plataforma em operação desde 23/11/2007



CAMPO DE PIRANEMA



Unidade Estacionária de Produção (UEP)

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completação e interligação submarina de 3 poços produtores e 3 poços injetores (Fase 1) e de 2 poços produtores e 1 poço injetor (Fase 2), com o afretamento e instalação de um FPSO, com capacidade de processamento de 30 mil bpd

UF: SE META: 20 mil bpd de óleo
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 10/10/2007
DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 634 milhões
EMPREENDEDOR: Petrobras 100%

RESULTADOS

- Empreendimento concluído em 31/07/2009
- Plataforma em operação desde 10/10/2007



PLATAFORMA P-54 – CAMPO RONCADOR MÓDULO 2



P-54 Campo Roncador

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completção e interligação submarina de 11 poços produtores e 6 poços injetores, mais 4 poços de reserva (2 produtores e 2 injetores), com a construção e instalação de uma plataforma de produção, com capacidade de processamento de 180 mil bpd e compressão e tratamento de 6 milhões m³/dia de gás, além da instalação do gasoduto de exportação

UF: RJ META: 180 mil bpd de óleo
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 12/12/2007
DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 2,5 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras

RESULTADOS

- Empreendimento concluído em 30/09/2009
- Plataforma em operação desde 12/12/2007



PRÉ-SAL – TESTE DE LONGA DURAÇÃO DE TUPI



Navio Plataforma FPSO Cidade de São Vicente

DESCRIÇÃO: Teste das características de produtividade do reservatório de Tupi. Será produzido nove meses em um poço e seis meses em outro poço

UF: RJ META: 30 mil bpd
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 01/05/2009
DATA DE CONCLUSÃO: 27/08/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 768 milhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 65%, BG 25% e Petrogal 10%

RESULTADOS

- Empreendimento concluído em 27/08/2010
- Produção atual de 14,7 mil bpd de óleo – out/2010



PLATAFORMA P-51 – CAMPO MARLIM SUL MÓDULO 1



P-51 rumo à locação

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completção e interligação submarina de 10 poços produtores e de 9 poços injetores, construção e instalação de uma plataforma de produção, com capacidade de processamento de 180 mil bpd, compressão e tratamento de 6 milhões m³/dia de gás, além da instalação de oleoduto e de gasoduto de exportação

UF: RJ META: 180 mil bpd de óleo e 6 MM m³/dia de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 24/01/2009
DATA DE CONCLUSÃO: 30/03/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 4,6 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras 100%

RESULTADOS

- Obra em andamento com 98% realizado, sendo 7% em 2010
- Primeira Plataforma construída totalmente no Brasil
- Iniciada a produção na plataforma em 24/08/2009
- Produção atual de 132,8 mil bpd de óleo e 2,3 milhões m³/dia de gás natural – out/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obra em andamento, previsto 99% de realização até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Concluir o empreendimento até 30/03/2011



PLATAFORMA P-53 – CAMPO MARLIM LESTE



Plataforma P-53

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completção e interligação submarina de 13 poços produtores e 8 poços injetores, com o afretamento e instalação de uma unidade estacionária de produção, com capacidade de processamento de 180 mil bpd e compressão e tratamento de 6 milhões m³/dia de gás, além da instalação de oleoduto e de gasoduto de exportação

UF: RJ META: 180 mil bpd de óleo e 6 MM m³/dia de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 30/11/2008
DATA DE CONCLUSÃO: 30/04/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 4,3 bilhões
INVESTIMENTO PÓS 2010: R\$ 470 milhões
EMPREENDEDOR: Petrobras 100%

RESULTADOS

- Obra em andamento com 91% realizados, sendo 8% em 2010
- Iniciada a produção na Plataforma em 30/11/2008
- Produção atual de 85,1 mil bpd de óleo e 1,2 milhão m³/dia de gás natural – out/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obra em andamento, previsto 93% de realização até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Concluir o empreendimento até 30/04/2012



PLATAFORMA P-57 – CAMPO JUBARTE FASE 2



Plataforma P-57

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completção e interligação submarina de 15 poços produtores e 7 injetores, com a construção e instalação de um FPSO, com capacidade de processamento de 180 mil bpd e compressão de 2 milhões m³/dia de gás, além da instalação do gasoduto necessário para exportação

UF: ES META: 180 mil bpd de óleo
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 05/12/2010
DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 3,6 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 1,9 bilhão
EMPREENDEDOR: Petrobras 100%

RESULTADOS

- Obra em andamento com 55% realizados, sendo 12% em 2010
- Emissão da LI pelo IBAMA em 25/06/2010
- Realizada cerimônia de batismo da P-57 em 07/10/2010
- Chegada da Plataforma na locação – Campo Jubarte em 27/10/2010
- Emissão da LO pelo IBAMA em 29/11/2010
- Iniciada produção da plataforma em 05/12/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obra em andamento, previsto 66% de realização até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Concluir o empreendimento até 31/07/2013



PRÉ-SAL – PILOTO DE PRODUÇÃO DE TUPI



Navio Plataforma FPSO Cidade de Angra

DESCRIÇÃO: Perfuração, completção e interligação de poços para o sistema piloto de produção de Tupi, com capacidade de processamento de 100 mil bpd, 5 poços produtores, 2 poços injetores (gás e água) e 1 poço de injeção de água

UF: RJ META: 100 mil bpd
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 31/01/2011
DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 3 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 5,3 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 65%, BG 25% e Petrogal 10%

RESULTADOS

- Obra em andamento com 11% realizado, sendo 7% em 2010
- Chegada do FPSO na locação em 23/09/2010
- Emitida a LO em 22/10/2010
- Iniciada produção no sistema definitivo de Tupi em 28/10/2010
- Produção atual de 1,2 mil bpd de óleo – out/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Obra em andamento, previsto 35% de realização até 31/12/2010
- Apresentar declaração de comercialidade do campo até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Iniciar a operação do Piloto até 31/01/2011




REFINO, PETROQUÍMICA E HBIO



RESULTADOS 2007 A 2010

REFINO, PETROQUÍMICA E HBIO

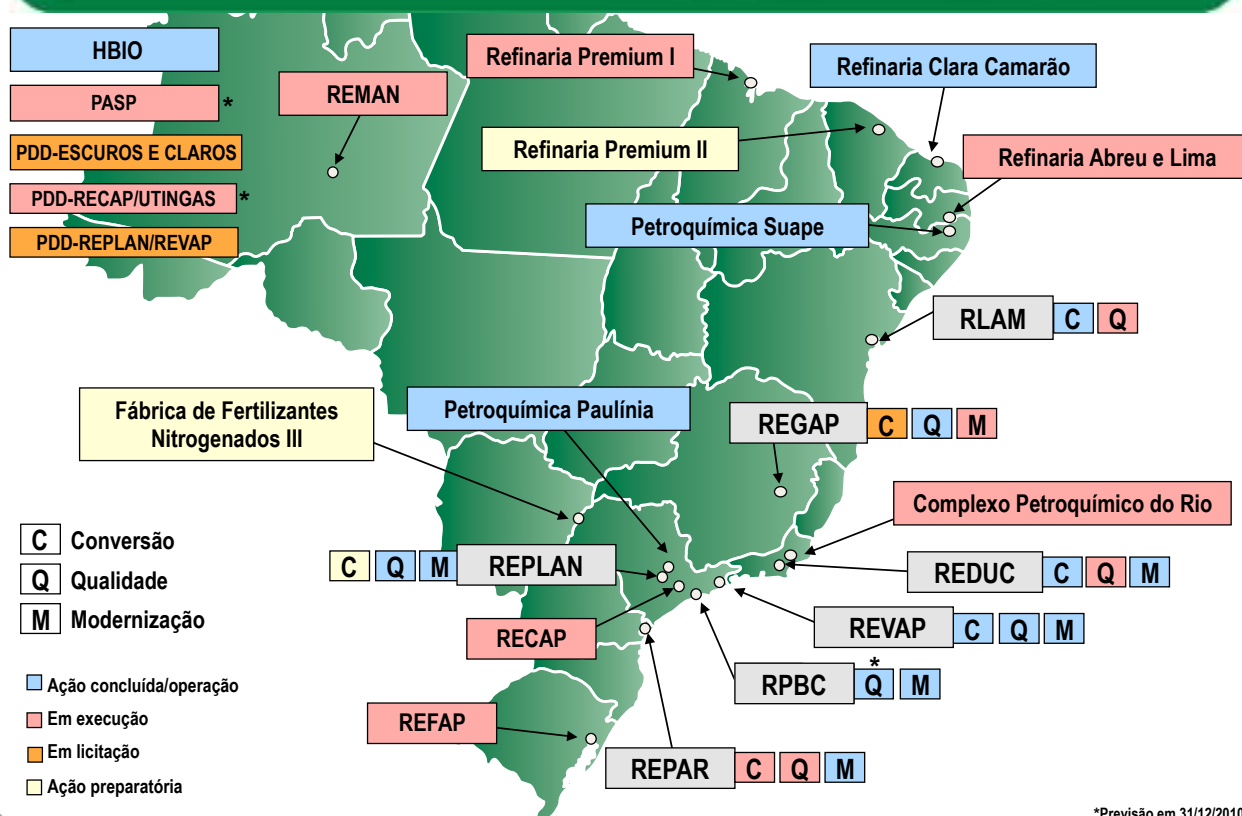

*Previsão em 31/12/2010

REFINO E PETROQUÍMICA

Principais Resultados – 2007 a 2010

Novas Refinarias e Petroquímicas

- Refinaria Abreu e Lima – 34% realizados e terraplanagem a concluir até 31/12/2010
- Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ – 19% realizados e terraplanagem a concluir até 31/12/2010
- Refinaria Premium I – MA – Iniciadas as obras de terraplanagem em 23/09/2010
- Refinaria Premium II – CE – Assinados os contratos para fornecimento de projeto básico e pré-detalhamento em 05/11/2010 e o 2º contrato de sondagem em 16/11/2010
- Refinaria Potiguar Clara Camarão – Entrada em Operação (formulação de gasolina) em 16/09/2010
- Petroquímica Paulínia (PTA) – Concluídas as obras e iniciada a operação em 25/04/2008
- Petroquímica Suape – Iniciada operação da unidade de fios de poliéster (POY) em 27/08/2010

Refino – Modernização e Ampliação

- Em andamento obras de adequação de 10 refinarias – REGAP, REFAP, RLAM, REDUC, REPAR, REVAP, REPLAN, RBPC, RECAP e REMAN – para produzir combustíveis menos poluentes, elevar a capacidade de refino de petróleo pesado e melhorar o desempenho operacional

Refino – Modernização e Ampliação: Empreendimentos em Operação

- REDUC – Conversão – unidade de coque em jun/08
- REVAP – Modernização – jun/08
- REPAR – Modernização – unidade de propeno em mar/2009
- RLAM – Conversão – jan/2010
- REVAP – Qualidade – dez/2010
- REGAP – Qualidade – dez/2010
- RPBC – Qualidade – dez/2010 *

*Previsão em 31/12/2010


REFINO, PETROQUÍMICA E HBIO

Evolução das Ações Significativas

Refinaria Abreu e Lima



Complexo Petroquímico do RJ – COMPERJ



REFINARIA ABREU E LIMA



Canteiro de Obras e Tubovias

DESCRIÇÃO: O Projeto consiste na construção de uma refinaria no Porto de Suape, em Pernambuco, em associação com a PDVSA, com capacidade para processamento de 230 mil barris/dia de petróleos pesados, brasileiro e venezuelano

UF: PE META: 230 mil bpd de petróleo cru
DATA DE INÍCIO OPERAÇÃO: 31/12/2012
DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2014
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 6,5 bilhões
INVESTIMENTO PÓS 2010: 20,3 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 60% e PDVSA 40%

RESULTADOS

- Obra em andamento com 28% realizado, sendo 8% em 2010
- Iniciadas as obras das Tubovias – autorização de serviço assinada em 16/04/2010
- Recebidas propostas para construção do parque de enxofre em 30/06/2010
- Iniciadas as obras das unidades de destilação atmosférica em abril/2010, hidrotreatamento em julho/2010 e craqueamento retardado em agosto/2010
- Assinado o contrato para execução de drenagens e construção de interligações elétricas em 10/09/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Obra em andamento, previsto 34% de realização até 31/12/2010
- Assinar o contrato para construção parque de enxofre até 31/12/2010
- Concluir as obras de terraplanagem até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Partida da unidade de destilação do 1º Trem até 31/12/2012



COMPERJ



Terraplanagem e Canteiro de Obras

DESCRIÇÃO: Refinaria para processar 165 mil barris por dia de petróleo pesado da Bacia de Campos, produzindo diretamente produtos petroquímicos, além de diesel, nafta e coque

UF: RJ META: 165 mil bpd de petróleo pesado
DATA DE INÍCIO DE OPERAÇÃO: 30/09/2013
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 3,4 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 15,9 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: a definir

RESULTADOS

- Obra em andamento com 16% realizado, sendo 5% em 2010
- Início das obras da unidade de destilação a vácuo em 24/08/2010
- Início das obras da unidade de hidrocraqueamento em 25/08/2010
- Assinado contrato de montagem das unidades de hidrotreatamento de diesel e querosene em 10/09/2010
- Concluído EIA/RIMA do emissário submarino em 18/11/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010


- Obra em andamento, previsto 19% de realização até 31/12/2010
- Concluir as obras de terraplanagem do complexo até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Iniciar obras civis das unidades de hidrotreatamento de diesel e querosene até 20/02/2011




REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL



RESULTADOS 2007 A 2010

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL Estaleiros, Petroleiros e Plataformas

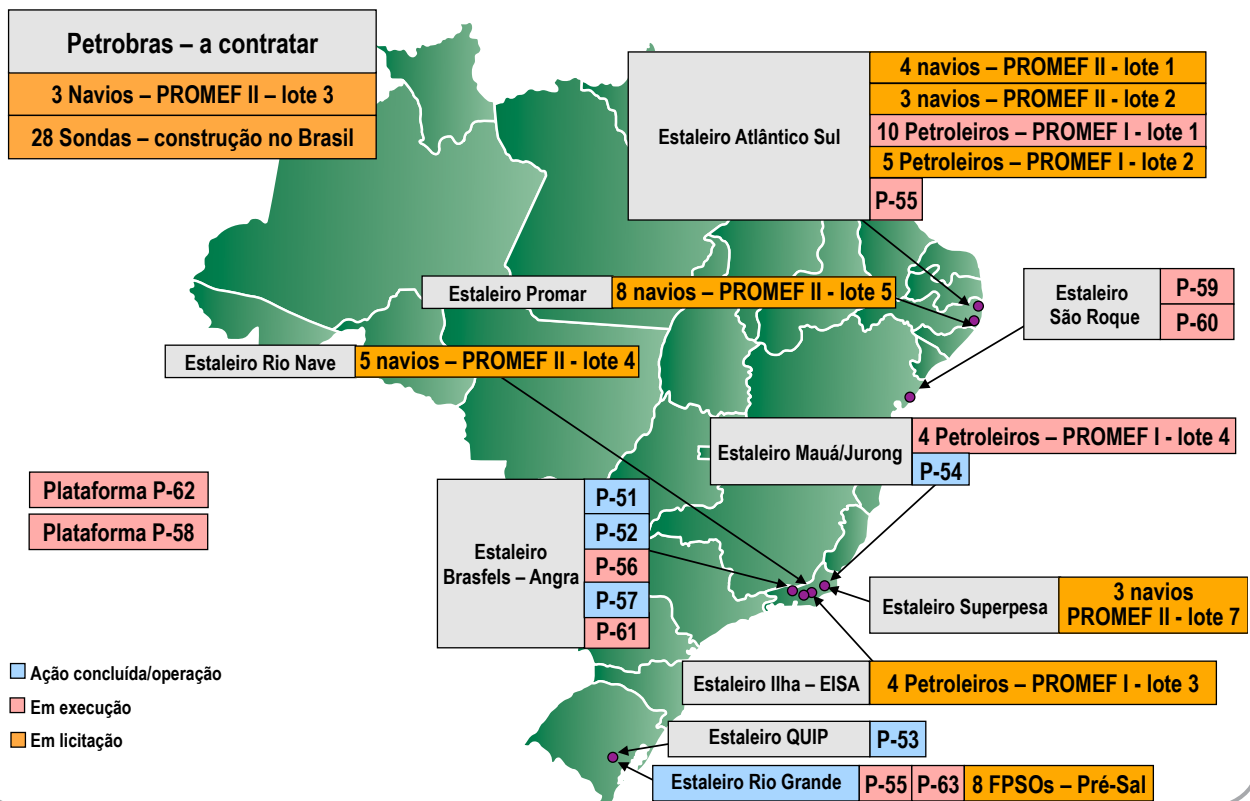

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA MARINHA MERCANTE

301 embarcações e 5 estaleiros *
107 embarcações concluídas
93 embarcações e 3 estaleiros em construção
101 embarcações e 2 estaleiros contratados



REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA Principais Resultados – 2007 a 2010

Estaleiros

- Estaleiro Rio Grande – Empreendimento concluído
- Estaleiro Atlântico Sul – 97% realizados

Petroleiros

- PROMEF I – 23 navios de grande porte:
 - Lote 1 – Estaleiro Atlântico Sul/PE – lançamento ao mar do 1º navio Suezmax, João Cândido, em 07/05/2010
 - Lote 2 – Estaleiro Atlântico Sul – entrada em eficácia em 19/05/2009
 - Lote 3 – Estaleiro Ilha – EISA/RJ – entrada em eficácia em 05/04/2010
 - Lote 4 – Estaleiro Mauá/RJ
 - Lançamento ao mar do navio Celso Furtado, 1º navio do lote – em 24/06/2010
 - Lançamento ao mar do navio Sérgio Buarque de Holanda, 2º navio do lote – em 19/11/2010
- PROMEF II – 26 navios de grande porte – 18 já contratados:
 - Lote 1 – 4 navios – Estaleiro Atlântico Sul/PE – Entrada em eficácia em 24/08/2010
 - Lote 2 – 3 navios – Estaleiro Atlântico Sul/PE – Entrada em eficácia em 24/08/2010
 - Lote 5 – 8 navios – Estaleiro Promar/CE – Entrada em eficácia prevista até 31/12/2010
 - Lote 7 – 3 navios – Estaleiro Superpesa/RJ – Entrada em eficácia em 30/11/2010

Plataformas e Sondas para o Pré-Sal

- Plataformas construídas no Brasil:
 - Em operação – PRA-1, P51, P52, P53, P54 e P57
 - Em construção – P55, P56, P58, P59, P60, P61, P62 e P63
- Assinado o contrato para construção das 8 FPSOs com a ENGENVIX em 11/11/2010
- Abertura das propostas comerciais de três licitações destinadas à contratação de até 28 sondas de perfuração marítima a serem construídas no Brasil, para atender as demandas de perfuração de poços na camada pré-sal em 25/11/2010

Programa de Expansão e Modernização da Marinha Mercante

- Lançamento ao mar do navio João Cândido, produzido pelo estaleiro Atlântico Sul, em 07/05/2010, e dos navios Celso Furtado, em 24/06/2010, e Sérgio Buarque de Holanda, em 19/11/2010, produzidos pelo Estaleiro Mauá, todos do Promef
- Superada a meta original do PAC, com a assinatura de 306 contratos de financiamento – R\$ 17 bilhões*
- 107 embarcações concluídas
 - 35 de apoio à navegação – 21 em SC, 13 em SP e 1 no RJ
 - 33 de apoio a plataformas – 16 em SC, 13 no RJ e 4 em SP
 - 35 de carga – 21 no PA, 6 no RJ, 5 no AM e 3 no RS
 - 1 de passageiros em SC
 - 3 de pesca em SC

*Previsão em 31/12/2010

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL


Evolução das Ações Significativas

Programa de Expansão e Modernização da Marinha Mercante

Estaleiro Rio Grande – Dique Seco

Ampliação da Frota de Petroleiros – Lote 1 – Suape

Ampliação da Frota de Petroleiros – Lote 4 – Niterói



REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL

Programa de Financiamento da Marinha Mercante



Navio Celso Furtado – Estaleiro Mauá/RJ

DESCRIÇÃO: Financiamento do Fundo de Marinha Mercante às empresas brasileiras para a construção de embarcações e unidades industriais para a construção naval

UF: Nacional

META: Programa contínuo

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS* 2007-2010: R\$ 17 bilhões

Superada a meta original de contratações em 60%*

| TIPO | META ORIGINAL PAC 2007-2010 | CONTRATADO 2007-2010 - R\$ bi | | % DE CONTRATAÇÃO ATÉ 30/11/2010 | % DE CONTRATAÇÃO ATÉ 31/12/2010 |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | Até 30/11/2010 | Previsto até 31/12/2010 | | |
| Embarcações | R\$ 10,6 bilhões | 14,6 | 15,2 | 153% | 160% |
| Estaleiros | | 1,6 | 1,8 | | |
| Total | | 16,2 | 17,0 | | |

Pedidos de financiamento priorizados 2007-2010 – aguardando contratação

| TIPO | R\$ bilhões | |
|-------------|--------------|-----------------------|
| | Até 30/11/10 | Previsão até 31/12/10 |
| Embarcações | 9,8 | 9,3 |
| Estaleiros | 4,5 | 4,3 |
| TOTAL | 14,3 | 13,6 |



*Previsão em 31/12/2010

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL

Programa de Financiamento da Marinha Mercante



Navio Celso Furtado - Estaleiro Mauá/RJ

DESCRIÇÃO: Financiamento do Fundo de Marinha Mercante às empresas brasileiras para a construção de embarcações e unidades industriais para a construção naval

UF: Nacional META: Programa contínuo

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS* 2007-2010: R\$ 17 bilhões

Evolução dos Contratos

| Fase | Tipo de embarcação/ Estaleiro * | Quantidade | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | Até 30/11/10 | Previsão até 31/12/10 |
| Concluídos | 35 de APOIO À NAVEGAÇÃO | 107 | 107 |
| | 33 de APOIO À PLATAFORMA | | |
| | 35 de CARGA | | |
| | 3 de PESCOA | | |
| | 1 de PASSAGEIROS | | |
| Em Construção | 23 de APOIO À NAVEGAÇÃO | 96 | 96 |
| | 23 de APOIO À PLATAFORMA | | |
| | 46 de CARGA | | |
| | 1 de PASSAGEIROS | | |
| | 3 ESTALEIROS ** | | |
| Contratados | 27 de APOIO À NAVEGAÇÃO | 81 | 103 |
| | 47 de APOIO À PLATAFORMA | | |
| | 27 de CARGA | | |
| | 2 ESTALEIROS *** | | |
| Subtotal | | 284 | 306 |
| Aprovados no Conselho/ priorizados | 7 de APOIO À NAVEGAÇÃO | 177 | 155 |
| | 64 de APOIO À PLATAFORMA | | |
| | 42 de CARGA | | |
| | 8 de PESCOA | | |
| | 14 ESTALEIROS | | |
| Total | | 461 | 461 |

* Previsão em 31/12/2010

** Estaleiros em construção (2 novos empreendimentos e 1 modernização): Atlântico Sul (Suape/PE), Navship (Navegantes/SC) e STX (RJ)

*** Estaleiros contratados (2 modernizações): Ebin/Aliança (RJ) e Mauá (RJ)

ESTALEIRO RIO GRANDE – DIQUE SECO



Estaleiro Rio Grande – Dique Seco e Oficinas

DESCRIÇÃO: Disponibilização de uma infraestrutura com capacidade para construção e reparo de Unidades Estacionárias de Produção (UEPs), tipos semissubmersíveis e monocoluna

UF: RS

DATA DE CONCLUSÃO : 21/10/2010

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 800 milhões

PROPRIETÁRIO: W. Torre

ARRENDATÁRIO: Petrobras

RESULTADO

- Empreendimento concluído em 21/10/2010



AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PETROLEIROS

Lote 1 – 10 petroleiros – Suape



Navio Suezmax João Cândido

DESCRIÇÃO: Construção de 10 navios Suezmax (150 a 200 mil toneladas de porte bruto) para transporte de petróleo, em atendimento à 1ª fase do Projeto de Ampliação e Modernização da Frota de Navios da Petrobras no Estaleiro Atlântico Sul

UF: PE
DATA DE OPERAÇÃO DO 1º NAVIO: 31/03/2011
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2013
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 808 milhões
INVESTIMENTO PÓS 2010: R\$ 1,4 bilhão
EMPREENDEDOR: Transpetro (Petrobras)

RESULTADOS

- Obra em andamento com 31% realizados, sendo 12% em 2010
- Lançamento do primeiro navio Suezmax – João Cândido – ao mar em 07/05/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obra em andamento, previsto 35% de realização até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Concluir primeiro navio até 31/03/2011



AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PETROLEIROS

Lote 4 – 4 petroleiros – Niterói



Lançamento ao mar do navio Sérgio Buarque de Hollanda

DESCRIÇÃO: Construção de 4 navios do tipo Produtos Claros (45 mil tpb) para transporte de derivados claros, em atendimento à 1ª fase do Projeto de Ampliação e Modernização da Frota de Navios da Petrobras no Estaleiro Mauá

UF: RJ
DATA DE OPERAÇÃO DO 1º NAVIO : 31/03/2011
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 173 milhões
INVESTIMENTO PÓS 2010: R\$ 242 milhões
EMPREENDEDOR: Transpetro (Petrobras)

RESULTADOS

- Obra em andamento com 50% realizados, sendo 25% em 2010
- Lançamento ao mar do primeiro navio de Produtos Claros – Celso Furtado em 24/06/2010
- Lançamento ao mar do segundo navio de Produtos Claros – Sérgio Buarque de Hollanda em 19/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010


- Obra em andamento, previsto 55% de realização até 31/12/2010

PROVIDÊNCIA


- Concluir primeiro navio – Celso Furtado até 30/03/2011



PLANGAS – AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE GÁS Produção e Tratamento

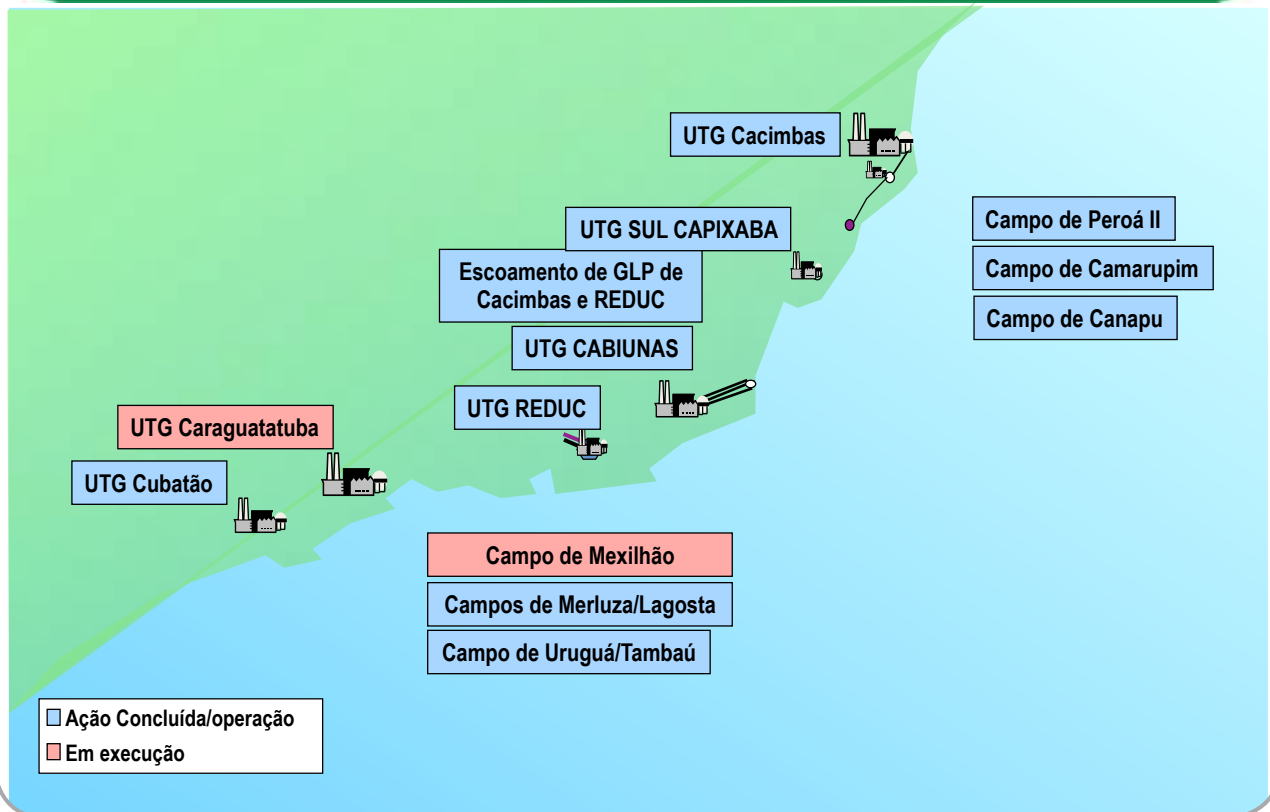

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

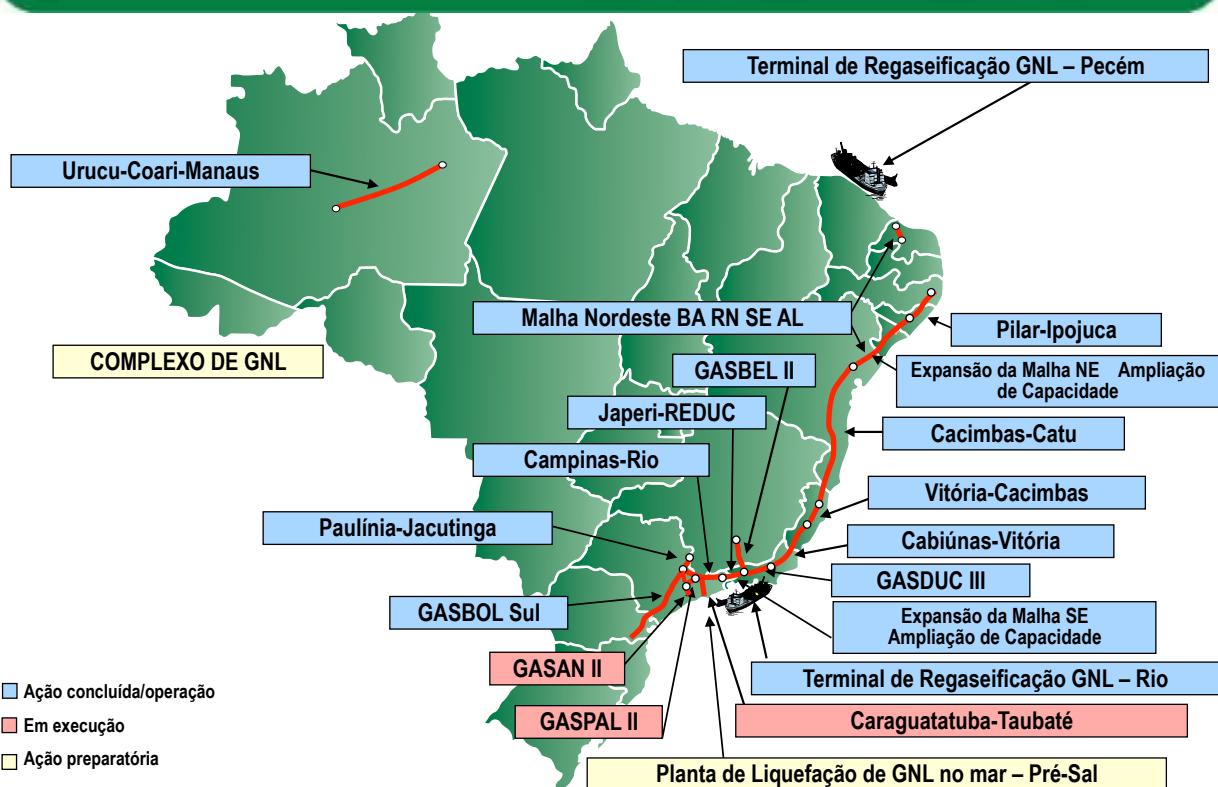

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

Principais Resultados – 2007 a 2010

Gasodutos concluídos – 3.776 km

- Cacimbas/ES-Catu/BA – GASENE – 954 km
- Urucu-Coari-Manaus/AM – 661 km
- Campinas/SP-Rio de Janeiro/RJ – 455 km
- Cabiúnas/RJ-Vitória/ES – 303 km
- Gasbel II – RJ/MG – 267 km
- Catu/BA-Carmópolis/SE – 263 km
- Pilar-Ipojuca – AL/PE – 189 km
- GASDUC III/RJ – 179 km
- Carmópolis/SE-Pilar/AL – 177 km
- Cacimbas-Vitória/ES – 130 km
- Paulínia/SP-Jacutinga/MG – 93 km
- Japeri/SP-Reduc/RJ – 45 km
- Açú-Serra do Mel/RN – 31 km
- Atalaia/SE-Itaporanga/PB – 29 km

Gasodutos em andamento – 194 km

- Caraguatatuba-Taubaté – SP – 96 km – 90 km de dutos enterrados
- GASPAL II – SP – 60 km – Iniciado em mai/2010 – 43 km de dutos enterrados
- GASAN II – SP – 38 km – iniciado em jun/2010 – 1,8 km de dutos enterrados

PLANGÁS E GNL

Principais Resultados – 2007 a 2010

Antecipação da Produção Nacional de Gás Natural

➤ Ações Concluídas

- Campo de Peroá – Fase II – maio/2008
- Campo de Merluza – Lagosta – ago/2009
- Unidade de Tratamento no Terminal de Cabiúnas – out/2009
- Ampliação da capacidade de tratamento do gás natural na Reduc (Plangás Reduc) – dez/2009
- Campo de Canapu – set/2010

➤ Entrada em Operação

- Sistema de compressão da UTG Cubatão – dez/2008
- Campo de Camarupim – Área do ESS 164 – out/2009
- Plangás RPBC – dez/2009
- Partida do Módulo 2 da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas – jan/2010
- Iniciado o escoamento de GLP das UTGs de Cacimbas e Reduc (Plangás GLP) – mar/10
- Campo de Uruguá /Tambaú – jul/2010
- UTG Sul Capixaba – out/2010

➤ Terminais de GNL Concluídos

- GNL Pecém/CE – operação comercial – início de fornecimento de gás em jan/2009
- GNL Baía de Guanabara – início de fornecimento de gás em mar/2009

EXPLORAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS

Evolução das Ações Significativas

GASENE – Gasoduto Cacimbas-Vitória

GASENE – Gasoduto Cabiúnas-Vitória

Plangás – Fase 2 do Campo de Peroá

Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro


Plangás – GNL Porto de Pecém/CE

Plangás – GNL Baía de Guanabara/RJ

Gasoduto Urucu-Coari-Manaus

Plangás – Gasoduto GASDUC III

Plangás – Mexilhão



GASODUTO CACIMBAS-VITÓRIA



Gasoduto Cacimbas - Vitória

DESCRIÇÃO: Corresponde à primeira fase do GASENE, que interligará as malhas das Regiões Nordeste e Sudeste. Até a conclusão das demais fases, permitirá levar o gás da Bacia do Espírito Santo para Vitória.

UF: ES META: 130 km de duto
 DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 31/07/2010
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 146 milhões
 EMPREENDEDOR: Petrobras
 Composição Acionária: Petrobras 100%

RESULTADO

➤ Início da Operação em 31/07/2007



GASODUTO CABIÚNAS-VITÓRIA



GASENE: Cabiúnas-Vitória – conclusão do enterramento do duto

DESCRIÇÃO: O gasoduto corresponde à segunda fase do GASENE, que permitirá interligar as malhas das regiões Nordeste e Sudeste

UF: RJ/ES META: 303 km de duto
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 01/02/2008
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1 bilhão
EMPREENDEDOR: PETROBRAS
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: PETROBRAS 100%

RESULTADO

➤ Início da operação em 01/02/2008



FASE II DO CAMPO DE PEROÁ



Fase II do Campo Peroá

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração e completação submarina de 3 poços no campo de Peroá, com capacidade de produção individual de 2 milhões de m³/dia, escoando para a plataforma PPER-1, além da locação de compressores e ampliação da infra-estrutura da UTG de Cacimbas

UF: ES META: 6 MM m³/dia de gás
DATA DE CONCLUSÃO: 27/05/2008
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 482 milhões
EMPREENDEDOR: PETROBRAS
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: PETROBRAS 100%

RESULTADO

➤ Concluído o empreendimento em 27/05/2008



GASODUTO CAMPINAS-RIO



Gasoduto Campinas - Rio

DESCRIÇÃO: O gasoduto permitirá a oferta de gás boliviano e, futuramente, gás da Bacia de Santos para atendimento ao mercado do Rio de Janeiro

UF: SP/RJ META: 455 km de duto
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 17/07/2008
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 480 milhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100%

RESULTADO

- Iniciada a operação em 17/07/2008



TERMINAL DE GNL – PECÉM



Vista geral do píer

DESCRIÇÃO: Implantação de um Píer de GNL, em Pecém – CE

UF: CE META: 6 MM m3/dia de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 18/01/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 981 milhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100%

RESULTADO

- Operação iniciada em 18/01/2009



TERMINAL DE GNL – BAÍA DE GUANABARA



Vista geral do píer

DESCRIÇÃO: Implantação de um Píer de GNL, com dois braços de carregamento, nas proximidades do píer secundário do Terminal da Ilha D' água, na Baía da Guanabara – RJ

UF: RJ META: 14 milhões m³/dia de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 30/04/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 2,1 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100%

RESULTADO

➤ Operação comercial iniciada em 30/04/2009



GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS



Faixa do duto já recomposta

DESCRIÇÃO: Permitirá escoar a produção de gás natural dos polos de Urucu e Juruá, para atendimento do mercado do AM, principalmente para a geração de energia elétrica

UF: AM META: 661 km de duto
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 02/10/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 4 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobrás
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobrás 100%

RESULTADO

➤ Iniciada a operação em 02/10/2009



GASODUTO GASDUC III



Ponto de entrega

DESCRIÇÃO: Aumentar a capacidade de transporte de gás entre Cabiúnas e Rio de Janeiro

UF: RJ META: 179 km de duto
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 15/01/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1,8 bilhão
EMPREENDEDOR: Petrobras 100%

RESULTADO

- Iniciada a operação em 15/01/2010



CAMPO DE MEXILHÃO



Plataforma PMXL-1

DESCRIÇÃO: Perfuração e completção de 7 poços de gás não associado, instalação de plataforma do tipo fixa (PMXL-1), com capacidade de 15 milhões de m³/dia, além da instalação de gasoduto de exportação, até o litoral de Caraguatatuba

UF: SP META: 15 MM m³/dia de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 16/03/2011
DATA DE CONCLUSÃO: 31/08/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 4,6 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras 100%

RESULTADO

- Obra em andamento com 88% realizados, sendo 16% em 2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Obra em andamento, previsto 94% de realização até 31/12/2010
- Obter anuência da Capitania dos Portos até 20/12/2010
- Iniciar os testes e comissionamento da plataforma até 20/12/2010
- Concluir do comissionamento do sistema submarino até 31/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- Emitir a LO até 14/02/2011
- Início da operação comercial depende da conclusão do Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté até 16/03/2011
- Iniciar o escoamento de gás natural até 16/03/2011



COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS



RESULTADOS 2007 A 2010

COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Biodiesel

- Estabelecida a obrigatoriedade do B3 no 2º sem/2008, do B4 no 2º sem/2009 e do B5 no 1º sem/2010
- Produção 2007-2010 * – 5,2 bilhões de litros
- Produção esperada em 2010 – 2,4 bilhões de litros, crescimento de 48% em relação a 2009
- Realização de 20 leilões de biodiesel pela ANP para o abastecimento entre 2006 e 2010, com a aquisição no acumulado de 6,5 bilhões de litros (inclui o abastecimento do 1º trimestre/11)
- 20º Leilão – 17/11/2010 – abastecimento do mercado a partir de 01/01/2011 – volume comercializado de 600 milhões de litros

Etanol

- Produção 2007-2010 ** – 100,5 bilhões de litros
- Produção esperada em 2010^Δ – 28,5 bilhões de litros, crescimento de 9,6% em relação a 2009
- Exportações de etanol 2007-2010 ▣ – 13,3 bilhões de litros

* Fonte: ANP (janeiro/2007 a outubro/2010)

** Fonte: MAPA (janeiro/2007 a outubro/2010)

^Δ Fonte: CONAB - Levantamento da Safra 2010 / 2011

▣ Fonte: ALICE/MDIC (janeiro/2007 a outubro/2010)

ALCODUTO SENADOR CANEDO/GO-SÃO SEBASTIÃO/SP



Alcoduto Senador Canedo - São Sebastião

DESCRIÇÃO: Duto para transporte de etanol entre Senador Canedo/GO e São Sebastião/SP, viabilizando o escoamento de até 12,9 milhões de m³/ano de etanol

UF: GO/MG/SP META: 542 km de dutos novos (1ª fase)

DATA DE CONCLUSÃO (1ª fase): 30/06/2012

INVESTIMENTO PREVISTO TOTAL: R\$ 4,5 bilhões

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 458,4 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010 : R\$ 4,0 bilhões

EMPREENDEDOR: Trecho Paulínia-São Sebastião – 100% Petrobras
Trecho Senador Canedo-Paulínia – Petrobras 20%; Copersucar 20%; Cosan 20%,
Odebrecht Transport Participações 20%, Uniduto 10% e Camargo Correa 10%

RESULTADOS

- Obra em andamento com 2,8% de realização física
- Entregue EIA/RIMA ao IBAMA em 22/04/2009
- Obtida a LP em 06/07/2010
- Obtida a LI em 28/10/2010
- Obtida Autorização de Construção da ANP em 11/11/2010
- Obra iniciada em 23/11/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Obra em andamento previsto 3,4% de realização física até 31/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- Iniciar as obras do trecho Ribeirão Preto/SP – Uberaba/MG até 30/06/2011
- Concluir a primeira fase do alcoduto até 30/06/2012



Refinaria Presidente Bernardes - Cubatão • SP





Infraestrutura Social e Urbana

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

No final de outubro de 2010 eram monitoradas 205 ações do eixo Social e Urbano. Este número não inclui as ações de Saneamento e Habitação.

A evolução das ações monitoradas mostra que, por valor, 35% foram concluídas e 48% estão com execução adequada, enquanto 15% merecem atenção e 2% estão em situação preocupante.

Pelo critério de quantidade, o índice de concluídas é de 33% e o de ações em ritmo adequado, de 43%. As ações em atenção somam 19% e as com situação preocupante, 5%.

Em relação à evolução do estágio das ações monitoradas desde 2007, por valor, 40% foram concluídas e 59% estão em

obras. Há, ainda, 1% em licenciamento ou projeto.

Dos empreendimentos incluídos no PAC após 2008, em valor, 17% foram concluídos e 72% estão em obras. Outros 10% estão em licitação e 1% em licenciamento ou projeto.

Pelo critério de quantidade, 40% das ações do eixo Social e Urbano acompanhadas desde 2007 foram concluídas, 51% estão em obras, 2% em licitação e 7% em projeto ou licenciamento.

No grupo de ações incluídas após 2008, considerando a quantidade, 13% foram concluídas, 57% estão em obras, 20% em licitação da obra e 10% em fase de projeto ou licenciamento.



Rocinha - Complexo Esportivo • RJ

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA Evolução do Monitoramento do PAC


Dezembro/2009 – 202 ações monitoradas

Abril/2010 – 202 ações monitoradas

Outubro/2010 – 205 ações monitoradas devido a desmembramentos

Não inclui Saneamento e Habitação


INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA Evolução da Situação das Ações Monitoradas

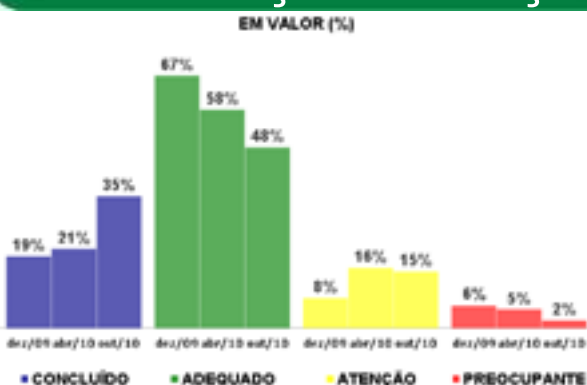

Posição: 31 de outubro de 2010
Não inclui Saneamento e Habitação


INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Valor

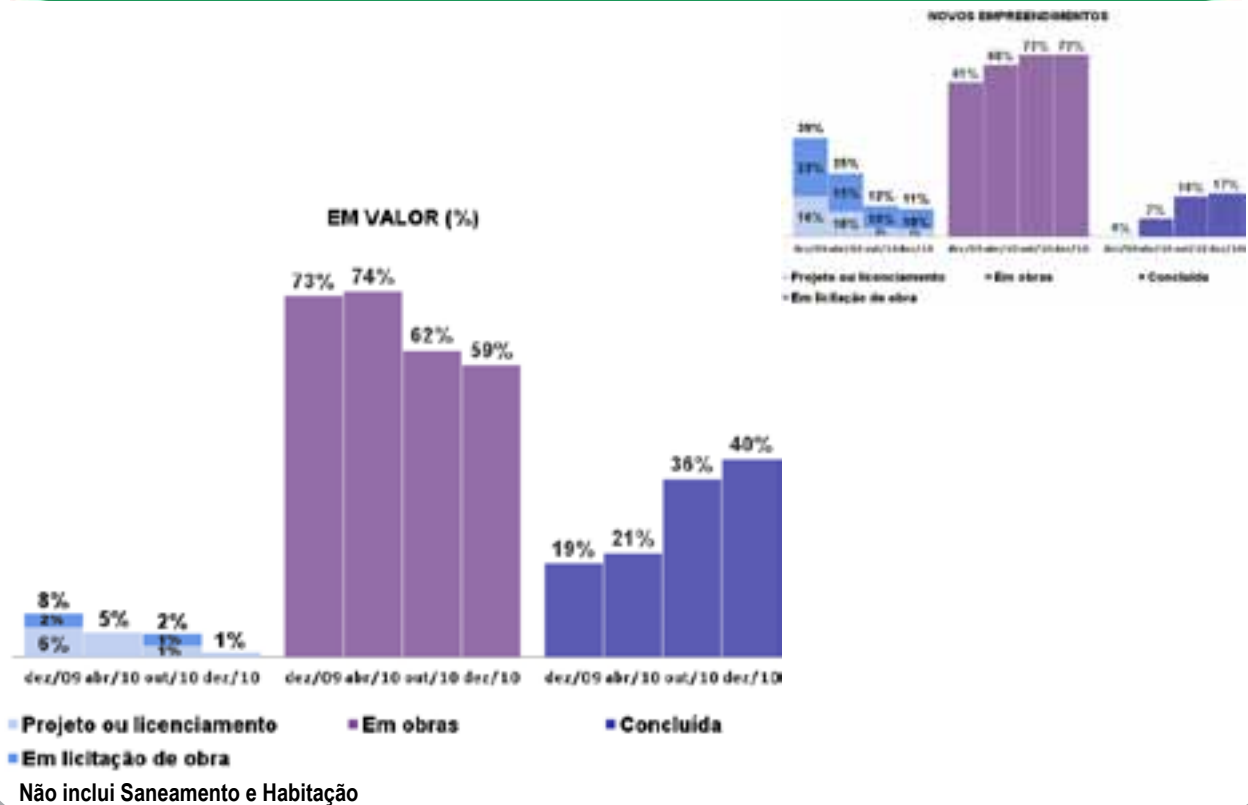

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA

Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Quantidade

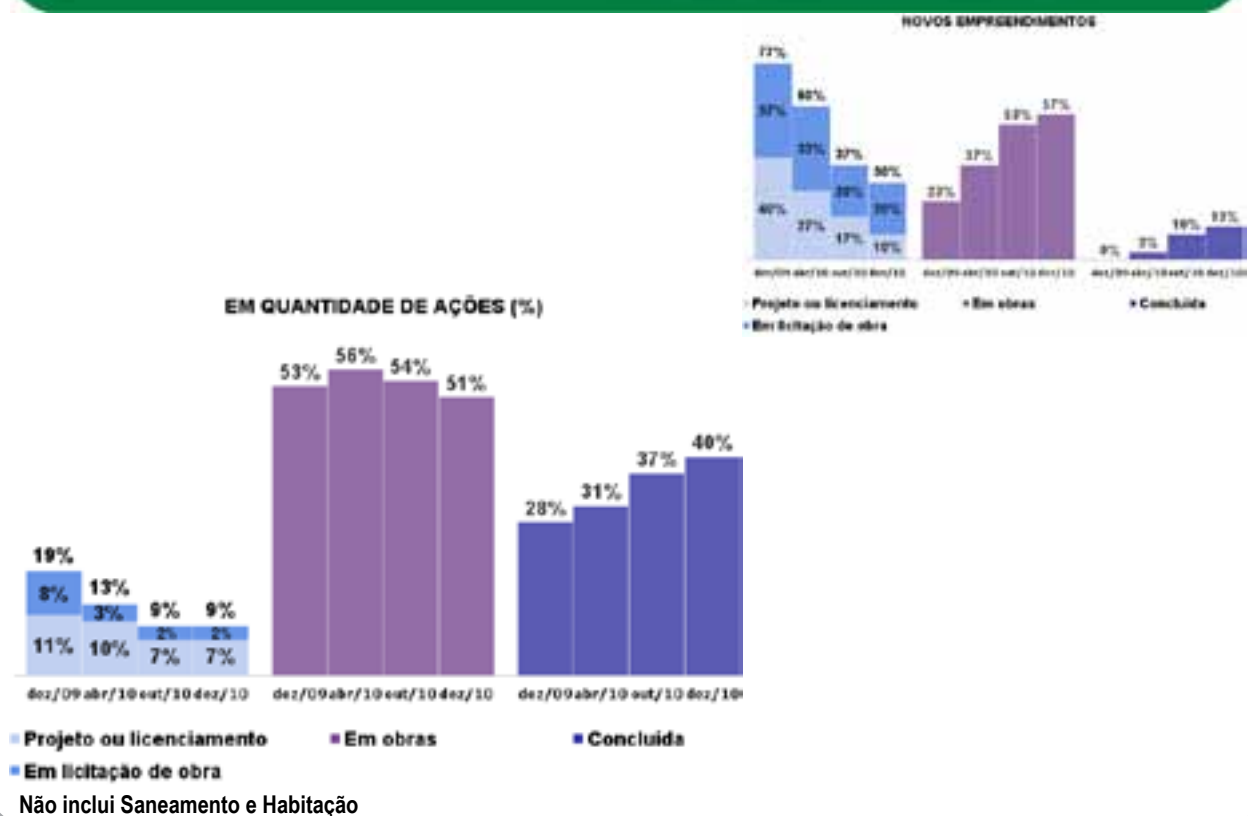

LUZ PARA TODOS



RESULTADOS 2007 A 2010

LUZ PARA TODOS

Ligações realizadas até outubro de 2010 – 2.568.913 – 87%

Ligações realizadas até dezembro de 2010 – 2.655.352 – 90%

**Meta Original 2004-2008 – 2 milhões de ligações
Atingida em maio de 2009**

**Alcance da meta original em 21 estados
AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE,
PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP e TO**


**Alcance da meta adicional em
PE, RN, RS, SE e SC**

METRÔS



RESULTADOS 2007 A 2010

METRÔS

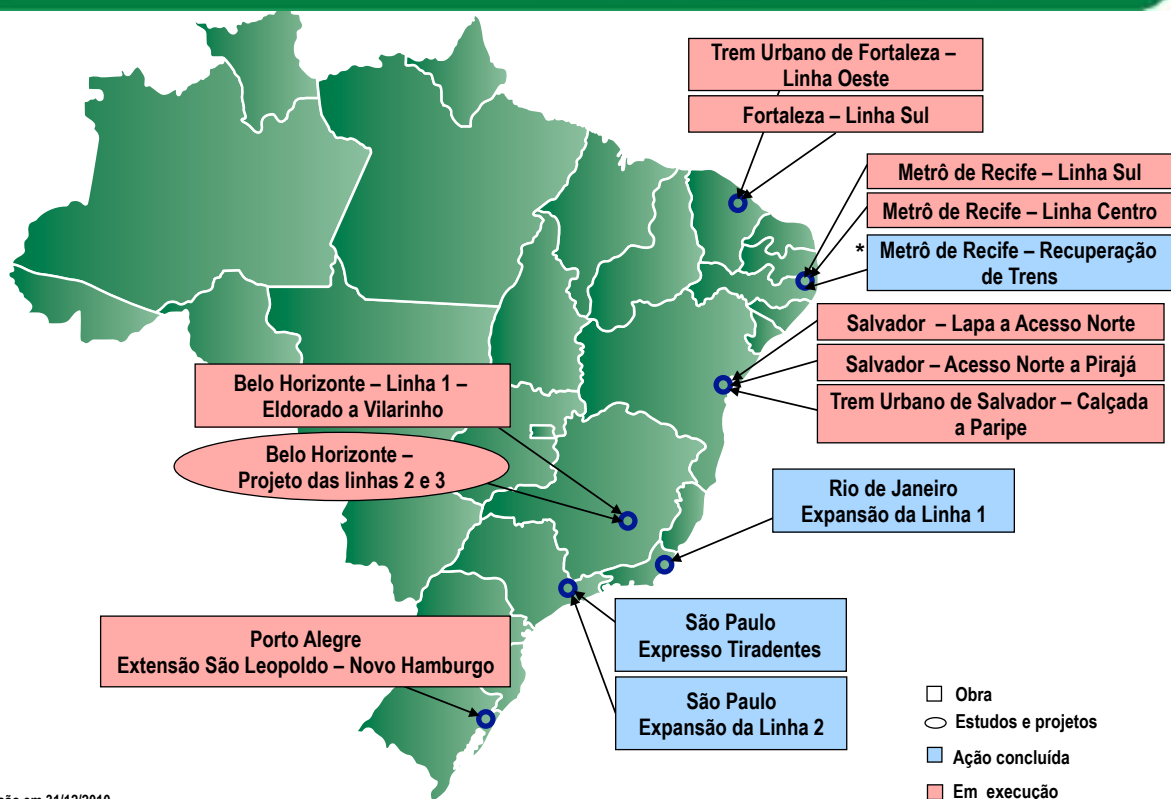

* Previsão em 31/12/2010

METRÔS

Principais Resultados – 2007 a 2010

- **Metrô de Recife – 84% realizados***
 - Iniciada a operação completa da Linha Sul eletrificada, com a inauguração da Estação Cajueiro Seco em 23/03/2009
 - Entregues à operação 25 trens elétricos (TUE) recuperados e climatizados
- **Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre – 71% realizados***
- **Corredor Expresso Tiradentes – Concluídos os 10,8 km – início da operação em 30/03/2009**
- **Metrô SP – Expansão da Linha 2 – Concluída a expansão de 4,3 km e entregues à operação as estações de Sacomã, Tamandateí e Vila Prudente e 16 novos trens**
- **Metrô RJ – Expansão da Linha 1 – Início da operação da Estação General Osório, em Ipanema, em 21/12/2009**
- **Metrô de Salvador – Lapa a Acesso Norte – Obra em fase final com 95% realizados***
- **Metrô de Fortaleza – Linha Sul – 73% realizados***

* Previsão em 31/12/2010

METRÔS

Evolução das Ações Significativas

Corredor Expresso Tiradentes



Recife – Recuperação de Trens



Recife – Linha Sul



Recife – Linha Centro



Belo Horizonte – Linha 1 – Eldorado a Vilarinho



Fortaleza – Vila das Flores a João Felipe



Trem Urbano de Salvador – Calçada a Paripe



Salvador – Lapa a Acesso Norte



Salvador – Acesso Norte a Pirajá



CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES



Trecho 3 – Estação Alberto Lion

DESCRIÇÃO: Corredor exclusivo de ônibus com 10,8 km de extensão, ligando o Parque D. Pedro II (Centro) à av. Luis Inácio de Anhaia Mello

UF: SP

META: 32,8 Km

DATA DE CONCLUSÃO: 30/03/2009

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 397,8 milhões

EXECUTOR: PMSP/ Secretaria Municipal de Transportes – SPTRANS

RESULTADOS

- Trechos 1 a 3 em operação
 - Trecho 3 – obras concluídas em 30/03/2009 – 2,8 km ao longo da av. Luis Inácio de Anhaia Mello
 - Trechos 1 e 2 – concluídos em março de 2007 – 8 km ligando a Estação D. Pedro II ao Terminal Sacomã



METRÔ DE RECIFE



1º VLT de Recife

DESCRIÇÃO: Implantação da Linha Sul eletrificada, da estação Recife até Cajueiro Seco, com 14,5 km, 10 estações e 6 terminais de integração. Duplicação e modernização da Linha Sul diesel, da estação Cajueiro Seco até Cabo, com 17,6 km, 5 estações e aquisição de 7 trens leves a diesel com 3 carros (VLT)

Expansão da Linha Centro eletrificada, da estação Rodoviária até Camaragibe, com 4,7 km, 2 estações e 1 terminal e integração. Recuperação da Linha Centro eletrificada, da estação Recife até Jaboatão e da estação Coqueiral à Rodoviária, com 20,7 km, 17 estações e 3 terminais de integração

Recuperação de 25 trens elétricos para as linhas eletrificadas Centro e Sul

UF: PE

META: 57,5 km

DATA DE CONCLUSÃO: 30/11/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 392,3 milhões

EXECUTOR: Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU

RESULTADOS


- Obra em andamento, com avanço físico acumulado de 82%, sendo 5,3% em 2010
 - Linha Sul: 51% realizados – lançada a licitação para a aquisição de materiais e recuperação da via permanente do trecho Cajueiro Seco até Cabo, em 30/09/2010
 - Linha Centro: 86% realizados – Estação Cosme e Damião em construção, com 30% realizados
 - Recuperação de 25 trens elétricos (TUE) – entregues à operação o 22º, 23º e 24º trens elétricos (TUE) recuperados e climatizados, até 30/11/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Realizar 84% das obras até 31/12/2010, sendo 7,3% em 2010
- Governo PE - publicar o edital do Terminal Prazeres, até 15/12/2010
- Entregar à operação o 25º (TUE) até 20/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Entregar o primeiro VLT até 15/01/2011



* Previsão em 31/12/2010

METRÔ DE BELO HORIZONTE – LINHA 1 Eldorado a Vilarinho



Acesso ao Pátio de Manobra da Estação Vilarinho

DESCRIÇÃO: Conclusão da Linha 1 de Eldorado a Vilarinho, com a expansão de 6,6 km de linha, com 5 estações e 2 terminais de integração, e com a implantação da sinalização e modernização dos trens e do centro de manutenção

UF: MG META: 6,6 km

DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 21,3 milhões

EXECUTOR: Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU

RESULTADOS

- Linha 1 concluída e em operação, restando a conclusão do Pátio de Manobra – 99% realizados
- Concluído o sistema de sinalização de São Gabriel até Vilarinho e a modernização do CCO, em 30/11/2010
- Entregue o painel de *Video Wall* para telessupervisão da movimentação nas estações, em 03/12/2011

PROVIDÊNCIAS

- Concluir a remoção das interferências para permitir o avanço da obra do Pátio de Manobra, até 28/02/2011
- Concluir o empreendimento até 30/06/2011



METRÔ DE FORTALEZA – LINHA SUL Vila das Flores a João Felipe



Obras na Estação Lagoinha

DESCRIÇÃO: Implantação completa da Linha Sul, trecho Vila das Flores a João Felipe, com duplicação e eletrificação da via em uma extensão de 24,1 km, sendo 2,2 km em elevado e 3,9 km em subterrâneo, implantação de sinalização e de telecomunicações e aquisição de 10 trens elétricos de 4 carros (TUE)

UF: CE META: 24,1 km

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011

INVESTIMENTO PREVISTO: R\$ 804,3 milhões

OGU: R\$ 572,8 milhões

Financiamento: R\$ 142,5 milhões

Governo do Estado do Ceará: R\$ 89 milhões

EXECUTOR: Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR

RESULTADOS

- Avanço físico acumulado de 68%, sendo 10% em 2010
 - Obras civis em andamento – 83% – elevado de Parangaba – 95%; estação de Parangaba – 94%; trecho subterrâneo – 78%; estações em superfície – 82%; via permanente do trecho em superfície – 87%; viadutos rodoviários e ferroviários – 94%; CCO/Centro Administrativo – 47%; e Passarelas – 85,1%
 - Trecho subterrâneo em trincheira e estações José de Alencar (antiga Lagoinha) a Xico da Silva (antiga João Felipe), com 29,1% e 8,2% realizados, respectivamente

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Concluir 73% do avanço físico acumulado, sendo 15% em 2010

PROVIDÊNCIAS

- Conclusão das obras civis até 30/06/2011
- Conclusão das estações de Lagoinha e Xico da Silva até 30/09/2011



TREM URBANO DE SALVADOR Calçada a Paripe



Estação Almeida Brandão recuperada

DESCRIÇÃO: Modernização do sistema de trens metropolitanos no trecho Calçada até Paripe, com 13,5 km de extensão, 10 estações, 2 terminais de integração e 6 trens elétricos de 4 carros

UF: BA

META: 13,5 km

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 79,1 milhões

EXECUTOR: Companhia de Transporte de Salvador – CTS

RESULTADOS

- Avanço físico acumulado de 54%
 - Obras civis e reforma das instalações fixas em andamento – Estações – 99,4%; Drenagem e Via Permanente – 99,9%; Rede Aérea – 100%; Subestação – 100% e Ponte São João – 9%
 - Recuperação de Trens – 39% e recuperação de locomotivas – 56%
- Assinado o convênio para a recuperação da infra e mesoestruturas da ponte São João em 05/10/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Concluir 55% das obras
- Entregar a 1ª locomotiva recuperada até 30/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- Licitar a substituição da superestrutura da ponte São João até 31/01/2011
- Entregar a 2ª locomotiva recuperada até 31/05/2011
- Entregar o 1º TUE recuperado até 31/01/2011, o 2º até 30/04/2011 e o 3º até 31/07/2011



METRÔ DE SALVADOR Lapa a Acesso Norte



Trem na estação Lapa

DESCRIÇÃO: Implantação completa do trecho Lapa ao Acesso Norte, com 6 km de extensão, sendo 1,5 km subterrâneo e 4,5 km em elevado, 5 estações, sendo 2 com integração e aquisição de 6 trens elétricos de 4 carros

UF: BA

META: 6 km

DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2011

INVESTIMENTO PREVISTO : R\$ 353,5 milhões

OGU: R\$ 268,8 milhões

Governo do Estado da Bahia: R\$ 84,7 milhões

EXECUTOR: Companhia de Transporte de Salvador – CTS

RESULTADOS

- Avanço físico acumulado de 89%, sendo 8,8% em 2010
 - Estações – Campo da Pólvora – 100%; Acesso Norte – 100%; Lapa – 100%; Brotas 100%; e Bonocô – 50%
 - Elevados – Fonte Nova – 100%; Acesso Norte 1 e 2 – 100%; Bonocô 1 – 100%; e Bonocô 2 e 3 – 99,8%
 - Trecho em túnel – 100,0%; Via permanente dupla – 97%; Sistema de energia – 80%; Sinalização – 60%
 - Pátio Auxiliar de Manutenção - PAM – 30%; Recuperação do trecho em solo mole – 60%
- O Estado da Bahia entregou à Prefeitura de Salvador a frota de 6 trens para operação do sistema em 26/08/2010
- Contratada a supervisão e a fiscalização das obras civis e do sistema de energia em 01/09/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Atingir 95% do avanço físico acumulado, sendo 14,8% em 2010
- Concluir as obras civis e os testes do sistema de energia

PROVIDÊNCIA

- Prefeitura de Salvador deverá iniciar a operação assistida do Tramo 1 – Lapa a Acesso Norte até 30/06/2011



METRÔ DE SALVADOR

Acesso Norte a Pirajá



Elevado do Juá

DESCRIÇÃO: Implantação completa do trecho Acesso Norte até Pirajá, com 6,1 km de extensão, sendo 1,4 km em elevado e 4,7 km em superfície, 3 estações, sendo 1 com integração e aquisição de 6 trens elétricos de 4 carros

UF: BA

META: 6,1 km

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2012: R\$ 220 milhões

EXECUTOR: Companhia de Transporte de Salvador – CTS

RESULTADOS

- Obra paralisada, com avanço físico acumulado de 7,5%
- Celebrado convênio com o DEC – Depto. de Eng. e Construção do Ministério da Defesa para elaboração de orçamento detalhado da obra, determinado no item 9.3.1 do Acórdão 2.873/2008-TCU, em 03/02/2010

RESTRICÇÕES

- Execução suspensa aguardando detalhamento orçamentário determinado pelo TCU
- A CTS solicitou prorrogação ao TCU para apresentar o orçamento detalhado da obra, até 31/03/2011

PROVIDÊNCIA

- DEC deve concluir o orçamento detalhado, incluindo nova demanda do TCU, até 31/03/2011




Abastecimento de Água Manaus • AM

RECURSOS HÍDRICOS



RESULTADOS 2007 A 2010

SÃO FRANCISCO – INTEGRAÇÃO E REVITALIZAÇÃO

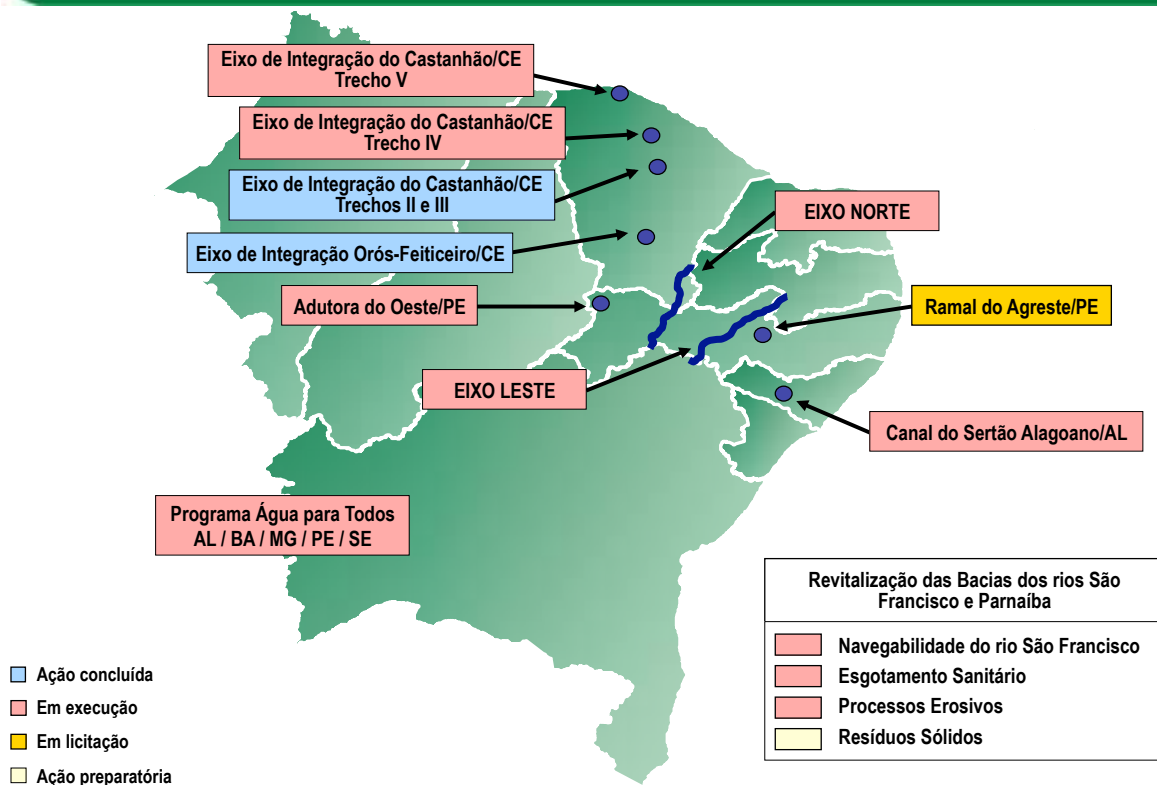

SÃO FRANCISCO – INTEGRAÇÃO

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras concluídas

- Eixo de Integração do Castanhão/CE – trechos II e III – 112 km – 29/08/2008
- Eixo de Integração Orós-Feiticeiro/CE – 18 km – 12/09/2008

Obras em andamento* – Destaques

Projeto de Integração da Bacia do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional

Eixo Leste – 80% realizados

- Exército – 75% realizados do canal de aproximação de 6 km e 97% da Barragem de Areias
- Lote 9 – 66% realizados
- Lote 10 – 62% realizados
- Lote 11 – 90% realizados
- Lote 12 – 44% realizados
- Lote 13 – 52% realizados

Eixo Norte – 52% realizados

- Exército – 75% realizados do canal de aproximação de 2,1 km e 85% da Barragem de Tucutu
- Lote 1 – 82% realizados
- Lote 2 – 52% realizados
- Lote 3 – 15% realizados
- Lote 4 – 10% realizados
- Lote 6 – 36% realizados
- Lote 7 – 17% realizados
- Lote 14 – 4% realizados

Obras complementares

- Adutora do Oeste/PE – 96% realizados e concluídas obras dos ramais III, V e VI
- Canal do Sertão Alagoano/AL – 64,7 km – 70% realizados
- Eixo de Integração do Castanhão/CE – 95% realizados do trecho IV e concluída ETA-Oeste

*Previsão em 31/12/2010

SÃO FRANCISCO – REVITALIZAÇÃO E ÁGUA PARA TODOS

Principais Resultados – 2007 a 2010

Revitalização das bacias do São Francisco e Parnaíba

Esgotamento Sanitário

- Concluídos 23 empreendimentos de esgotamento sanitário nos municípios de Canápolis, Carinhanha, Ibotirama, Muquém de São Francisco e Santa Brígida na BA; 1ª etapa de Tasso Fragoso no MA; Arcos, Bambuí, Dorésópolis, Engenheiro Navarro, Guarda-Mor, Jaíba, Japaraíba, Medeiros, Morada Nova de Minas, Papagaios, Piumhi, Três Marias e Vargem Bonita em MG; Belém de São Francisco, 1ª etapa de Exu, Floresta e Granito em PE
- 89 obras em andamento nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Sergipe


Processos Erosivos

- Concluídos canalização do córrego dos Machados em Bom Despacho e desassoreamento do rio Gorutuba em Janaúba/MG
- Concluídos Centro de Referência em Recuperação do Bioma Caatinga e recuperação da barragem de Cacimba Velha em Petrolina/PE
- Concluídos dique Cotinguiba-Pindoba em Propriá e viveiro de mudas em Betume/SE

Água para Todos

- Construídas 7.945 cisternas em 54 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, atendendo a toda demanda identificada até 15 km das margens do rio São Francisco
- Concluídos 18 sistemas de abastecimento em localidades nos municípios de Igreja Nova, Penedo e Porto Real do Colégio em Alagoas, Juazeiro, Serra do Ramalho e Sítio do Mato na Bahia e Tacaratu em Pernambuco
- Obras de sistemas simplificados de abastecimento em execução em 362 localidades nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe
- Concluída instalação de 112 poços tubulares – 101 na Bahia, 10 em Minas Gerais e 1 em Pernambuco

OFERTA DE ÁGUA BRUTA E PROÁGUA NACIONAL Nordeste

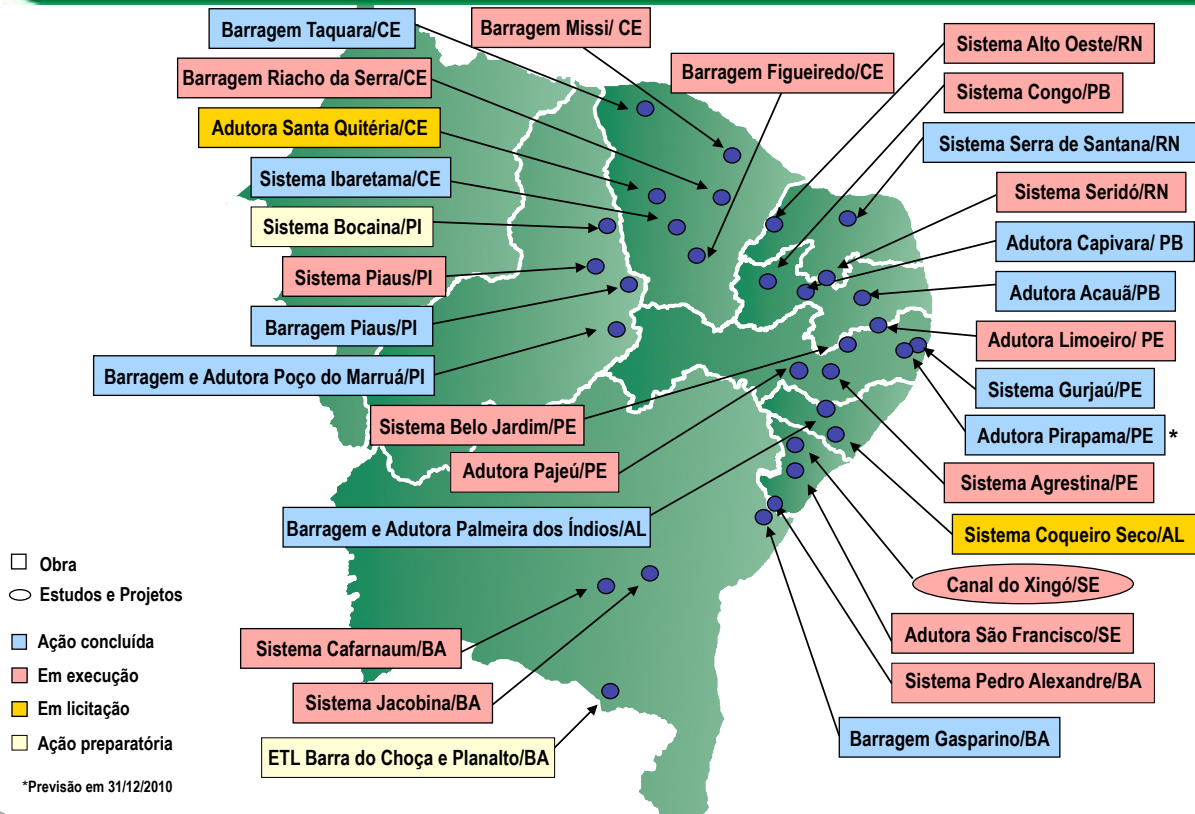

OFERTA DE ÁGUA BRUTA E PROÁGUA NACIONAL Centro-Oeste, Sudeste e Sul



OFERTA DE ÁGUA BRUTA E PROÁGUA NACIONAL

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras concluídas


- Sistema Gurjáú/PE – ampliação – 20/12/2008
- Barragem e adutora Palmeira dos Índios/AL – 16/02/2009
- Barragem e adutora Poço do Marruá/PI – 30/10/2009
- Barragem Setúbal/MG – 18/12/2009
- Barragem Piaus/PI – 30/12/2009
- Adutora Capivara/PB – 31/12/2009
- Sistema Serra de Santana/RN – 31/12/2009
- Barragem Taquara/CE – 07/05/2010
- Adutora Acauã/PB – 25/05/2010
- Sistema Ibaretama/CE – 23/07/2010
- Barragem Peão/MG – 31/08/2010
- Barragem Gasparino/BA – 29/10/2010
- Adutora Pirapama/PE – 20/12/2010

Obras em andamento – Destaques

- Barragem Figueiredo/CE – 86% realizados*
- Barragem Arroio Taquarembó/RS – 75% realizados*
- Sistema Alto Oeste/RN – 85% realizados*

*Previsão em 31/12/2010

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

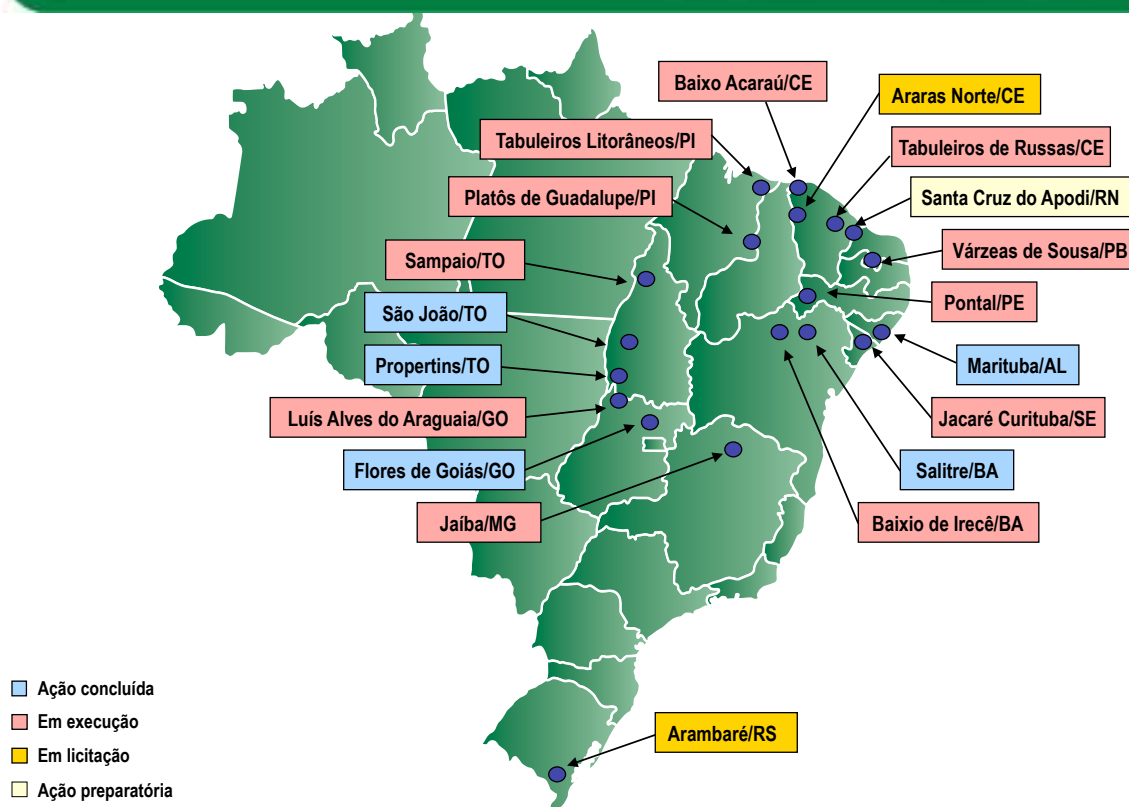

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras concluídas

- Perímetro de Irrigação Propertins/TO – 16/02/2009
- Perímetro de Irrigação de Marituba/AL – 11/01/2010
- Perímetro de Irrigação Flores de Goiás/GO – 14/01/2010
- Perímetro de Irrigação São João/TO – 21/06/2010
- Perímetro de Irrigação Salitre/BA – 1ª etapa – 09/11/2010

Obras em andamento – Destaques

- Baixo de Irecê/BA – concluídas obras de infraestrutura de uso comum da Etapa 1 – 4.723ha e da Etapa 2 – 14.184ha
- Baixo Acaraú/CE – 82% realizados*
- Jaíba/MG – 93% realizados*
- Luis Alves do Araguaia/GO – 75% realizados*
- Pontal/PE – concluído leilão para concessão da PPP em 23/09/2010
- Platôs de Guadalupe/PI – 87% realizados*
- Tabuleiros de Russas/CE – 87% realizados*
- Tabuleiros Litorâneos/PI – 96% realizados*

*Previsão em 31/12/2010

MACRODRENAGEM

Projetos selecionados em junho de 2009



*Previsão em 31/12/2010

MACRODRENAGEM

Principais Resultados – 2007 a 2010

Obras concluídas

- Itajaí/SC – Dragagem rio Itajaí – 06/10/2010
- Miracema do Tocantins/TO – 31/12/2010

Obras em andamento – Destaques

- Baixada Campista/RJ – 35% realizados*
- Boa Vista/RR – 25% realizados*
- Formoso do Araguaia/TO – 93% realizados*
- Navegantes/SC – 20% realizados*
- Salvador/BA – Concluída a 2ª etapa de Itaigara e realizados 45% do Subúrbio Ferroviário*
- São Leopoldo/RS – 50% realizados*

*Previsão em 31/12/2010

RECURSOS HÍDRICOS

Evolução das Ações Significativas

Perímetro de Irrigação Propertins/TO



Adutora Pirapama/PE



Perímetro de Irrigação Salitre/BA



Integração do rio São Francisco



Revitalização dos rios São Francisco e Parnaíba



Programa Água para Todos



Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê/BA



Perímetro de Irrigação Pontal/PE



*Previsão em 31/12/2010

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PROPERTINS



Vista aérea do projeto

DESCRIÇÃO: Implantação da 1ª etapa do perímetro constituído de barragem e aproveitamento hidroagrícola de 5.000ha, possibilitando, adicionalmente, a regularização da vazão do rio Manuel Alves, a geração de energia elétrica e o fornecimento de água às cidades localizadas na sua área de influência

UF: TO

META: 5.000ha

DATA DE CONCLUSÃO: 16/02/2009

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 61,8 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO CONTRAPARTIDA: R\$ 9 milhões

EXECUTOR: Governo do Estado de Tocantins

RESULTADO

- Obra concluída em 16/02/2009
- Obras da subestação rebaixadora de energia iniciadas em 16/09/2009

PROVIDÊNCIA

- Concluir obras da subestação rebaixadora de energia até 31/12/2010



ADUTORA PIRAPAMA



Adutora de Água Tratada

DESCRIÇÃO: Implantação do Sistema Produtor Pirapama

UF: PE

META: 1 unidade

DATA DE CONCLUSÃO: 20/12/2010

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 220,1 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO CONTRAPARTIDA: R\$ 26,4 milhões

EXECUTOR: Governo do Estado de Pernambuco

RESULTADOS

- Concluída implantação da ETA
 - Início da operação com 1 m³/s em 16/06/2010
 - Início da operação com 2,5 m³/s em 29/10/2010
 - Início da operação com 5,13 m³/s em 20/12/2010

PROVIDÊNCIA

- Concluir serviços complementares de urbanização e drenagem até 31/03/2011



*Previsão em 31/12/2010

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE



Produção nos lotes familiares

DESCRIÇÃO: Implantação da etapa I do perímetro de irrigação com área total irrigável de 31.305ha localizados no município de Juazeiro/BA e com vocação para a fruticultura

UF: BA

META: 5.099ha

DATA DE CONCLUSÃO: 09/11/2010

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 216,4 milhões

EXECUTOR: CODEVASF



RESULTADOS

- Concluída implantação da infraestrutura de uso comum da etapa I:
 - Obras civis do sistema adutor principal em 15/06/2009
 - Montagem eletromecânica do sistema adutor principal em 14/02/2010
 - Obras complementares do sistema adutor secundário e distribuição da etapa I em 14/02/2010
 - Montagem das estações pressurizadoras, redes de irrigação e canais dos setores 220, 301-203, 390-10 e 390-30
 - Obras civis complementares do canal principal e do reservatório do sistema adutor principal em 09/11/2010
- Concluída licitação para ocupação de 1.684ha de lotes familiares irrigáveis e de 3.415ha de lotes empresariais irrigáveis

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – EIXO LESTE



Lote 9 – Canal

DESCRIÇÃO: Construção de Canal – Trecho V, estações de bombeamento, reservatórios, túneis e aquedutos. Captação no Reservatório de Itaparica

UF: PE / PB

META: 220 km

DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1,7 bilhão

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 0,2 bilhão

EXECUTOR: Ministério da Integração Nacional



RESULTADOS

- 70% realizados do total do Eixo Leste
 - Exército – realizados 75% do canal de aproximação de 6km e 97% da Barragem de Areias
 - Lote 9 – 66% realizados
 - Lote 10 – 62% realizados
 - Lote 11 – 90% realizados
 - Lote 12 – 44% realizados
 - Lote 13 – 58% realizados
- Concluída fabricação de 60% dos equipamentos hidromecânicos e 70% dos conjuntos de motobombas
- Realizados 25% das subestações e 30% das linhas de transmissão
- Iniciados sistemas de telecomunicações e de controle e automação

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – EIXO LESTE

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Realizar 80% da obra
- Concluir lote C do projeto executivo

PROVIDÊNCIAS

- Concluir lote D do projeto executivo até 20/03/2011
- Concluir fornecimento de motobombas da EB1 e EB2 até 10/02/2011
- Concluir obras civis dos lotes 9, 10, 11, 12 e 13 até 30/06/2011
- Concluir instalação e comissionamento dos equipamentos do lote 13 até 30/06/2011

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – EIXO NORTE



Lote 14 – Túnel Cuncas I

DESCRIÇÃO: Construção de Canal – Trechos I e II, estações de bombeamento, reservatórios, túneis e aquedutos. Captação no Município de Cabrobó/PE

UF: PE/CE/PB/RN

META: 402 km

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1,8 bilhão

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 1,1 bilhão

EXECUTOR: Ministério da Integração Nacional

RESULTADOS

- 47% realizados do total do Eixo Norte
 - Exército – 75% realizados do canal de aproximação de 2,1 km e 85% da Barragem de Tucutu
 - Lote 1 – 82% realizados
 - Lote 2 – 52% realizados
 - Lote 3 – 15% realizados
 - Lote 4 – 10% realizados
 - Lote 6 – 36% realizados
 - Lote 7 – 17% realizados
 - Lote 14 – 4% realizados
- Concluída fabricação de 60% dos equipamentos hidromecânicos e 70% dos conjuntos de motobombas
- Publicado edital de licitação dos lotes 5 e 8 em 28/09/2010
- Realizados 25% das subestações e 30% das linhas de transmissão
- Concluído Lote B do projeto executivo em 23/11/2010



PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – EIXO NORTE

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Realizar 52% da obra
- Concluir Lote A do projeto executivo até 10/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- Concluir licitação de obras dos Lotes 5 e 8 até 21/01/2011
- Concluir obras dos lotes 1 e 2 até 30/06/2011

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS



Vila Produtiva Rural do Junco

DESCRIÇÃO: Implementação dos programas ambientais que visam a eliminação, minimização e controle dos impactos ambientais provocados pela implantação e operação do empreendimento

UF: CE/PB/PE/RN

META: 36 programas

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 226 milhões

EXECUTOR: Ministério da Integração Nacional

RESULTADOS

- Realizados 59% dos Programas Básicos Ambientais
- Concluído PBA de Compensação Ambiental com o repasse dos recursos ao ICMBio em out/2009
- Concluída construção de 177 casas em comunidades indígenas e quilombolas
- Concluída implantação das Vilas Produtivas Rurais de Captação, Junco e Negreiros, com a ocupação das 126 famílias beneficiadas
- Concluídas obras das Vilas Produtivas de Uri e Pilões
- Em construção vilas produtivas rurais de Fazenda Salão, Descanso, Vassouras, Queimada Grande e Malícia
- Em execução:
 - 13 programas de liberação de faixa e supervisão e controle social das obras
 - 9 programas estratégicos e compensatórios dos 13 previstos incluindo o apoio ao desenvolvimento de projetos - Conselho Gestor
 - Programas de Monitoramento – Fauna e Flora, Qualidade D'água e Monitoramento Sistema Adutor



PROVIDÊNCIA

- Obter renovação da licença de instalação até 23/03/2011

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Esgotamento Sanitário



ETE em Canápolis/BA

DESCRIÇÃO: Elaboração de 50 projetos e implantação de 147 obras de esgotamento sanitário - ligações domiciliares, unidades sanitárias, coleta, elevação, tratamento e destinação final de efluentes

UF: AL/BA/MA/MG/PE/PI/SE

META: Implantar sistemas de esgotamento sanitário em 145 municípios e elaborar projetos para 50 municípios

DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 1 bilhão

EXECUTOR: CODEVASF



Estágio das obras nos municípios beneficiados*

| Estágio | Quantidade de intervenções | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| | AL | BA | MA | MG | PE | PI | SE | Total |
| Ação preparatória | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 6 |
| Em licitação | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Em execução | 5 | 31 | 8 | 22 | 11 | 8 | 4 | 89 |
| Paralisadas | 1 | 5 | 1 | 12 | 5 | - | 2 | 26 |
| Concluídas | - | 5 | 1 | 13 | 4 | - | - | 23 |
| Total | 6 | 44 | 10 | 52 | 21 | 8 | 6 | 147 |

* Os municípios de Tasso Fragoso/MA e Exu/PE possuem 2 etapas de implantação

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Esgotamento Sanitário

RESULTADOS

- Projetos básicos concluídos em 43 municípios – 10/AL, 5/MA, 12/MG, 5/PE, 6/PI e 5/SE
- Sistemas concluídos e em operação em 18 municípios – 5/BA - Canápolis, Ibotirama, Muquém de São Francisco, Carinhanha e Santa Brígida; 11/MG - Arcos, Dorésópolis, Engenheiro Navarro, Guarda-Mor, Japaraíba, Medeiros, Morada Nova de Minas, Papagaios, Piumhi, Três Marias e Vargem Bonita; 2/PE – Belém de São Francisco e Granito
- Obras concluídas em 5 municípios – 1/MA - Tasso Fragoso 1ª etapa; 2/MG – Bambuí e Jaíba; 2/PE - Exu 1ª etapa e Floresta
- Concluída licitação para execução de obra em 3 municípios – 1/BA e 2/MG em 30/11/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

Projetos

- Concluir elaboração de projetos para 7 municípios – 1/AL e 6/SE

Obras

- Publicar edital de licitação para execução de obra para 6 municípios – 2/BA, 3/MG e 1/PE
- Publicar edital de licitação para retomada das obras paralisadas em 26 municípios – 1/AL, 5/BA, 1/MA, 12/MG, 5/PE e 2/SE
- Concluir obras em 10 municípios – 1/AL, 1/BA, 6/MG e 2/PE

PROVIDÊNCIA

- Concluir obras de 79 municípios – 4/AL, 30/BA, 8/MA, 16/MG, 9/PE, 8/PI e 4/SE até 30/06/2011

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Recuperação e Controle de Processos Erosivos



Bacia de dissipação - Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica - Rio Tigre/BA

DESCRIÇÃO: Execução de obras para estabilização das margens em pontos sob processos erosivos críticos, revegetação das bacias, proteção de encostas, recomposição da mata ciliar, técnicas de conservação de solo e água e implementação de práticas de gestão hídrica

UF: AL/BA/CE/MA/MG/PE/PI/SE/TO

META: Recuperação de 800.000 ha de microbacias

DATA DE CONCLUSÃO: 01/08/2012

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 203,2 milhões

EXECUTOR: CODEVASF



Estágio das obras nos Estados beneficiados

| Estágio | Quantidade de empreendimentos | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | AL | BA | CE | MA | MG | PE | PI | SE | TO | Total |
| Ação preparatória | 5 | 17 | - | 5 | 20 | 3 | 8 | 5 | 1 | 64 |
| Em licitação | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Em execução | 5 | 10 | 2 | 2 | 18 | 6 | 7 | 3 | - | 53 |
| Concluídas | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 |
| Total | 10 | 28 | 2 | 7 | 41 | 11 | 15 | 10 | 1 | 125 |

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Recuperação e Controle de Processos Erosivos

RESULTADOS

- Concluídos 6 empreendimentos – Canalização do Córrego dos Machados em Bom Despacho/MG; Desassoreamento do Rio Gortuba em Janaúba/MG; Recuperação da Barragem de Cacimba Velha em Petrolina/PE; Centro de Referência em Recuperação do Bioma Caatinga em Petrolina/PE; Dique Cotinguiba-Pindoba em Propriá/SE e Viveiro de mudas em Betume/SE

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Implantar 12 sistemas de rede de monitoramento - ANA - 2/AL, 2/BA, 2/MA, 2/MG, 2/PE e 2/PI
- Concluir implantação de tecnologias sociais - MDS - 1/AL, 1/BA, 1/CE, 1/MG, 1/PE, 1/PI, 1/SE
- Concluir recuperação ambiental em 7 assentamentos e territórios rurais - MDA - 1/BA, 1/CE, 1/MA, 1/MG, 1/PE, 1/PI e 1/SE
- Concluir obras de contenção de barrancas do rio Sabará/MG
- Adquirir equipamentos para combate e controle de queimadas no Projeto Piloto Prevfogo/BA
- Adquirir equipamentos para a Estação de Piscicultura do Piauí
- Concluir barragens de acumulação para dessedentação animal - Recuperação/PI

PROVIDÊNCIAS

- Concluir Recuperação Ambiental de sub-bacia hidrográfica - rio Pará até 05/01/2011
- Implantar Unidade Demonstrativa de Controle de Voçorocas em Santa Filomena/PI até 08/03/2011
- Concluir recuperação ambiental de sub-bacias do Alto São Francisco em Minas Gerais até 16/03/2011
- Implantar 6 Estações de Piscicultura - Bebedouro/PE, Xique-Xique/BA, Itiúba/AL, Neópolis/SE, Três Marias/MG e Nova Porteirinha/MG até 30/3/2011
- Concluir recuperação ambiental de sub-bacia hidrográfica - rio Pajeú/PE até 10/06/2011
- Concluir recuperação ambiental em diversas microbacias localizadas em 7 sub-bacias do rio São Francisco/MG até 29/06/2011
- Concluir recuperação ambiental de sub-bacia hidrográfica - rios Carinhanha, Corrente e Grande/BA até 01/07/2011
- Concluir recuperação ambiental de sub-bacia hidrográfica - Vale do Urucuia/MG até 31/12/2011
- Implantar Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas em Arapiraca/AL até 31/12/2011
- Concluir recuperação ambiental de sub-bacia hidrográfica - rio Tigre/ BA até 09/04/2012
- Concluir recuperação ambiental da microbacia do rio Pacuí – Sub-bacia do Rio Salitre – até 01/08/2012

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos



Aterro Sanitário de Janaúba/MG

DESCRIÇÃO: Implantação, ampliação ou melhoria de sistemas públicos de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos

UF: AL/BA/MA/MG/PE/PI/SE

META: Implantar 20 sistemas de tratamento de resíduos sólidos

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 34,9 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PÓS 2010: R\$ 48,1 milhões

EXECUTOR: CODEVASF



Estágio dos sistemas nos Estados beneficiados

| Estágio | AL | BA | MA | MG | PE | PI | SE | Total |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Ação preparatória | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| Em licitação | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Em execução | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Total | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 |

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos

RESULTADOS

- Sistema Ibimirim/PE – 95% realizados
- Sistema Janaúba/MG – 85% realizados
- Sistema Curvelo/MG – 30% realizados

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Republicar edital de licitação de obras – 2 sistemas: remediação de lixão de Juazeiro/BA e aterro sanitário de João Pinheiro/MG
- Concluir licitação de obras – 2 sistemas: Ecotres/MG até 30/11/2010 e aterro sanitário de Irecê/BA
- Concluir execução das obras – 2 sistemas: aterro sanitário de Janaúba/MG, até 26/12/2010, e aterro sanitário de Ibimirim/PE

RESTRICÇÃO

- Irregularidades nos editais de licitação, por motivo de restrição do caráter de competitividade – necessidade de republicação do edital pelos consórcios municipais

PROVIDÊNCIAS

Republicar edital de licitação do projeto básico – 8 sistemas

- Sistemas de Olho D'água das Flores/Cigres/AL, Cabeceira das Velhas/MG, Central de Minas/MG, Verde Grande-Gorutuba/MG, Paracatu/MG, Pajeú/PE, Nossa Senhora da Glória/SE e Propriá/SE até 30/01/2011

Concluir projeto básico – 5 sistemas

- Sistemas de regiões de Moxotó/Itaparica/PE e Moxotó/Agreste/PE até 31/01/2011
- Sistemas de Timbiras/MA, Parnaíba/PI e Piripiri/PI até 07/03/2011

Concluir execução das obras do aterro sanitário de Curvelo/MG até 13/03/2011

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Navegabilidade do Rio São Francisco



Comboio de carga na Hidrovia do São Francisco

DESCRIÇÃO: Melhoria da navegação do RIO São Francisco, inicialmente no trecho Ibotirama-Juazeiro na Bahia

UF: BA

META: 320 km de hidrovia 100% navegável

DATA DE CONCLUSÃO: 30/10/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 53,1 milhões

EXECUTOR: CODEVASF

RESULTADOS

- 85% realizados
 - Margens esquerda e direita do campo de provas – 5.600m – concluído
 - Dragagem e derrocamento de 10 trechos críticos do rio São Francisco – concluído
 - Serviços de batimetria, amostragem e qualificação do material a ser dragado – concluído
 - Projeto básico de trechos críticos fora do campo de provas – concluído
- Publicado edital de licitação para aquisição da segunda draga em 08/10/2010
- Publicado edital de licitação para execução das obras de desobstrução do Canal de Guaxinim em 25/10/2010



RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- Concluir licitação para aquisição da segunda draga e licitação para execução das obras de desobstrução do Canal de Guaxinim

PROVIDÊNCIAS

- Concluir desassoreamento do canal de Guaxinim até 30/04/2011
- Concluir aquisição e montagem da segunda draga até 30/10/2011

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS



Reservatório elevado para abastecimento de água no povoado de Carneiro, em Xique-Xique/BA

DESCRIÇÃO: Implantação de sistemas de abastecimento de água em 466 localidades, elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água em 121 localidades, construção de 309 poços tubulares e construção de cisternas beneficiando 7.945 famílias em municípios da calha do rio São Francisco

UF: AL/BA/MG/PE/SE

META: Implantar sistemas de abastecimento de água em 466 localidades, elaborar projetos para 121 localidades, construir 7.945 cisternas e 309 poços

DATA DE CONCLUSÃO: 30/07/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 274,9 milhões

EXECUTOR: CODEVASF



Estágio das obras de sistemas de abastecimento de água nos Estados beneficiados

| Estágio | Quantidade de localidades | | | | | Total |
|-------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | AL | BA | MG | PE | SE | |
| Ação preparatória | 30 | - | 28 | - | - | 58 |
| Em licitação | 1 | 27 | - | - | - | 28 |
| Em execução | 1 | 231 | 17 | 85 | 28 | 362 |
| Concluídos | 13 | 4 | - | 1 | - | 18 |
| Total | 45 | 262 | 45 | 86 | 28 | 466 |

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

RESULTADOS

Sistemas simplificados de abastecimento de água

- Concluídos projetos básicos em 65 localidades na Bahia
- Concluídos 18 sistemas de abastecimento – 13/AL – 9/Igreja Nova, 2/Penedo e 2/Porto Real do Colégio; 4/BA – 1/Juazeiro, 2/Serra do Ramalho e 1/Sítio do Mato; e 1/PE - 1/Tacaratu

Cisternas

- Construídas 7.945 cisternas em 54 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, atendendo a demanda identificada até 15 km das margens do rio São Francisco

Poços

- Concluída instalação de 112 poços tubulares – 101/BA: 12/Serra do Ramalho, 17/Xique-Xique, 14/Juazeiro, 29/Curaça, 5/Sobradinho, 6/Barra, 3/Ibotirama, 12/Bom Jesus da Lapa e 3/Paratinga – 1/PE – 1/Lagoa Grande – 10/MG – 2/Pirapora, 1/Santa Fé, 2/São Francisco e 5/Icarai de Minas

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água

Projetos

- Concluir elaboração de projetos básicos para 56 localidades – 2/AL e 54/BA

Obras

- Publicar edital de licitação de obras para 58 localidades – 30/AL e 28/MG
- Concluída licitação de obra para 28 localidades – 1/AL e 27/BA
- Concluir 22 localidades – 16/BA, 4/MG, 2/PE

Poços

- Concluir instalação de equipamentos em 60 poços – 31/BA, 15/MG e 14/PE

PROVIDÊNCIAS

Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água: Concluir 340 localidades – 1/AL, 215/BA, 13/MG, 83/PE e 28/SE até 30/07/2011

Poços: Concluir instalação de equipamentos em 137 poços – 51/BA, 45/MG e 41/PE até 30/06/2011

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ



Canal Principal

DESCRIÇÃO: Obras de infraestrutura comum beneficiando 4.723ha - etapa 1 e 14.184ha - etapa 2. A infraestrutura complementar restante e a ocupação serão via PPP

UF: BA

META: 18.907ha

DATA DE CONCLUSÃO: 30/11/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 230,2 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PPP: R\$ 180 milhões

EXECUTOR: CODEVASF

RESULTADOS

➢ 83% realizados

- Obras de infraestrutura de uso comum da etapa 1 – 4.723ha – concluídas em 30/05/2010
- Obras de infraestrutura de uso comum da etapa 2 – 14.184ha – concluídas em 10/11/2010
- Serviços de construção das linhas de 138 KV e subestações – realizados 83%
- Serviços de construção de linhas de 34,5 KV para suprimento de energia elétrica etapa 2 – 80% realizados
- Projeto executivo das obras de infraestrutura de uso comum da etapa 2 – 95% realizados
- Contratado Banco Mundial para serviços de assessoria para modelagem PPP em 24/09/2010
- Concluído fornecimento de tubulações e acessórios complementares em 28/09/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

Obras / Serviços Comuns

- Concluir execução de serviços de construção das linhas de 138 KV e subestações
- Etapa 1 – Concluir fornecimento de comportas para o canal principal até 22/12/2010
- Etapa 2 – Concluir execução de serviços de construção de linhas de 34,5 KV para suprimento de energia elétrica

PROVIDÊNCIAS

Etapa 1

- Contratar montagem de equipamentos eletromecânicos do Setor A5 até 30/04/2011
- Concluir montagem de equipamentos eletromecânicos do Setor A5 até 30/11/2011
- PPP – Concluir estudos complementares e a elaboração do Edital da PPP até 30/09/2011



PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PONTAL



Canal Principal e Extravasor

DESCRIÇÃO: Implantação de 3.588ha no perímetro de irrigação, área sul. Via PPP serão implantadas obras de infraestrutura de 4.129ha, área norte, e ocupação dos 7.717ha. Cumprir condicionante social da PPP com implantação de 9.000ha da área de sequeiro

UF: PE

META: 3.588ha

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 87 milhões

INVESTIMENTO PREVISTO PPP: R\$ 67,5 milhões

EXECUTOR: CODEVASF

RESULTADOS

- Realizados 93% do Pontal
 - Rede de distribuição de energia – 70% realizados
 - Estradas internas para escoamento da produção – 85% realizados
 - Adquiridas 80% de terras para assentamento
- Realizados 29% da área de sequeiro
 - Parcelamento da área de sequeiro e elaboração do Projeto Básico e Executivo – 45% realizados
 - Implantação de adutoras em atendimento às comunidades da área de sequeiro do projeto – 56% realizados
 - Treinamento e capacitação dos produtores rurais, do entorno do Projeto Pontal – 33% realizados
- Concluído leilão para concessão da PPP em 23/09/2010
- Publicado edital de licitação das obras complementares de implantação das adutoras em atendimento às comunidades da área de sequeiro do projeto em 15/10/2010
- Publicado edital para a construção de 31,3 km de cerca destinada à reserva ambiental em 03/11/2010



PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PONTAL

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

Pontal

- Concluir implantação da rede de distribuição de energia até 31/12/2010

Área de Sequeiro

- Concluir licitação de obras complementares de implantação das adutoras em atendimento às comunidades da área de sequeiro do projeto até 31/12/2010

PPP

- Contratar concessão da PPP até 22/12/2010

PROVIDÊNCIAS

Pontal

- Concluir implantação das estradas internas para escoamento da produção até 08/02/2011

Área de Sequeiro

- Concluir serviços de treinamento e capacitação dos produtores rurais do entorno do Projeto Pontal 31/12/2011

HABITAÇÃO



RESULTADOS 2007 A 2010

HABITAÇÃO

Evolução da contratação dos investimentos 121% superior ao previsto


R\$ bilhões

| PAC Habitação | Previsão 2007-2010 | Selecionado | Contratado até out/10 | Previsão de contratação até dez/10 | % contratação em dez/10 em relação ao previsto |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| OGU e Financiamento Setor Público | 16,9 | 19,1 | 17,8 | 18,6 | 110% |
| Financiamento SBPE e Pessoa Física | 89,4 | 197,8 | 197,8 | 216,9 | 243% |
| TOTAL | 106,3 | 216,9 | 215,6 | 235,5 | 221% |

HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas

RMs, capitais e municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU e Financiamento


Evolução do início das obras pelos estados e municípios
95% de obras iniciadas até outubro/2010

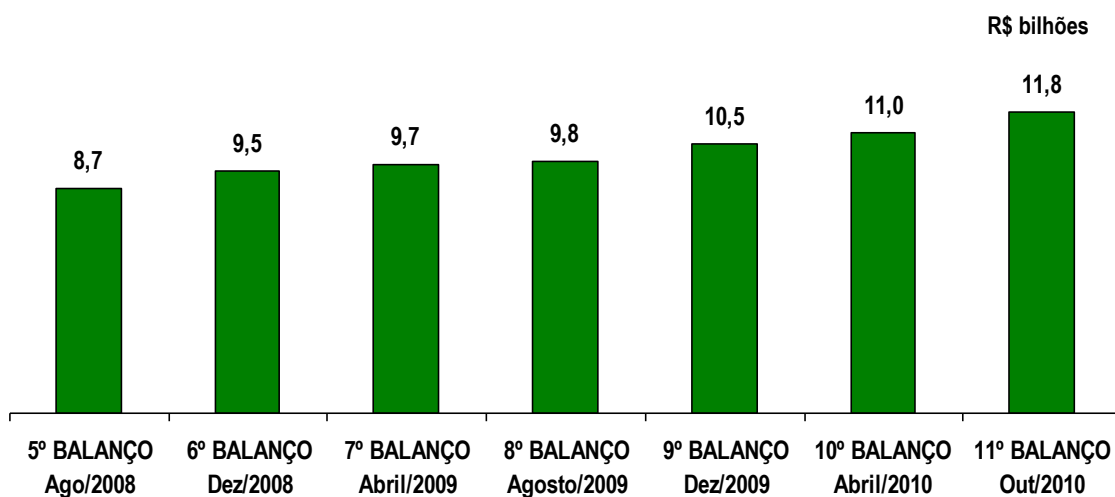

HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas

RMs, capitais e municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU e Financiamento


Evolução do % de execução de estados e municípios

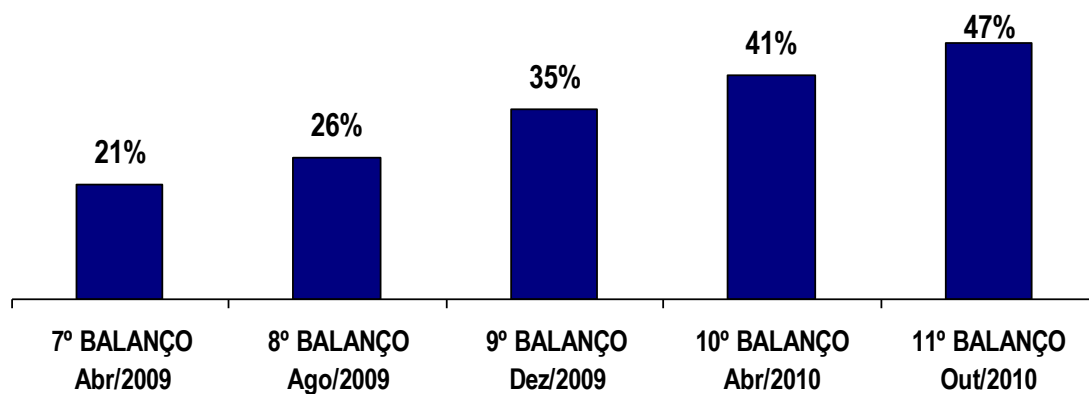

HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas

RMs, capitais e municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU e Financiamento


% de execução por proponente

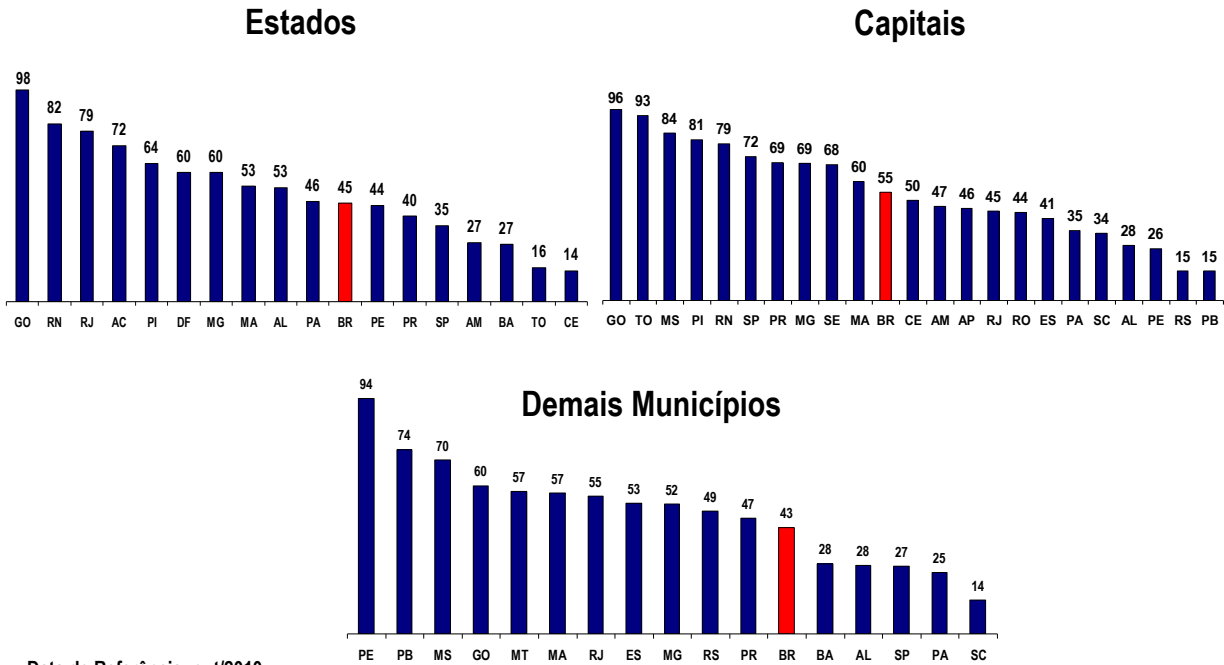

HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas

RMs, capitais e municípios com mais de 150 mil habitantes – R\$ 12,4 bilhões

Evolução do estágio de execução das obras contratadas*

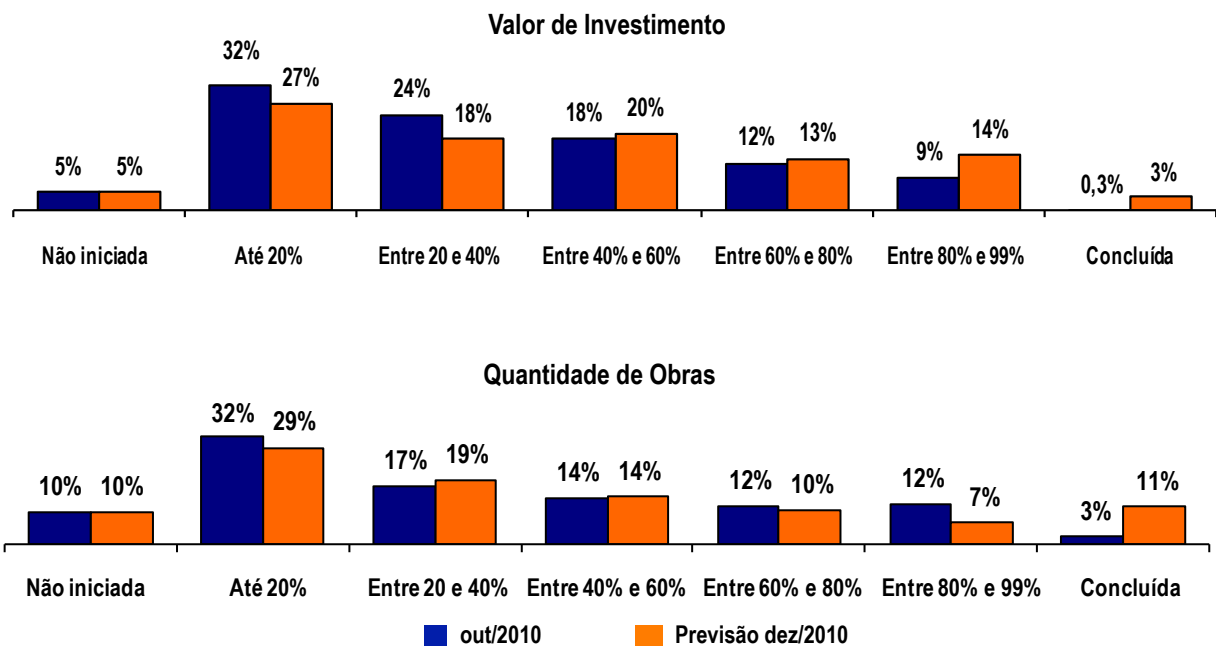

* baseado nas informações de estados e municípios

HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas


RMs, capitais e municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU

R\$ bilhões

| SELECIONADO 2007-2010 | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|-----------------------|-------|------------|-------|------------------|
| QTD | VALOR | QTD | VALOR | |
| 184 | 9,15 | 180 | 9,10 | 99,5% |

| CONTRATADO | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DO INVESTIMENTO CONTRATADO | VALOR DO REPASSE DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA ESTADOS E MUNICÍPIOS |
| 9,1 | 6,8 | 2,3 |

Estágio dos Projetos Contratados

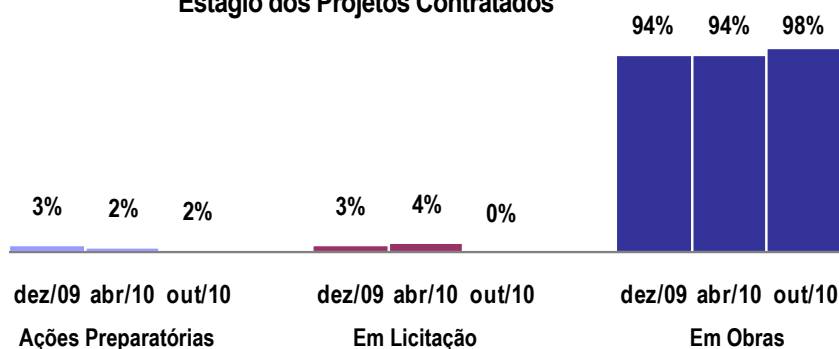

Data de Referência: out/2010

HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas

RMs, capitais e municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU

| REGIÃO / UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras | % obras em estágio avançado* |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| NORTE | 644,6 | 100 | 5 |
| AM | 182,5 | 100 | 0 |
| AP | 28,3 | 100 | 0 |
| PA | 279,1 | 100 | 0 |
| RO | 96,7 | 100 | 0 |
| TO | 58,1 | 100 | 53 |
| NORDESTE | 1.938,4 | 99 | 4 |
| AL | 162,1 | 99 | 0 |
| BA | 294,7 | 94 | 0 |
| CE | 458,3 | 100 | 0 |
| MA | 378,9 | 100 | 0 |
| PB | 64,7 | 100 | 49 |
| PE | 409,8 | 98 | 12 |
| PI | 33,0 | 100 | 0 |
| RN | 89,0 | 100 | 0 |
| SE | 47,9 | 100 | 0 |
| SUDESTE | 5.453,2 | 98 | 7 |
| ES | 139,3 | 100 | 0 |
| MG | 755,8 | 98 | 0 |
| RJ | 1.587,9 | 99 | 10 |
| SP | 2.970,2 | 97 | 7 |
| SUL | 638,1 | 99 | 2 |
| PR | 256,0 | 100 | 4 |
| RS | 279,8 | 98 | 0 |
| SC | 102,3 | 100 | 0 |
| CENTRO-OESTE | 425,1 | 94 | 19 |
| DF | 138,8 | 96 | 11 |
| GO | 163,2 | 93 | 41 |
| MS | 88,3 | 100 | 0 |
| MT | 34,8 | 76 | 0 |
| BRASIL | 9.099,6 | 98 | 6 |

Data de Referência: out/2010

* operações com execução superior a 80% e concluídas

HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas


RMs, capitais e municípios com mais de 150 mil habitantes – Financiamento 2007-2008

R\$ bilhões

| SELECIONADO 2007-2008 | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|-----------------------|-------|------------|-------|------------------|
| QTD | VALOR | QTD | VALOR | |
| 139 | 3,3 | 139 | 3,3 | 100% |

| CONTRATADO | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DO INVESTIMENTO CONTRATADO | VALOR DO REPASSE DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA ESTADOS E MUNICÍPIOS |
| 3,3 | 2,8 | 0,5 |

Estágio dos Projetos Contratados

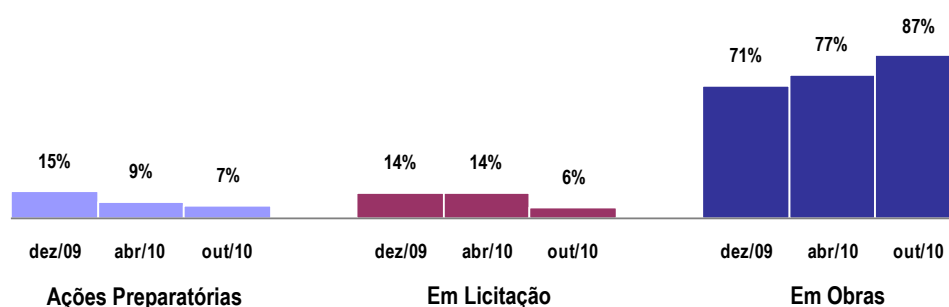

Data de Referência: out/2010

HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas

RMs, capitais e municípios com mais de 150 mil habitantes – Financiamento 2007-2008

| REGIÃO / UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras | % obras em estágio avançado* |
|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| NORTE | 774,8 | 97 | 2 |
| AC | 35,5 | 100 | 29 |
| AM | 104,9 | 100 | 0 |
| PA | 346,2 | 100 | 0 |
| RO | 80,2 | 100 | 0 |
| TO | 207,9 | 90 | 3 |
| NORDESTE | 409,0 | 74 | 0 |
| AL | 13,2 | 100 | 0 |
| BA | 56,7 | 100 | 0 |
| PB | 25,4 | 100 | 0 |
| PE | 128,1 | 19 | 0 |
| PI | 165,2 | 100 | 0 |
| SE | 20,4 | 100 | 0 |
| SUDESTE | 1.630,2 | 81 | 22 |
| ES | 53,2 | 100 | 0 |
| MG | 630,9 | 94 | 33 |
| RJ | 316,9 | 100 | 47 |
| SP | 629,1 | 56 | 0 |
| SUL | 350,7 | 100 | 6 |
| PR | 131,8 | 100 | 15 |
| RS | 197,0 | 100 | 0 |
| SC | 21,9 | 100 | 0 |
| CENTRO-OESTE | 130,3 | 100 | 82 |
| GO | 65,8 | 100 | 100 |
| MS | 23,8 | 100 | 0 |
| MT | 40,7 | 100 | 100 |
| BRASIL | 3.294,9 | 87 | 15 |

Data de Referência: out/2010

* operações com execução superior a 80% e concluídas

HABITAÇÃO

FNHIS 2007-2008 – OGU

2.795 empreendimentos em 27 estados e 1.757 municípios

R\$ bilhões


| SELECIONADO 2007-2008 | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|-----------------------|-------|------------|-------|------------------|
| QTD | VALOR | QTD | VALOR | |
| 2.795 | 2,4 | 2.795 | 2,4 | 100% |

| CONTRATADO | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DO INVESTIMENTO CONTRATADO | VALOR DO REPASSE DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA ESTADOS E MUNICÍPIOS |
| 2,4 | 2,0 | 0,4 |

Estágio dos Projetos Contratados

FNHIS 2007

FNHIS 2008



Data de Referência: out/2010

HABITAÇÃO

FNHIS 2007-2008 – OGU

FNHIS 2007

FNHIS 2008

| REGIÃO / UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras | % obras em estágio avançado* |
|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| NORTE | 163,8 | 96 | 25 |
| AC | 9,7 | 100 | 21 |
| AM | 34,1 | 95 | 3 |
| AP | 2,9 | 2 | 0 |
| PA | 39,4 | 99 | 27 |
| RO | 30,9 | 97 | 6 |
| RR | 30,4 | 100 | 80 |
| TO | 16,3 | 91 | 7 |
| NORDESTE | 340,1 | 65 | 15 |
| AL | 22,3 | 71 | 0 |
| BA | 91,3 | 35 | 4 |
| CE | 61,8 | 80 | 10 |
| MA | 30,6 | 97 | 35 |
| PB | 25,2 | 74 | 46 |
| PE | 60,3 | 62 | 0 |
| PI | 11,4 | 100 | 39 |
| RN | 21,1 | 93 | 74 |
| SE | 16,3 | 36 | 0 |
| SUDESTE | 452,2 | 69 | 9 |
| ES | 22,0 | 69 | 9 |
| MG | 107,6 | 73 | 20 |
| RJ | 134,1 | 68 | 5 |
| SP | 188,5 | 67 | 5 |
| SUL | 136,7 | 71 | 22 |
| PR | 51,5 | 64 | 20 |
| RS | 58,8 | 88 | 21 |
| SC | 26,4 | 44 | 27 |
| CENTRO-OESTE | 86,1 | 93 | 63 |
| DF | 2,3 | 0 | 0 |
| GO | 37,6 | 90 | 50 |
| MS | 20,6 | 99 | 78 |
| MT | 25,6 | 100 | 75 |
| BRASIL | 1.178,9 | 73 | 18 |

| REGIÃO / UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras | % obras em estágio avançado* |
|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| NORTE | 146,2 | 62 | 14 |
| AC | 8,7 | 100 | 37 |
| AM | 23,0 | 89 | 11 |
| AP | 12,5 | 8 | 2 |
| PA | 65,3 | 46 | 1 |
| RO | 15,8 | 79 | 17 |
| RR | 7,4 | 100 | 83 |
| TO | 13,6 | 76 | 38 |
| NORDESTE | 338,1 | 60 | 11 |
| AL | 21,3 | 91 | 4 |
| BA | 82,9 | 27 | 5 |
| CE | 39,8 | 71 | 16 |
| MA | 41,9 | 65 | 25 |
| PB | 23,6 | 71 | 0 |
| PE | 71,9 | 66 | 12 |
| PI | 22,8 | 81 | 13 |
| RN | 14,6 | 92 | 27 |
| SE | 19,5 | 55 | 0 |
| SUDESTE | 478,1 | 53 | 11 |
| ES | 16,9 | 28 | 3 |
| MG | 99,0 | 78 | 13 |
| RJ | 109,0 | 49 | 1 |
| SP | 253,2 | 46 | 15 |
| SUL | 135,1 | 57 | 17 |
| PR | 45,9 | 67 | 22 |
| RS | 62,5 | 50 | 15 |
| SC | 26,8 | 55 | 14 |
| CENTRO-OESTE | 86,5 | 79 | 51 |
| DF | 0,3 | 0 | 0 |
| GO | 38,4 | 87 | 49 |
| MS | 31,4 | 70 | 54 |
| MT | 16,3 | 79 | 51 |
| BRASIL | 1.183,9 | 58 | 15 |

* operações com execução superior a 80% e concluídas

Data de Referência: out/2010

HABITAÇÃO

Seleções 2009-2010 – Financiamento Setor Público e FNHIS


Total dos Investimentos Selecionados – R\$ 4,3 bilhões
Total dos Investimentos Contratados – R\$ 3,1 bilhões

| SELEÇÃO 2009 | SELECIONADO | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| | QTD | VALOR | QTD | VALOR | |
| FNHIS - OGU | 703 | 1,65 | 570 | 1,55 | 94% |
| Financiamento Setor Público | 63 | 2,62 | 29 | 1,49 | 57% |
| TOTAL | 766 | 4,26 | 599 | 3,04 | 74% |

R\$ bilhões

Estágio dos Projetos Contratados

FNHIS 2009-2010



Ações Preparatórias

Em Licitação

Em Obras

Data de Referência: out/2010

Financiamento Setor Público 2009



Ações Preparatórias

Em Licitação

Em Obras

* % de ações em obras caiu em relação a abril/2010 devido à contratação de 15 novos projetos – R\$ 769,2 milhões

HABITAÇÃO

Seleções 2009-2010 – Financiamento Setor Público e FNHIS

FNHIS 2009-2010

| REGIÃO / UF | Investimento selecionado R\$ milhões | % contratado | % em obras |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| NORTE | 178,3 | 95 | 20 |
| AC | 9,9 | 100 | 1 |
| AM | 25,2 | 100 | 0 |
| PA | 72,5 | 90 | 0 |
| RO | 27,1 | 97 | 0 |
| RR | 24,9 | 100 | 100 |
| TO | 18,8 | 94 | 52 |
| NORDESTE | 397,3 | 94 | 3 |
| AL | 23,2 | 100 | 4 |
| BA | 97,1 | 97 | 0 |
| CE | 64,7 | 99 | 0 |
| MA | 14,2 | 94 | 0 |
| PB | 18,1 | 99 | 1 |
| PE | 113,2 | 96 | 0 |
| PI | 16,8 | 66 | 0 |
| RN | 27,4 | 70 | 49 |
| SE | 22,6 | 96 | 0 |
| SUDESTE | 853,5 | 96 | 9 |
| ES | 33,9 | 100 | 0 |
| MG | 187,9 | 95 | 1 |
| RJ | 212,2 | 96 | 0 |
| SP | 419,6 | 97 | 18 |
| SUL | 152,3 | 94 | 6 |
| PR | 50,4 | 95 | 1 |
| RS | 51,7 | 94 | 2 |
| SC | 50,2 | 92 | 14 |
| CENTRO-OESTE | 64,8 | 69 | 21 |
| GO | 25,5 | 46 | 2 |
| MS | 25,0 | 75 | 48 |
| MT | 14,3 | 98 | 1 |
| BRASIL | 1.646,3 | 94 | 9 |

Financiamento Setor Público 2009

| REGIÃO / UF | Investimento selecionado R\$ milhões | % contratado | % em obras |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| NORTE | 110,0 | 20 | 100 |
| AC | 36,3 | 61 | 100 |
| PA | 73,7 | - | - |
| NORDESTE | 387,9 | 88 | - |
| CE | 77,2 | 100 | - |
| MA | 26,5 | - | - |
| PE | 165,0 | 100 | - |
| PI | 35,0 | 100 | - |
| SE | 84,2 | 74 | - |
| SUDESTE | 1.515,9 | 46 | 50 |
| MG | 523,3 | 100 | 54 |
| RJ | 489,2 | - | - |
| SP | 503,5 | 35 | 40 |
| SUL | 290,0 | 38 | - |
| PR | 10,8 | 100 | - |
| RS | 100,3 | 100 | - |
| SC | 178,9 | - | - |
| CENTRO-OESTE | 311,4 | 100 | 29 |
| DF | 311,4 | 100 | 29 |
| BRASIL | 2.615,3 | 57 | 31 |

Data de Referência: out/2010


HABITAÇÃO

Financiamento Habitacional – Pessoa Física

Aquisição, reforma ou construção de novas moradias
Contratado 16% a mais do que o inicialmente previsto para 2007 a 2010
Mais de 939 mil famílias beneficiadas em todo o País

| R\$ bilhões | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| PREVISTO* | CONTRATADO* | % CONTRATADO/ PREVISTO 2007-2010 |
| 2007-2010 | 2007-2010 | |
| 32,5 | 37,7 | 116% |

EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS – FAR/FGTS/SUBSÍDIOS/FDS – R\$ bilhões

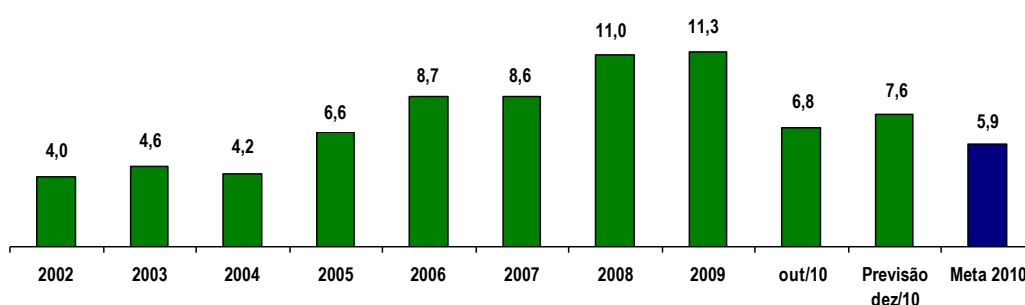

* Não inclui contrapartidas nem contratações do Programa Minha Casa Minha Vida

HABITAÇÃO


Financiamento Habitacional – SBPE

Aquisição, reforma ou construção de novas moradias
Contratado 194% a mais do que o inicialmente previsto para 2007 a 2010
1,1 milhão de famílias beneficiadas em todo o País

| R\$ bilhões | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| PREVISTO* | CONTRATADO* | % CONTRATADO/ PREVISTO 2007-2010 |
| 2007-2010 | 2007-2010 | |
| 42,0 | 123,4 | 294% |

* Não inclui contrapartidas

EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS – SBPE – R\$ bilhões

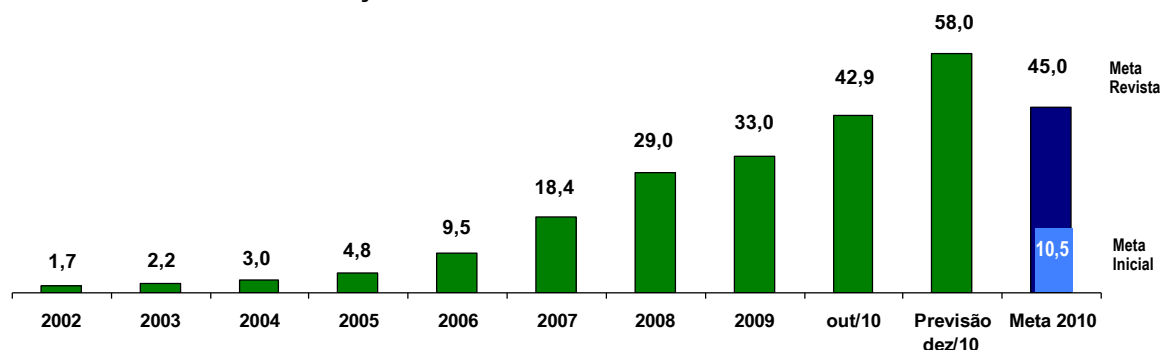

HABITAÇÃO

Evolução das ações significativas

Billings-Guarapiranga – São Paulo/SP
Complexo do Alemão – Rio de Janeiro/RJ
Bacia do Beberibe – Olinda, Camaragibe e Recife/PE
Ribeirão Arrudas – Contagem e Belo Horizonte/MG
Rocinha 1ª e 2ª etapas – Rio de Janeiro/RJ
Heliópolis – São Paulo/SP
Pedreira Prado Lopes e Aglomerado Morro das Pedras – Belo Horizonte/MG
Vila São José – Belo Horizonte/MG
Colônia Juliano Moreira – Rio de Janeiro/RJ



Bacia do Maranguapinho – Fortaleza e Maracanaú/CE



Paraisópolis – São Paulo/SP
Conjunto Habitacional Bairro Santa Maria Codipi – Teresina/PI



Margem Esquerda do Rio Anil – São Luís/MA
Via Mangue – Recife/PE
Vila do Mar – Fortaleza/CE
Nossa Senhora da Apresentação – Natal/RN
Guarituba – Piraquara/PR



Vale do Reginaldo – Maceió/AL
Arroio Cadena e Vacacai-Mirim – Santa Maria/RS
Maciço do Morro da Cruz – Florianópolis/SC
Vila da Barca 3ª etapa – Belém/PA



Falha Geológica 1ª e 2ª etapas – Salvador/BA
Vilas Dique e Nazaré – Porto Alegre/RS
Estrutural Terracap – Brasília/DF



BILLINGS-GUARAPIRANGA – SÃO PAULO/SP



Parque Linear – Cantinho do Céu

DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada de Favelas nas Represas Billings e Guarapiranga, em 45 áreas, com recuperação ambiental dos mananciais. Implantação de sistema de esgotamento sanitário elevatórias e coletores-tronco. Construção de 5.340 habitações e melhorias em 44.343 unidades habitacionais – UH

UF: SP

META: 44,9 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 873,8 milhões

OGU: R\$ 743,2 milhões

Financiamento: R\$ 130,6 milhões

EXECUTORES: Governo do Estado de São Paulo – CDHU, SABESP e Prefeitura de São Paulo

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

➤ 46% de execução global

OGU

➤ 54% realizados – obras de urbanização em 32 áreas de intervenção e construção de 407 UH no núcleo Mata Virgem

FINANCIAMENTO

➤ Entrega dos projetos das áreas de Capão Redondo D em 29/10/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

➤ 49% de execução global

OGU

➤ 57% realizados

BILLINGS-GUARAPIRANGA – SÃO PAULO/SP

PROVIDÊNCIAS

- 55% de execução global até 30/04/2011

OGU

- 64% realizados até 30/04/2011

FINANCIAMENTO

- 5% realizados até 30/04/2011
- Entrega dos projetos da área Parelheiros D – 152 UH até 17/12/2010
- Entrega dos projetos das áreas de Capão Redondo E e I até 30/12/2010
- Início das obras do empreendimento Cidade do Ademar C em 01/02/2011
- Entrega dos projetos das áreas de Grajaú B – 520 UH até 15/02/2011



Conclusão – 30/03/2013

COMPLEXO DO ALEMÃO – RIO DE JANEIRO/RJ



Unidades habitacionais e Escola de Ensino Médio da Poesi

DESCRIÇÃO: Integração física e social de diversas comunidades por meio da ordenação urbanística do Complexo do Alemão, com obras de urbanização integrada, produção e melhorias habitacionais, implantação de teleférico integrado à malha de transportes urbanos e construção de equipamentos comunitários

UF: RJ

META: 30 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 832,9 milhões – OGU

EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeitura do Rio de Janeiro

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 76% de execução global
- 728 unidades habitacionais concluídas

Prefeitura

- 85% realizados – sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, pavimentação, sistema de drenagem, iluminação pública, equipamentos comunitários – Clínica da Família, Espaço de Desenvolvimento Infantil, praças e obras de contenção nas favelas Nova Brasília e Joaquim de Queiroz
- Conclusão da quadra de esportes do bairro Nova Brasília em 31/08/2010

Estado

- 75% realizados – drenagem, infraestrutura e instalações prediais das estações teleféricas do Morro do Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Fazendinha, construção de unidades habitacionais, Centro de Integração e Atenção à Saúde
- Conclusão e inauguração da Escola de Ensino Médio da Poesi, de 32 UH no Morro do Adeus e de 352 UH na Poesi em 24/06/2010

| Executor | Investimento R\$ milhões |
|------------|-----------------------------|
| Estado | 725,3 |
| Prefeitura | 107,6 |

COMPLEXO DO ALEMÃO – RIO DE JANEIRO/RJ

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 86% de execução global

Prefeitura

- 95% realizados

Estado

- 85% realizados
- Conclusão das obras civis e de montagem das estações do teleférico de Bonsucesso, Estação do Adeus, da Estação Baiana, Estação do Alemão, Estação do Itararé, Estação Fazendinha, biblioteca pública, Posto de Orientação Urbanística e Social – POUSO, Centro de Serviços e Centro de Referência da Juventude até 24/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- 94% de execução global até 30/04/2011

Prefeitura

- 99% realizados até 30/04/2011

Estado

- 93% realizados até 30/04/2011
- Entrega do sistema de transporte teleférico para uso público até 28/02/2011



Conclusão – 30/09/2011

BACIA DO BEBERIBE – OLINDA, CAMARAGIBE E RECIFE/PE



Construção de 400 UH em Camaragibe

DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada da Bacia do rio Beberibe com remoção de palafitas e construção de 5.070 unidades habitacionais – UH

UF: PE

META: 46,2 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 527,0 milhões

OGU: R\$ 463,8 milhões

Financiamento: R\$ 63,2 milhões

EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeituras de Recife e Olinda

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 17% de execução global
- 312 unidades habitacionais concluídas

Estado

- 15% de execução
- 37% realizados na UE 13 – Peixinhos – abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem, e produção habitacional
- 58% realizados em Camaragibe – construção de 200 UH no bairro Novo Redentor e obras de infraestrutura
- 34% realizados na UE 15 – Caixa D'Água – contenção de encostas, pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água nos bairros Caixa D'Água, Cajazeira e Bananeira e demolição das casas existentes na área de reassentamento
- 6% realizados na UE 17 – Passarinho – contenção, rede de água e estabilização de encostas
- 16% realizados na UE 23 – Campo Grande – melhorias habitacionais, drenagem, esgotamento sanitário em várias ruas e construção de 152 UH
- Publicação do edital de licitação das obras das UE 11 e 12 em 25/04/2010

Prefeitura de Recife

- 7% realizados – obras de esgotamento sanitário nas UE 03 – Dois Unidos; UE 04 – Dois Unidos e Linha do Tiro; UE 08 – Nova Descoberta; UE 17 – Vasco da Gama e Alto José Bonifácio; UE 19 – Fundão, Beberibe, Porto da Madeira; UE 20 e 21 – Campina do Barreto, Água Fria, Fundão e Arruda
- Início da construção de 26 UH no bairro do Beberibe em 03/08/2010

| Executor | Investimento R\$ milhões |
|----------|-----------------------------|
| Estado | 275,8 |
| Recife | 152,0 |
| Olinda | 99,2 |

BACIA DO BEBERIBE – OLINDA, CAMARAGIBE E RECIFE/PE

Prefeitura de Olinda

- 50% realizados: UE 6 e 8 – Jardim Brasil e na UE 9 – Ilha do Maruim – serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, elaboração de projetos e macrodrenagem no Jardim Brasil

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 23% de execução global

Estado

- 20% realizados

Prefeitura de Recife

- 10% realizados

Prefeitura de Olinda

- 55% realizados

- Aprovação dos projetos de infraestrutura e construção habitacional da Comunidade Pipoqueira pelos órgãos competentes até 15/12/2010

| Municípios | Conclusão |
|------------|------------|
| Camaragibe | 30/01/2011 |
| Recife | 30/10/2012 |
| Olinda | 30/10/2012 |

PROVIDÊNCIAS

Estado

- 30% realizados até 30/04/2011
- Início da obra de desassoreamento e revitalização da seção estuarina do Rio Beberibe até 04/01/2011
- Publicação do decreto de desapropriação para ampliação da área de construção das UH da UE 15 – Caixa D'Água até 05/01/2011
- Complementação do projeto de engenharia das UE 11 e 12 – Azeitona e Peixinhos até 07/01/2011
- Aprovação da reprogramação de projeto da UE 17 – Passarinho até 30/01/2011

Prefeitura de Recife

- 20% realizados até 30/04/2011
- Republicação da licitação para construção da Refinaria Multicultural até 14/01/2011

Prefeitura de Olinda

- 70% realizados até 30/04/2011
- Início das obras de infraestrutura da Comunidade Pipoqueira até 10/01/2011
- Início da construção de 262 UH da Comunidade Pipoqueira até 28/01/2011
- Início da construção das UH da UE 15 – Caixa d'Água até 28/01/2011



RIBEIRÃO ARRUDAS – CONTAGEM E BELO HORIZONTE/MG



Unidades habitacionais – Bloco 2

DESCRIÇÃO: Requalificação urbana e ambiental do trecho de fundo de vale do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte e Contagem, com construção ou aquisição de 957 unidades habitacionais – UH

UF: MG

META: 16,6 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 274 milhões* – OGU

EXECUTORES: Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeituras de Contagem e Belo Horizonte

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 50%* de execução – desapropriações, indenização de benfeitorias, obras de infraestrutura urbana, contenções, galerias pluviais, construção de UH e obras de arte especiais
- Entrega de 208 UH em 08/09/2010
- 368 unidades habitacionais concluídas

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 55% realizados

PROVIDÊNCIAS

- 75% realizados até 30/04/2011
- Publicação dos editais de licitação da regularização fundiária e sinalização viária, centro comunitário, centro de saúde, escola infantil, parque linear e centro comercial até 31/01/2011
- Entrega de 32 UH em 31/01/2011
- Entrega de 96 UH em 31/03/2011



Conclusão – 30/06/2012

*Considera aumento no valor de investimento

HELIÓPOLIS – SÃO PAULO/SP



Provisão de 440 UH – Gleba K1

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada da favela de Heliópolis com produção de 1.427 unidades habitacionais – UH, consolidação geotécnica e recuperação ambiental

UF: SP META: 15,6 mil famílias beneficiadas
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 203 milhões – OGU
 EXECUTOR: Prefeitura de São Paulo

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 47% realizados – obras de urbanização e produção de 861 unidades habitacionais na 1ª etapa da Gleba K

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 50% realizados
- Início das obras da 2ª etapa da Gleba G em 15/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- 60% realizados até 30/04/2011
- Aprovação do projeto da 1ª e da 2ª etapas Gleba K no Parsolo e obtenção do novo protocolo do Graprohhab até 07/01/2011
- Início das obras da 2ª etapa da Gleba K em 30/1/2011
- Previsão de entrega das 861 UH da 1ª etapa da Gleba K até 30/3/2011



Conclusão – 30/12/2012

PEDREIRA PRADO LOPES E AGLOMERADO MORRO DAS PEDRAS - BELO HORIZONTE/MG



Produção de 72 UH - Pedreira Prado Lopes

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada da favela Pedreira Prado Lopes e do Aglomerado Morro das Pedras, com construção ou aquisição de 1.117 unidades habitacionais – UH

UF: MG META: 7 mil famílias beneficiadas
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 162,3 milhões - Financiamento
 EMPREENDEDOR: Prefeitura de Belo Horizonte

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 62% realizados – produção de UH, drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação, urbanização, desapropriações, equipamentos comunitários e trabalho social

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 67% realizados
- Pedreira Prado Lopes – 61% realizados
 Conclusão de 72 UH até 31/12/2010
- Morro das Pedras – 69% realizados
 Conclusão de 152 UH até 31/12/2010

| Intervenção | Conclusão |
|----------------------|------------|
| Pedreira Prado Lopes | 28/02/2012 |
| Morro das Pedras | 30/06/2012 |

PROVIDÊNCIAS

- 80% realizados até 30/04/2011
- Previsão de homologação da licitação de obras complementares de infraestrutura até 15/12/2010
- Entrega de 200 UH até 30/03/2011



VILA SÃO JOSÉ – BELO HORIZONTE/MG



Produção de UH - Blocos 62 e 63

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada com construção de 1.616 unidades habitacionais – UH para reassentamento de famílias residentes em áreas sujeitas a inundações, recuperação ambiental de fundo de vale e implantação de sistemas de esgotamento sanitário

UF: MG META: 12,5 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007- 2010: R\$ 154,7 milhões
EMPREENDEDOR: Prefeitura de Belo Horizonte

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 49% realizados – construção de UH, drenagem, pavimentação, urbanização, desapropriações, recuperação ambiental e trabalho social
- Entrega dos projetos da obra complementar em 30/09/2010
- 1.040 unidades habitacionais concluídas

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 55% realizados
- Conclusão de 192 UH até 12/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- 70% realizados até 30/4/2011
- Conclusão de 144 UH até 30/01/2011

Conclusão – 31/12/2011



COLÔNIA JULIANO MOREIRA – RIO DE JANEIRO/RJ



Retificação do canal Entre Rios

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada das favelas existentes na Colônia Juliano Moreira, além da construção de vila para idosos, restauração do conjunto histórico do aqueduto e implantação do museu com acervo do Bispo do Rosário

UF: RJ META: 6,2 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 100,8 Milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura do Rio de Janeiro

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 24% realizados
- Início das obras da Creche Ulisses Vianna em 01/10/2010
- Publicação do edital de licitação para construção de 160 unidades habitacionais, equipamentos comunitários e infraestrutura na área 2A em 08/10/2010
- Conclusão da infraestrutura, urbanização e iluminação pública de 70 lotes no Grupo Esperança em 30/10/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 32% realizados
- Conclusão das obras de canalização dos rios Areal e Engenho Novo até 30/12/2010

Conclusão – 30/12/2011

PROVIDÊNCIAS

- 59% realizados até 30/04/2011
- Início da construção de 160 unidades habitacionais, equipamentos comunitários e infraestrutura na área 2A em 01/02/2011
- Início da construção da Vila dos Idosos até 01/02/2011



BACIA DO MARANGUAPINHO FORTALEZA E MARACANAÚ/CE



Conjunto Habitacional Oscar Araripe

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada da bacia do rio Maranguapinho, com remoção de moradias localizadas em áreas de risco de alagamento, construção de 6.543 unidades habitacionais - UH, dragagem do rio, construção de barragem de contenção de cheias e drenagem urbana

UF: CE

META: 24,2 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 403,4 Milhões - OGU

EXECUTOR: Governo do Estado do Ceará

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 10% de execução global
- 336 unidades habitacionais concluídas

Empreendimentos Habitacionais

- 75% das obras na área do Residencial Leonel Brizola – Antigo Patativa do Assaré
- Conclusão das análises da documentação jurídica dos residenciais Granja Lisboa I e II – Antigo, Residencial Novo Oscar Araripe em 31/08/2010

Barragem de contenção do rio Maranguapinho

- 47% realizados - estrada de acesso, canteiro, escavação da fundação e das estruturas de concreto

Dragagem do rio Maranguapinho

- 3% realizados

Urbanização das margens do rio Maranguapinho

- 2% realizados
- Conclusão da análise da licitação e início das obras em 28/9/2010

BACIA DO MARANGUAPINHO FORTALEZA E MARACANAÚ/CE

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 16% de execução global

FORTALEZA

- 20% realizados

Empreendimentos Habitacionais

- Conclusão do Residencial Leonel Brizola – Antigo Patativa do Assaré até 30/12/2010
- Início das obras dos residenciais Raquel de Queiroz, Juraci Magalhães – antigo Jardim Fluminense e Miguel Arraes até 17/12/2010

MARACANAÚ

- 30% realizados

Barragem de Contenção do rio Maranguapinho - 58% realizados

Dragagem do rio Maranguapinho - 17% realizados

Urbanização das margens do rio Maranguapinho - 8% realizados

| Municípios | Conclusão |
|------------|------------|
| Fortaleza | 30/12/2011 |
| Maracanaú | 12/11/2011 |

PROVIDÊNCIAS

Empreendimentos Habitacionais

- Homologação da licitação do Residencial Novo Ancuri até 05/01/2011
- Homologação da licitação do Residencial Eleazar de Carvalho até 07/01/2011
- Homologação da licitação do Residencial Pajuçara até 07/01/2011
- Análise da documentação sobre as pendências de engenharia e início das obras do residencial Maranguape até 07/01/2011
- Início das obras do Residencial Santo Sátiro e do Residencial Novo Urucutuba até 30/01/2011
- Conclusão do residencial Blanchard Girão até 30/03/2011

Barragem de contenção do rio Maranguapinho - 70% realizados até 30/04/2011

Dragagem do rio Maranguapinho - 25% realizados até 30/04/2011

Urbanização das margens do rio Maranguapinho - 15% realizados até 30/04/2011



PARAISÓPOLIS – SÃO PAULO/SP



Conjuntos Habitacionais - Paraisópolis

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada da favela de Paraisópolis com produção de 2.544 unidades habitacionais - UH, construção de equipamentos comunitários, obras de contenção e recuperação ambiental

UF: SP META: 22,5 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 318,8 milhões – OGU
EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 50% de execução global
- 660 unidades habitacionais concluídas

Prefeitura

- 66% realizados – construção e recuperação de unidades habitacionais, pavimentação e obras viárias, drenagem pluvial, estabilização e contenção de solo – Núcleos Antonico, Centro/Brejo, Grotinho e Grotão, construção de creche, unidade básica de saúde e unidade de assistência médica ambulatorial
- Entrega de 96 UH no Condomínio A em 30/07/2010
- Entrega de 200 UH no Condomínio B e 78 UH no Condomínio C em 31/08/2010
- Entrega do centro educacional infantil em 31/08/2010
- Entrega da documentação técnica referente aos Condomínios I e J – 207 UH em 10/09/2010

Estado

- 8% realizados – construção de 512 UH nos empreendimentos Vila Andrade B, C, D, G e Campo Limpo G2

| Executor | Investimento R\$ milhões |
|------------|-----------------------------|
| Prefeitura | 238,3 |
| Estado | 80,5 |

PARAISÓPOLIS – SÃO PAULO/SP

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 55% de execução global

Prefeitura

- 70% realizados
- Entrega de 123 UH no Condomínio D e 56 UH no Condomínio C até 15/01/2011
- Entrega de Unidade de Assistência Médica Ambulatorial, 6 Unidades Comerciais, Unidade Básica de Saúde e de Centro Psicossocial até 15/01/2011

Estado

- 8% realizados

RESTRIÇÃO

- Morosidade da aprovação dos projetos junto à prefeitura

PROVIDÊNCIAS

Prefeitura

- 91% realizados até 30/04/2011

Estado

- 10% realizados até 30/04/2011
- Início de obras do Campo Limpo L5-L9-L10 até 03/01/2011
- Início das obras do empreendimento Vila Andrade I até 07/01/2011
- Entrega dos projetos, da licitação e do licenciamento ambiental dos empreendimentos Vila Andrade E – 166 UH, Campo Limpo L6 e L7 – 110 UH e Campo Limpo N – 152 UH – até 07/01/2011



Conclusão – 30/06/2012

CONJUNTO HABITACIONAL JACINTA ANDRADE BAIRRO STA. MARIA CODIPI – TERESINA/PI



Construção de unidades habitacionais

DESCRIÇÃO: Construção de 4.300 unidades habitacionais no conjunto habitacional Jacinta Andrade, no bairro Santa Maria da Codipi, com implantação de rede de abastecimento de água, energia elétrica e iluminação pública e sistema viário

UF: PI META: 4,3 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 112 milhões – Financiamento
EXECUTOR: Governo do Estado do Piauí

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 55% realizados – terraplanagem, construção das unidades habitacionais, infraestrutura e urbanização dos lotes
- 126 unidades habitacionais concluídas
- Assinatura do contrato com as segundas colocadas na licitação e retomada das obras da construção de 586 UH em 08/11/2010
- Início da construção de outras 796 UH em 08/11/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 65% realizados
- Conclusão de 1.500 UH até 30/12/2010

RESTRIÇÃO

- Desistência de duas construtoras responsáveis pela construção de 586 UH

PROVIDÊNCIAS

- 72% realizados até 30/04/2011
- Entrega do restante dos projetos da infraestrutura complementar, equipamento e pavimentação das avenidas principais até 13/12/2010
- Lançamento de edital de licitação para construção de 301 UH até 30/12/2010



Conclusão – 30/12/2011

MARGEM ESQUERDA DO RIO ANIL – SÃO LUÍS/MA



Produção de Unidades Habitacionais

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada na margem esquerda do rio Anil, nos bairros Cambaia, Liberdade, Fé em Deus, Irmãos Coragem, Apeadouro, Alemanha, Caratatiua, Vila Palmeira, Barreto, Radional, Santa Cruz e Vila Sésamo, com remanejamento de habitações precárias situadas em áreas de risco, melhorias habitacionais e implantação da Via de Contorno

UF: MA META: 13 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 313,1 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado do Maranhão

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 40% realizados – 224 UH no Conjunto Habitacional CEFET, 320 UH no Conjunto Habitacional Abdala - Fé em Deus - melhorias habitacionais, aterro hidráulico, obra viária, indenizações de benfeitorias e trabalho social
- 288 UH concluídas no Conjunto Habitacional Cambaia
- Conclusão da licitação do equipamento comunitário Canal da Fé em Deus em 16/06/2010
- Conclusão da reformulação do projeto do sistema viário em 12/11/2010
- Aprovada a revisão do projeto viário em 04/10/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- 48% realizados

RESTRIÇÃO

- Atraso devido à necessidade de remoção de 800 famílias para abertura de frente de obra

MARGEM ESQUERDA DO RIO ANIL – SÃO LUÍS/MA

PROVIDÊNCIAS

- 60% de execução até 30/04/2011
- Publicação de nova licitação para 600 melhorias habitacionais nos bairros Fé em Deus, Liberdade, Barreto, Vila Palmeira e Radional até 13/12/2010
- Publicação de edital de licitação do trabalho social até 07/01/2011
- Início da entrega de títulos de regularização fundiária até 07/01/2011
- Conclusão do conjunto habitacional CEFET – 224 UH até 07/01/2011
- Publicação do edital de licitação de 2.689 melhorias habitacionais em Alemanha, Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Irmãos Coragem até 14/03/2011
- Conclusão da licitação do conjunto habitacional Diamante – 128 UH até 31/03/2011
- Definição da desapropriação litigiosa que impossibilitou a publicação do edital de licitação do Conjunto Habitacional Alemanha



Conclusão – 30/06/2012

VIA MANGUE – RECIFE/PE



Construção de unidades habitacionais

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada, saneamento ambiental e construção de moradias para as comunidades Bode, Encanta Moça, Jardim Beira Rio, Pantanal, Paraíso e Xuxa, aliados a investimentos em mobilidade urbana

UF: PE META: 15,4 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2012: R\$ 121,6 milhões
OGU: R\$ 47,3 milhões
Financiamento: R\$ 74,3 milhões

EXECUTOR: Prefeitura de Recife

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 15% de execução global
 - 352 unidades habitacionais concluídas
- OGU - 37% realizados – produção de unidades habitacionais e infraestrutura
- Documentação complementar de engenharia e titularidade para construção de 640 UH em 15/10/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 19% de execução global
- OGU - 50% realizados

Conclusão – 30/11/2012

RESTRIÇÃO

- Início da obra de financiamento depende da solução de esgotamento da ETE Cabanga, cuja comprovação de titularidade da área das duas estações elevatórias ainda não foi concretizada

PROVIDÊNCIAS

OGU

- 65% realizados até 30/04/2011
- Autorização de início da obra de produção de 640 UH até 13/12/2010

FINANCIAMENTO

- Entrega do projeto básico do emissário de esgoto e da estação elevatória até 07/01/2011
- Comprovação da titularidade da área para implantação das 2 estações elevatórias até 10/01/2011
- Apresentação do projeto básico de readequação da ETE Cabanga ao agente financeiro até 28/02/2011
- Início das obras das redes de água e esgoto até 15/03/2011



VILA DO MAR – FORTALEZA/CE



Produção de 264 UH no terreno 1

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada e melhorias habitacionais da Vila do Mar, com reassentamento das famílias que vivem em área de risco

UF: CE META: 4,4 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 113,5 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Fortaleza

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 17% realizados – terraplanagem da área de reassentamento do Terreno 3, construção de unidades habitacionais no Terreno 1 e pagamento de desapropriações dos terrenos 1, 2, 3 e 4
- Urbanização da orla – Aprovação da reprogramação de projeto e da licitação em 09/06/2010
- Aprovação dos projetos da operação complementar em 06/08/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- 25% realizados

RESTRIÇÃO

- Morosidade no andamento da obra devido à desistência de duas construtoras responsáveis pelas obras dos terrenos 2 e 4

PROVIDÊNCIAS

- 40% realizados até 30/04/2011
- Entrega de 264 unidades habitacionais no Terreno 1 até 30/01/2011
- Terrenos 2 e 4 – homologação da nova licitação em função da rescisão do contrato com a construtora até 26/02/2011
- Início das obras da operação complementar até 07/01/2011

Conclusão – 30/12/2011



NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – NATAL/RN



Urbanização da Lagoa José Sarney

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada no bairro Nossa Senhora da Apresentação, envolvendo esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação e regularização fundiária

UF: RN META: 22 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 114,4 milhões*
OGU: R\$ 62,9 milhões*
Financiamento: R\$ 48,5 milhões
EXECUTOR: Prefeitura de Natal

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 79% de execução global
- 32 unidades habitacionais concluídas

OGU

- 76% realizados – galeria de interligação da Lagoa Jardim Primavera e Monte Sinai, pavimentação nos bairros Jardim Primavera, Vale Dourado, Parque dos Coqueiros e Jardim Progresso, unidades habitacionais, escola fundamental e centro de educação infantil no Loteamento José Sarney

FINANCIAMENTO

- 83% realizados – pavimentação, construção da galeria entre a Lagoa J. Sarney e galeria existente, ampliação e urbanização das lagoas José Sarney e Soledade, construção da galeria e seção retangular entre a rua Monte Sinai e Lagoa da Aliança e plano diretor de drenagem

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 83% de execução global

OGU

- 80% realizados

FINANCIAMENTO

- 85% realizados

* Previsto em 31/12/2010

NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – NATAL/RN

RESTRIÇÃO

- Demora na apresentação da reprogramação do projeto

PROVIDÊNCIAS

OGU

- 90% realizados até 30/04/2011
- Aprovação da reprogramação do contrato até 15/12/2010
- Conclusão do termo de referência para a licitação da regularização fundiária até 05/01/2011
- Levantamento cadastral das ligações domiciliares dos serviços de saneamento até 07/01/2011

FINANCIAMENTO

- 90% realizados até 30/04/2011
- Aprovação da reprogramação do contrato até 30/12/2010
- Conclusão da obra da ampliação e urbanização da Lagoa José Sarney até 30/01/2011



Conclusão – 01/06/2011

GUARITUBA – PIRAQUARA/PR



Produção de UH na área de reassentamento

DESCRIÇÃO: Urbanização da favela Guarituba, com produção de 803 unidades habitacionais - UH para reassentamento de famílias que vivem em áreas de risco ou de preservação ambiental, regularização fundiária, pavimentação, drenagem e recuperação ambiental

UF: PR META: 8,9 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 98 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado do Paraná

RESULTADO ATÉ 31/10/2010

- 15% realizados – desapropriação de terrenos, drenagem pluvial, pavimentação das vias estruturantes, rebaixamento do lençol freático, terraplenagem e produção de 581 UH da área de reassentamento 1

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 20% realizados
- Início das obras de pavimentação e drenagem até 15/12/2010

RESTRIÇÃO

- Readequação do projeto em função da necessidade de ampliação da meta original do contrato

PROVIDÊNCIAS

- 30% realizados até 30/04/2011
- Início da construção de mais 109 UH na área de reassentamento 1 até 31/01/2011
- Publicação de edital de licitação para recuperação ambiental até 30/05/2011



Conclusão – 09/08/2012

VALE DO REGINALDO – MACEIÓ/AL



Unidades Habitacionais – Área 01

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada do Vale do Reginaldo com remoção de palafitas e de moradias localizadas nas áreas de risco de alagamento e construção de 1.512 novas unidades habitacionais – UH

UF: AL **META:** 7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 134,2 milhões – OGU
EXECUTORES: Governo do Estado de Alagoas e Prefeitura de Maceió

| Executor | Investimento R\$ milhões |
|------------|-----------------------------|
| Prefeitura | 60,5 |
| Estado | 73,7 |

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 10% de execução global

Estado

- 19% realizados - construção de UH e serviços de infraestrutura nas áreas 01, 02 e 07 e construção de equipamentos comunitários e serviços de infraestrutura na Área 05
- Entrega de 180 unidades habitacionais na Área 01 em 21/06/2010
- Obtenção da imissão na posse de 75 terrenos em 31/08/2010

Prefeitura

- 3% realizados – serviços preliminares, sondagens, sinalização, escavação e fornecimento de materiais

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 13% de execução global

Estado

- 21% realizados

Prefeitura

- 3% realizados

VALE DO REGINALDO – MACEIÓ/AL

RESTRIÇÃO

- Atraso devido à demora da entrega de projeto executivo e à necessidade de remoção de muitas famílias para abertura de frentes de obra

PROVIDÊNCIAS

- 23% de execução global até 30/04/2011

Estado

- 30% realizados até 30/04/2011
- Aprovação das reprogramações das áreas 01 e 02 até 07/01/2011
- Liberação de áreas para a construção de outras 540 UH até 31/03/2011
- Conclusão de 84 UH na área 02, 72 UH na área 07 e Creche na área 05 até 30/04/2011

Prefeitura

- 17% realizados até 30/04/2011
- Início das obras de infraestrutura na Alça do Pau d'Arco em 20/01/2011
- Aprovação do projeto executivo das demais áreas até 14/01/2011

Conclusão – 30/06/2012



ARROIO CADENA E VACACAÍ-MIRIM – SANTA MARIA/RS



UH no Loteamento Cipriano Rocha

DESCRIÇÃO: Produção de 2.468 unidades habitacionais - UH, melhorias habitacionais, infraestrutura, instalações sanitárias, regularização fundiária, recuperação ambiental e rede de tratamento de esgoto

UF: RS META: 8,4 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 131,7 milhões
 OGU: R\$ 106,7 milhões
 Financiamento: R\$ 25,0 milhões
EXECUTOR: Prefeitura de Santa Maria

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 40% de execução global

OGU

- 41% realizados – pavimentação, redes de esgoto, água e energia elétrica, drenagem e infraestrutura no loteamento PAC 3, macrodrenagem dos trechos 1 e 2 do Arroio Cadena concluídos, rede de esgoto, drenagem pluvial e pavimentação nas Vilas Lídia, Arco-Íris, Esperança, Kennedy, Ecologia, Carolina, Cerro Azul, Loteamento Km 2 e av. João Pessoa
- 468 UH entregues no loteamento Cipriano Rocha

FINANCIAMENTO

- 35% realizados – pavimentação, drenagem pluvial e rede de esgoto nas vilas Oliveira, Vitória, Carolina, Esperança, Santos e Urlândia e ponte da rua General Osório e redes de esgoto das vilas Lorenzi e Renascença

ARROIO CADENA E VACACAÍ-MIRIM – SANTA MARIA/RS

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 42% de execução global

OGU

- 43% realizados

FINANCIAMENTO

- 36% realizados

RESTRIÇÃO

- Atraso no andamento da obra de produção habitacional em função das licitações desertas

PROVIDÊNCIAS

OGU

- 45% realizados até 30/04/2011
- Republicação do edital de licitação das 64 unidades habitacionais no loteamento PAC 1 e de 380 UH no loteamento PAC 3 em 31/01/2011
- Documentação de titularidade da av. Dom Ivo e do loteamento PAC 4 até 31/01/2011
- Publicação do edital de licitação de infraestrutura e 263 unidades habitacionais no loteamento PAC 4 até 17/01/2011

FINANCIAMENTO

- 41% realizados até 30/04/2011
- Obtenção do licenciamento ambiental para as intervenções nos loteamentos Km 3 em 10/12/2010
- Obtenção do licenciamento ambiental para as intervenções nos loteamentos PAC 2 e PAC 6 até 31/03/2011
- Entrega dos projetos dos loteamentos Km 3, PAC 2 até 31/01/2011
- Entrega dos projetos do loteamento PAC 6 em 30/04/2011



Conclusão – 30/12/2011

MACIÇO MORRO DA CRUZ – FLORIANÓPOLIS/SC



Muros de contenção e pavimentação de acessos

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada do Maciço do Morro da Cruz, envolvendo 16 comunidades e reassentamento de 438 famílias em área de risco e melhorias em 414 unidades habitacionais - UH. As obras incluem a implantação de parque, transporte vertical e recuperação ambiental

UF: SC META: 5,7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 70,8 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Florianópolis

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 22% realizados – redes de água e de esgoto, contenção de encostas, drenagem, terraplenagem, pavimentação, infraestrutura viária, indenização de benfeitorias e recuperação ambiental
- Abertura das propostas da licitação dos equipamentos comunitários em 08/10/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- 26% realizados

RESTRIÇÃO

- Ocorreram 4 licitações desertas para a execução de 358 unidades habitacionais

PROVIDÊNCIAS

- 33% realizados até 31/04/2011
- Publicação do edital de licitação do transporte vertical até 15/12/2010
- Publicação de nova licitação, devido à rescisão de contrato por parte da empresa executora dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário até 15/12/2010
- Início das obras das UH horizontais até 30/03/2011

Conclusão – 31/03/2012



VILA DA BARCA – 3ª ETAPA – BELÉM/PA



Unidades habitacionais – Vila da Barca

DESCRIÇÃO: 3ª etapa da urbanização integrada da favela Vila da Barca, com remoção de palafitas e de moradias localizadas nas áreas de risco de alagamento e construção de novas unidades habitacionais – UH

UF: PA META: 5,6 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 51,5 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Belém

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 10% realizados – indenizações e benfeitorias, esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem pluvial e execução de fundações e alvenaria em 20 blocos residenciais de um total de 87 previstos
- Remoção de 92 famílias para abertura de frente de obras em 23/04/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- 12% realizados

RESTRIÇÃO

- Dificuldade na remoção das famílias

PROVIDÊNCIAS

- 18% realizados até 30/04/2011
- Remoção de 143 famílias até 07/01/2011
- Aprovação dos projetos executivos da creche, Feira do Mercado e abastecimento de água até 14/01/2011

Conclusão – 20/12/2012



VILAS DIQUE E NAZARÉ – PORTO ALEGRE/RS



Unidades habitacionais – Vila Dique

DESCRIÇÃO: Aquisição de áreas, obras de infraestrutura e produção de 2.676 unidades habitacionais - UH para reassentamento das favelas Vila Dique e Nazaré, visando permitir ampliação do aeroporto Salgado Filho

UF: RS META: 2,7 mil famílias beneficiadas
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 94,1 milhões*
 OGU: R\$ 60,6 milhões*
 Financiamento: R\$ 33,5 milhões

EXECUTOR: Prefeitura de Porto Alegre

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

➤ 36%* de execução global

FINANCIAMENTO – Vila Nazaré – 15% realizados

➤ Obtenção do licenciamento ambiental prévio da área de reassentamento Senhor do Bonfim na Vila Nazaré em 28/08/2010

➤ Apresentação dos projetos executivos de infraestrutura da área de reassentamento Sr. do Bonfim em 22/10/2010

OGU – Vila Dique 52%* realizados

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

➤ 47% de execução global

FINANCIAMENTO – Vila Nazaré – 15% realizados

OGU – Vila Dique - 65% realizados

| Intervenções | Conclusão |
|--------------|------------|
| Vila Dique | 30/06/2011 |
| Vila Nazaré | 30/09/2012 |

RESTRIÇÃO

➤ Necessidade de revisão dos valores inicialmente previstos para as obras da Vila Nazaré

PROVIDÊNCIAS

OGU – Vila Dique – 80% realizados até 30/04/2011

FINANCIAMENTO – Vila Nazaré

➤ Apresentação da complementação dos projetos de infraestrutura do loteamento Sr. do Bonfim até 13/12/2010

➤ Obtenção de licenciamento ambiental prévio para o loteamento da área de reassentamento Irmãos Marista até 13/12/2010 e apresentação da documentação técnica e dos projetos executivos de infraestrutura do loteamento até 30/12/2010

* Considera aumento no valor do investimento



ESTRUTURAL TERRACAP – BRASÍLIA/DF



Unidades habitacionais na Vila Estrutural

DESCRIÇÃO: Urbanização de favelas da Vila Estrutural, com reassentamento de população residente em área de lixões e áreas de risco

UF: DF META: 9,4 mil famílias beneficiadas
 INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 73,6 milhões – OGU
 EXECUTOR: Governo do Distrito Federal

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

➤ 35% realizados – sistema de esgotamento sanitário, rede e estação elevatória, abastecimento de água e construção de 584 unidades habitacionais - UH, sendo 122 entregues

➤ Aditivo contratual com adequação dos projetos das UH em atendimento à determinação do TCU em 12/08/2010

➤ Início da obra da Escola Infantil 13/09/2010

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

➤ 40% realizados

RESTRIÇÃO

➤ Indefinição da área para construção das 529 UH

Conclusão – 30/12/2011

PROVIDÊNCIAS

➤ 60% realizados até 30/04/2011

➤ Republicação do edital do posto policial, devido à exigência do TCU até 07/01/2011

➤ Republicação do edital de licitação da escola de ensino médio e fundamental, devido à exigência do TCU, até 10/01/2011



SANEAMENTO



RESULTADOS 2007 A 2010

SANEAMENTO

Evolução da contratação dos investimentos


R\$ bilhões

| PAC Saneamento | Previsão 2007-2010 | Selecionado | Contratado até out/2010 | Previsão de contratação até dez/2010 | % contratação em dez/2010 em relação ao previsto |
|---|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Municípios acima de 50 mil hab - OGU e Financiamento ao Setor Público | 26,0 | 31,5 | 29,5 | 29,6 | 114% |
| Municípios abaixo de 50 mil hab - OGU | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 95% |
| Financiamento ao Setor Privado | 10,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 45% |
| TOTAL | 40,0 | 40,0 | 37,8 | 37,9 | 95% |

SANEAMENTO

RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes


Evolução do início das obras pelos Estados e Municípios
91% de obras iniciadas até outubro/2010

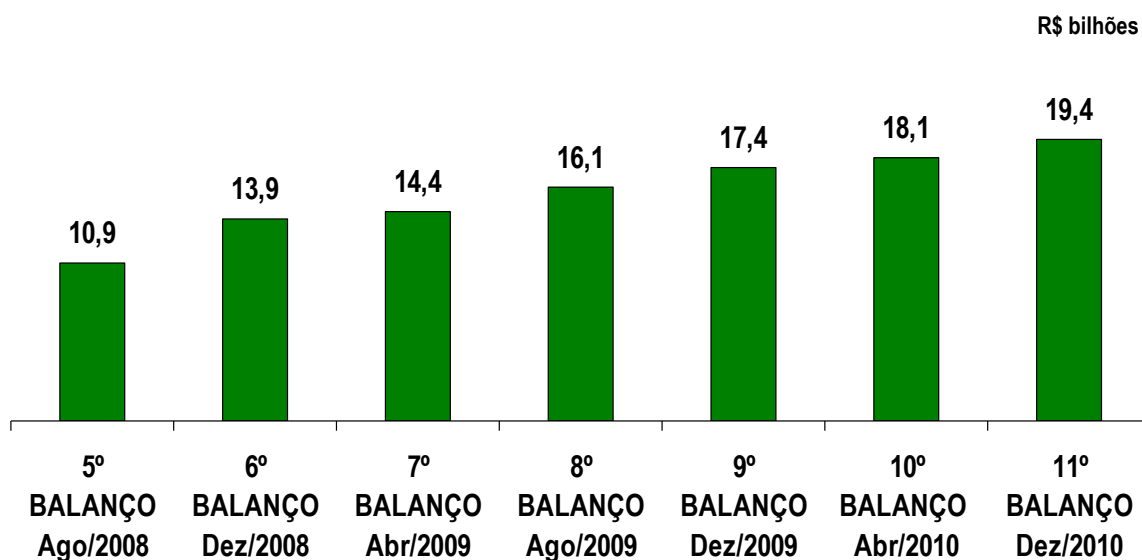

SANEAMENTO

RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU e Financiamento

Evolução do % de execução de Estados e Municípios

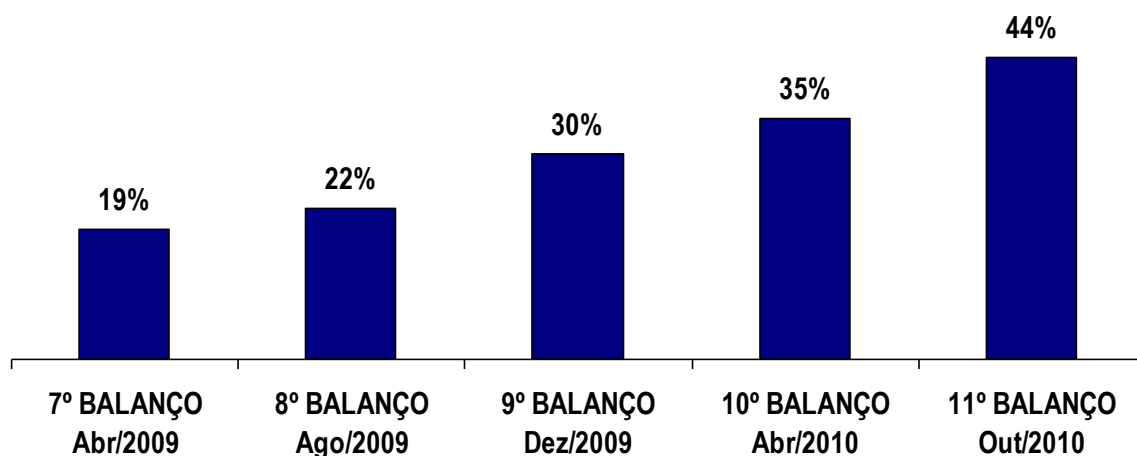


SANEAMENTO


RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU e Financiamento

% de execução por proponente


Estados e Companhias Estaduais

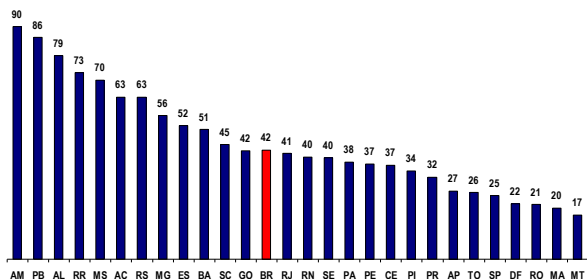

Capitais

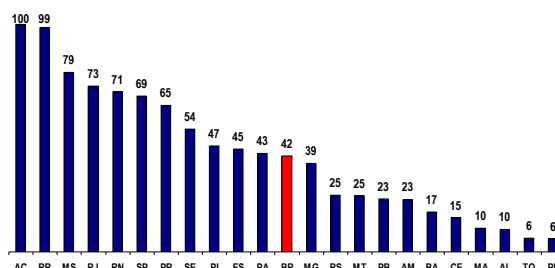

Demais Municípios

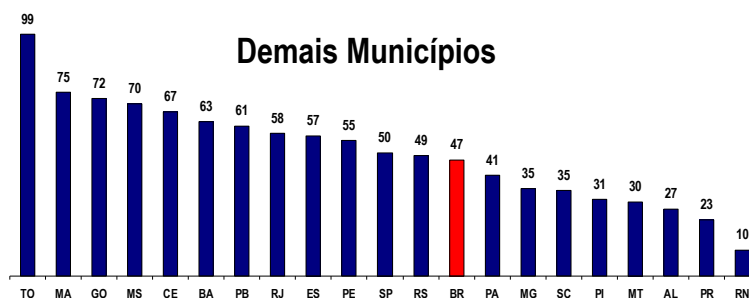


Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO


RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – R\$ 21,2 bilhões

Evolução do estágio de execução das obras contratadas*

Valor de Investimento



Quantidade de Obras

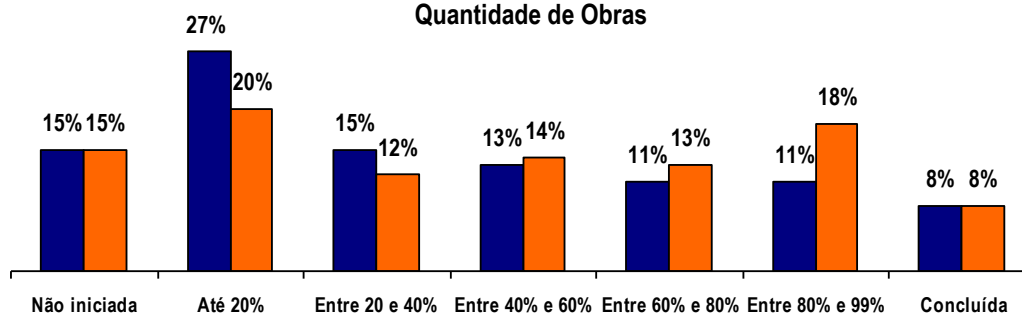

■ Out/2010

■ Previsão dez/2010

* Baseado nas informações de Estados e Municípios

SANEAMENTO

RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU

R\$ bilhões

| SELECIONADO 2007-2008 | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|-----------------------|-------|------------|-------|------------------|
| QTD | VALOR | QTD | TOTAL | |
| 476 | 9,5 | 476 | 9,5 | 100% |

| CONTRATADO | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DO INVESTIMENTO CONTRATADO | VALOR DO REPASSE DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA ESTADOS E MUNICÍPIOS |
| 9,5 | 7,8 | 1,7 |

Estágio dos Projetos Contratados



Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO

RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU

| REGIÃO / UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras | % obras em estágio avançado* |
|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| NORTE | 1.013,0 | 79 | 6 |
| AC | 206,3 | 100 | 0 |
| AP | 123,2 | 88 | 0 |
| PA | 277,1 | 100 | 0 |
| RO | 331,4 | 41 | 0 |
| RR | 60,3 | 100 | 100 |
| TO | 14,7 | 100 | 2 |
| NORDESTE | 3.154,4 | 92 | 8 |
| AL | 162,7 | 100 | 22 |
| BA | 819,1 | 99 | 4 |
| CE | 360,0 | 96 | 3 |
| MA | 284,1 | 93 | 20 |
| PB | 276,0 | 97 | 3 |
| PE | 622,3 | 85 | 2 |
| PI | 220,9 | 72 | 0 |
| RN | 185,3 | 69 | 1 |
| SE | 224,0 | 100 | 38 |
| SUDESTE | 3.716,1 | 96 | 9 |
| ES | 107,0 | 100 | 27 |
| MG | 272,7 | 94 | 5 |
| RJ | 1.918,1 | 96 | 10 |
| SP | 1.418,3 | 95 | 7 |
| SUL | 589,3 | 97 | 0 |
| PR | 111,0 | 99 | 0 |
| RS | 375,1 | 96 | 0 |
| SC | 103,2 | 99 | 0 |
| CENTRO-OESTE | 985,4 | 97 | 10 |
| DF | 3,9 | 0 | 0 |
| GO | 460,1 | 98 | 10 |
| MS | 206,1 | 100 | 24 |
| MT | 315,3 | 97 | 0 |
| TOTAL BRASIL | 9.458,2 | 93 | 8,0 |

* Acima de 80% de execução ou concluídas

Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO


RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – Financiamento

R\$ bilhões

| SELECIONADO 2007-2008 | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|-----------------------|-------|------------|-------|------------------|
| QTD | VALOR | QTD | Total | |
| 745 | 11,8 | 744 | 11,79 | 99,8% |

| CONTRATADO | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DO INVESTIMENTO CONTRATADO | VALOR DO REPASSE DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA ESTADOS E MUNICÍPIOS |
| 11,8 | 9,1 | 2,7 |

Estágio dos Projetos Contratados

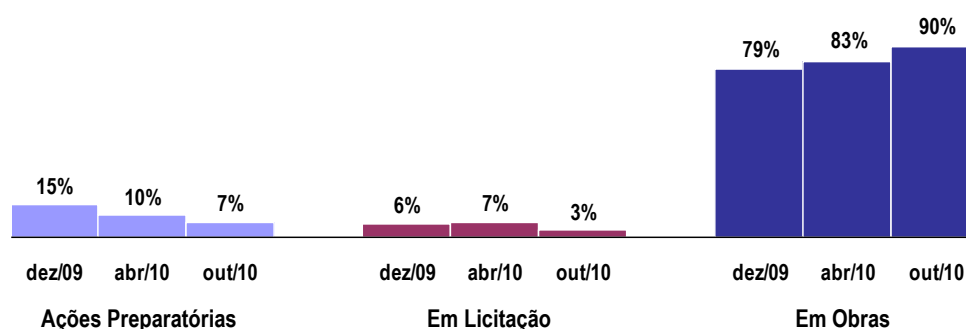

* Não inclui operações de mercado

Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO

RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – Financiamento

| REGIÃO / UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras | % obras com estágio avançado* |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| NORTE | 1.431,1 | 90 | 33 |
| AC | 107,6 | 100 | 37 |
| AM | 543,6 | 85 | 63 |
| PA | 415,0 | 84 | 7 |
| RO | 117,2 | 100 | 0 |
| RR | 191,9 | 100 | 31 |
| TO | 55,8 | 100 | 0 |
| NORDESTE | 1.347,9 | 95 | 22 |
| BA | 229,5 | 100 | 21 |
| CE | 123,1 | 100 | 0 |
| PE | 443,1 | 85 | 30 |
| PI | 64,2 | 100 | 0 |
| RN | 373,0 | 100 | 32 |
| SE | 115,0 | 100 | 0 |
| SUDESTE | 6.076,8 | 87 | 30 |
| ES | 388,4 | 100 | 11 |
| MG | 1.609,5 | 98 | 45 |
| RJ | 664,2 | 11 | 2 |
| SP | 3.414,7 | 95 | 31 |
| SUL | 2.271,2 | 97 | 10 |
| PR | 834,4 | 98 | 7 |
| RS | 1.057,5 | 99 | 9 |
| SC | 379,3 | 89 | 24 |
| CENTRO-OESTE | 667,8 | 77 | 10 |
| DF | 426,8 | 76 | 2 |
| GO | 29,0 | 100 | 0 |
| MS | 68,1 | 100 | 47 |
| MT | 143,9 | 64 | 17 |
| TOTAL BRASIL | 11.794,8 | 90 | 25 |

* Acima de 80% de execução ou concluídas

Data de Referência: out/2010


SANEAMENTO

Municípios entre 50 e 150 mil habitantes – OGU

R\$ milhões

| SELECIONADO 2007-2008 | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|-----------------------|---------|------------|---------|------------------|
| QTD | VALOR | QTD | Total | |
| 130 | 1.007,1 | 130 | 1.007,1 | 100% |

| CONTRATADO | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DO INVESTIMENTO CONTRATADO | VALOR DO REPASSE DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA ESTADOS E MUNICÍPIOS |
| 1.007,1 | 877,8 | 129,3 |

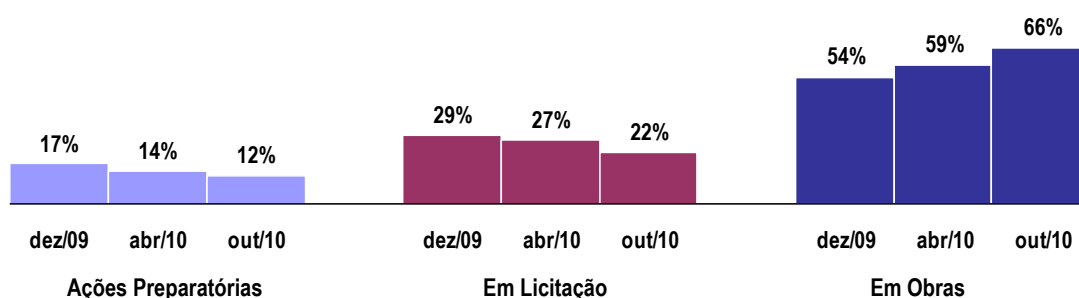

Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO

Municípios entre 50 e 150 mil habitantes – OGU

| REGIÃO / UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras | % obras com estágio avançado* |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| NORTE | 151,4 | 72 | 12 |
| AC | 7,0 | 100 | 0 |
| AM | 23,3 | 72 | 31 |
| AP | 10,5 | 0 | 0 |
| PA | 82,3 | 69 | 0 |
| RO | 28,2 | 100 | 39 |
| NORDESTE | 653,3 | 66 | 18 |
| AL | 18,4 | 78 | 27 |
| BA | 231,3 | 88 | 20 |
| CE | 192,2 | 55 | 25 |
| MA | 70,2 | 37 | 11 |
| PB | 23,2 | 100 | 0 |
| PE | 72,3 | 18 | 0 |
| PI | 18,6 | 100 | 0 |
| RN | 2,0 | 0 | 0 |
| SE | 25,1 | 100 | 34 |
| SUDESTE | 78,6 | 44 | 3 |
| MG | 45,8 | 75 | 5 |
| RJ | 32,8 | 0 | 0 |
| SUL | 85,6 | 60 | 0 |
| PR | 9,1 | 71 | 0 |
| RS | 48,9 | 80 | 0 |
| SC | 27,6 | 22 | 0 |
| CENTRO-OESTE | 38,3 | 100 | 26 |
| GO | 28,4 | 100 | 0 |
| MS | 9,9 | 100 | 100 |
| TOTAL BRASIL | 1.007,1 | 66 | 15 |

* Acima de 80% de execução ou concluídas

Data de Referência: out/10

SANEAMENTO


Municípios de 50 a 150 mil habitantes – Financiamento

R\$ milhões

| SELECIONADO 2007-2008 | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|-----------------------|-------|------------|-------|------------------|
| QTD | VALOR | QTD | VALOR | |
| 119 | 773,5 | 119 | 773,5 | 100% |

| CONTRATADO | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DO INVESTIMENTO CONTRATADO | VALOR DO REPASSE DA UNIÃO | CONTRAPARTIDA ESTADOS E MUNICÍPIOS |
| 773,5 | 688,5 | 85,0 |

Estágio dos Projetos Contratados

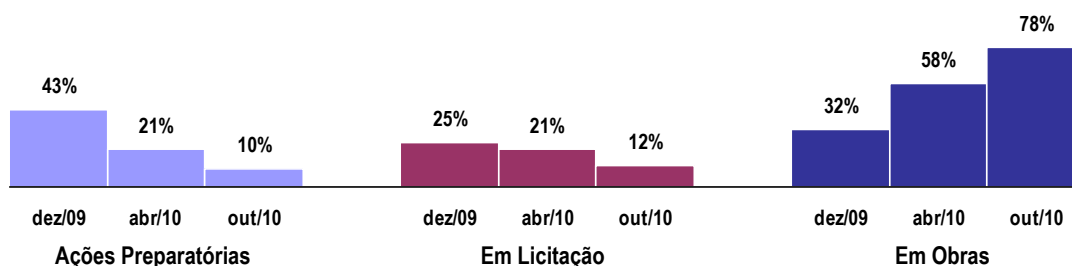

Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO

Municípios entre 50 e 150 mil habitantes – Financiamento

| REGIÃO / UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras | % obras em estágio avançado* |
|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| NORTE | 35,0 | 48 | 0 |
| AC | 9,0 | 100 | 0 |
| PA | 26,0 | 30 | 0 |
| NORDESTE | 235,2 | 89 | 5 |
| BA | 174,2 | 100 | 0 |
| CE | 26,5 | 38 | 38 |
| PE | 20,2 | 50 | 9 |
| RN | 14,3 | 100 | 0 |
| SUDESTE | 248,5 | 73 | 18 |
| ES | 15,3 | 8 | 0 |
| MG | 84,4 | 86 | 13 |
| RJ | 19,5 | 100 | 0 |
| SP | 129,3 | 68 | 26 |
| SUL | 183,5 | 80 | 0 |
| PR | 63,0 | 85 | 0 |
| RS | 70,6 | 61 | 0 |
| SC | 49,9 | 100 | 0 |
| CENTRO-OESTE | 71,3 | 72 | 24 |
| GO | 37,7 | 47 | 0 |
| MS | 33,6 | 100 | 50 |
| TOTAL BRASIL | 773,5 | 78 | 10 |

* Acima de 80% de execução ou concluídas

Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO

Pequenos municípios e áreas especiais – FUNASA

R\$ milhões

| SELECIONADO 2007-2010 | CONTRATADO | % CONTRATADO/ META 2007-2010 |
|--------------------------|------------|---------------------------------|
| 3.973,9 | 3.760,6 | 95% |

Contratações por Eixo de Ação

R\$ milhões

| Eixos de Ação | Nº Municípios | Valor Contratado | % em Obras |
|---|------------------|---------------------|---------------|
| Áreas Indígenas | 267 | 137,9 | 98 |
| Áreas Quilombolas | 143 | 123,7 | 19 |
| Combate à Malária | 33 | 119,1 | 15 |
| Combate à Doença de Chagas | 592 | 280,0 | 50 |
| Água, Esgoto, Melhorias Sanitárias e Resíduos Sólidos | 1.503 | 2.738,7 | 23 |
| Saneamento Rural | 325 | 268,8 | 21 |
| Saneamento em Escolas | 218 | 36,4 | 6 |
| Controle da Qualidade da Água | 30 | 38,2 | 26 |
| Apoio a Catadores | 23 | 17,9 | 0 |
| TOTAL | | 3.760,6 | 27 |

Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO

Pequenos municípios e áreas especiais – FUNASA

| REGIÃO/UF | Investimento contratado R\$ milhões | % em obras |
|---------------------|---|------------|
| NORTE | 681,0 | 29 |
| AC | 64,3 | 25 |
| AM | 112,5 | 16 |
| AP | 42,7 | 35 |
| PA | 304,3 | 30 |
| RO | 87,8 | 12 |
| RR | 34,5 | 61 |
| TO | 34,8 | 70 |
| NORDESTE | 1.979,4 | 25 |
| AL | 201,4 | 10 |
| BA | 301,0 | 20 |
| CE | 389,8 | 46 |
| MA | 196,0 | 19 |
| PB | 209,1 | 20 |
| PE | 345,1 | 23 |
| PI | 159,7 | 35 |
| RN | 76,7 | 35 |
| SE | 100,5 | 2 |
| SUDESTE | 427,6 | 22 |
| ES | 33,7 | 40 |
| MG | 271,9 | 19 |
| RJ | 60,8 | 37 |
| SP | 61,2 | 12 |
| SUL | 342,5 | 15 |
| PR | 148,8 | 19 |
| RS | 84,6 | 17 |
| SC | 109,1 | 9 |
| CENTRO-OESTE | 330,1 | 47 |
| GO | 86,7 | 27 |
| MS | 98,1 | 59 |
| MT | 143,8 | 52 |
| DF | 1,5 | 0 |
| BRASIL | 3.760,6 | 27 |

Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO

Seleções 2009 e 2010 – Drenagem, Água e Esgoto

Total dos Investimentos Selecionados – R\$ 8,4 bilhões


Total dos Investimentos Contratados – R\$ 6,5 bilhões

| SELEÇÃO 2009 | SELECIONADO | | CONTRATADO | | % DE CONTRATAÇÃO |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|
| | QTD | VALOR | QTD | VALOR | |
| Drenagem OGU | 82 | 1,6 | 80 | 1,57 | 98,1 |
| Drenagem FIN | 66 | 2,1 | 41 | 1,2 | 57,1 |
| Água e Esgoto FIN | 92 | 3,8 | 69 | 3,0 | 78,3 |
| Outras Seleções OGU | 39 | 0,9 | 31 | 0,7 | 77,8 |
| TOTAL | 279 | 8,4 | 221 | 6,5 | 76,7 |

R\$ bilhões

Data de Referência: out/2010

Estágio dos Projetos Contratados

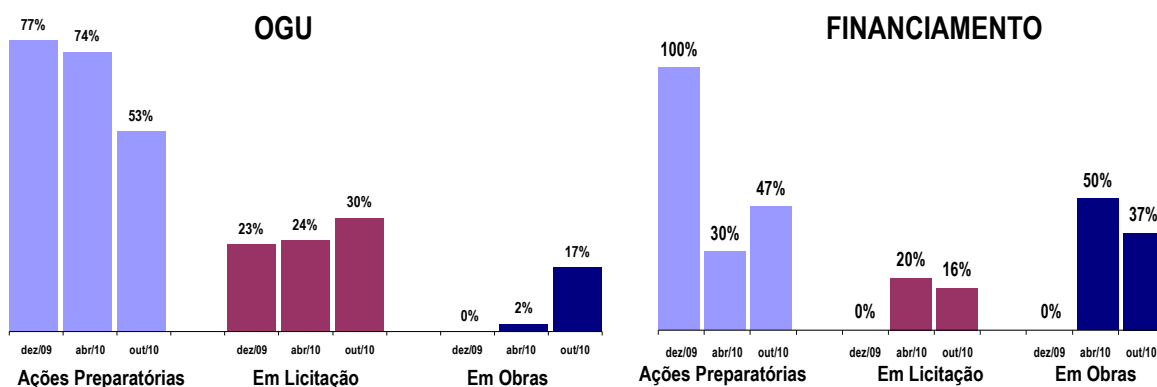

SANEAMENTO

Seleções 2009 e 2010 – Drenagem, Água e Esgoto

OGU

| REGIÃO / UF | Investimento selecionado R\$ milhões | % contratado | % em obras |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| NORTE | 235,0 | 100 | 0 |
| AC | 1,0 | 100 | 0 |
| RO | 233,2 | 100 | 0 |
| TO | 0,8 | 0 | 0 |
| NORDESTE | 572,8 | 79 | 22 |
| AL | 0,4 | 100 | 0 |
| BA | 119,6 | 100 | 69 |
| CE | 96,1 | 100 | 0 |
| MA | 163,2 | 51 | 13 |
| PB | 2,6 | 61 | 0 |
| PE | 39,5 | 100 | 19 |
| PI | 39,4 | 0 | 0 |
| RN | 112,0 | 100 | 0 |
| SUDESTE | 1.154,0 | 97 | 10 |
| ES | 55,9 | 100 | 0 |
| MG | 218,2 | 92 | 15 |
| RJ | 377,8 | 97 | 6 |
| SP | 502,2 | 98 | 12 |
| SUL | 441,2 | 100 | 40 |
| PR | 52,9 | 100 | 99 |
| RS | 114,4 | 100 | 21 |
| SC | 273,9 | 100 | 37 |
| CENTRO- | 74,6 | 100 | 0 |
| DF | 0,4 | 100 | 0 |
| GO | 57,8 | 100 | 0 |
| MT | 16,4 | 100 | 0 |
| TOTAL BRASIL | 2.477,7 | 94 | 17 |

FINANCIAMENTO

| REGIÃO / UF | Investimento selecionado R\$ milhões | % contratado | % em obras |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| NORTE | 352,9 | 29 | 0 |
| PA | 250,0 | 0 | 0 |
| RR | 102,8 | 100 | 0 |
| NORDESTE | 1.323,9 | 76 | 0 |
| BA | 324,2 | 100 | 0 |
| CE | 488,0 | 45 | 0 |
| MA | 13,0 | 100 | 0 |
| PB | 58,3 | 100 | 0 |
| PE | 284,3 | 82 | 0 |
| RN | 119,1 | 100 | 0 |
| SE | 37,0 | 100 | 0 |
| SUDESTE | 3.007,5 | 72 | 62 |
| ES | 195,1 | 100 | 0 |
| MG | 815,4 | 77 | 59 |
| RJ | 543,7 | 0 | 0 |
| SP | 1.453,3 | 93 | 73 |
| SUL | 932,0 | 70 | 18 |
| PR | 158,6 | 100 | 73 |
| RS | 410,5 | 85 | 0 |
| SC | 362,9 | 41 | 0 |
| CENTRO- | 309,9 | 73 | 27 |
| DF | 47,2 | 100 | 0 |
| GO | 190,3 | 55 | 0 |
| MS | 72,5 | 100 | 82 |
| TOTAL | 5.926,2 | 70 | 37 |

Data de Referência: out/2010

PAC SANEAMENTO


Setor Privado, Operações de Mercado e SPE – Financiamento

R\$ milhões

| PREVISTO 2007-2010 | CONTRATADO ATÉ OUT/2010 | % DE CONTRATAÇÃO |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| 7.250,0 | 4.564,7 | 63% |

| INVESTIMENTO CONTRATADO ATÉ 30/10/2010 | VALOR DO EMPRÉSTIMO | CONTRAPARTIDA |
|--|---------------------|---------------|
| 4.564,7 | 3.607,0 | 957,7 |

Estágio dos Projetos Contratados *

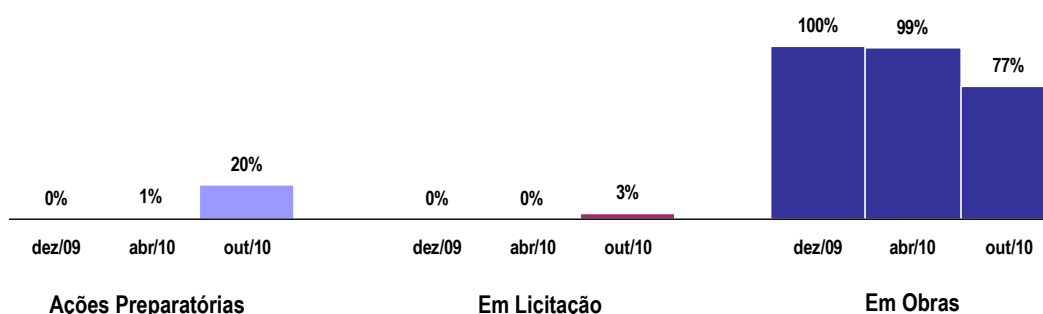

* % de Ações Preparatórias subiu em relação a abril/2010 devido à contratação de novos projetos R\$ 926,4 milhões

Data de Referência: out/2010

SANEAMENTO

Evolução das ações significativas

Abastecimento de água – Boa Vista/RR



Esgotamento sanitário – Baixada Santista/SP

Despoluição – Rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí/RS

Saneamento integrado – Complexo de Manguinhos/RJ

Esgotamento sanitário – RM de Belo Horizonte/MG

Despoluição – Baía de Todos os Santos/BA

Esgotamento sanitário – Guarulhos/SP

Abastecimento de água – Manaus/AM

Drenagem urbana – Baixada Fluminense/RJ

Abastecimento de água – Salvador/BA

Saneamento integrado – Campinas/SP

Esgotamento sanitário – Corumbá/MS



Esgotamento sanitário – Rio Branco/AC



Abastecimento de água – João Pessoa/PB



Abastecimento de água – Sistema Corumbá Sul/DF/GO

Esgotamento sanitário – Fortaleza/CE

Drenagem urbana – Igarapé do Mindu/AM

Esgotamento sanitário – Aracaju e Barra dos Coqueiros/SE

Abastecimento de água – Macapá/AP

Saneamento integrado – Vitória/ES



Esgotamento sanitário – Porto Velho/RO

Saneamento integrado – Ananindeua/PA



Esgotamento sanitário – Cuiabá/MT



ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BOA VISTA/RR



Estação elevatória de água tratada 04 – EAT 04

DESCRIÇÃO: Ampliação e otimização do sistema de abastecimento de água de Boa Vista – 2ª etapa. Construção de adutora de água tratada, ETA, elevatórias e redes de distribuição. Empreendimento universaliza o serviço de abastecimento de água a população urbana

UF: RR META: 65 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2008 – 2010: R\$ 60 milhões – Financiamento
EXECUTOR: Governo do Estado de Roraima/Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- Obra concluída em 29/10/2010
- 100% da captação, adução e tratamento de água superficial
- 100% da captação, adução e tratamento de água subterrânea
- 100% da adução de água tratada
- 100% da reforma e construção de centro de reservação e distribuição
- 100% das redes de distribuição de água tratada



ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BAIXADA SANTISTA/SP



Estação de pré-condicionamento em Praia Grande

DESCRIÇÃO: Programa de recuperação ambiental da região metropolitana da Baixada Santista que amplia os sistemas de esgotamento sanitário e 7 estações de tratamento de esgoto. O índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto passará de 53% para cerca de 95%

UF: SP META: 370 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 901,1 milhões – Financiamento
EXECUTOR: Governo do Estado de São Paulo/Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo – SABESP

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 77% de execução global
- SES Bertioga – 60%
- SES Cubatão – 69%
- SES Guarujá – 63%
- SES Itanhaém – 77%
- SES Mongaguá – 88%
- SES Peruíbe – 86%
- SES Praia Grande – 75%
- SES Santos – 96%
- SES São Vicente – 34%

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 80% de execução global
- SES Bertioga – 61%
- SES Cubatão – 71%
- SES Guarujá – 70%
- SES Itanhaém – 80%
- SES Mongaguá – 91%
- SES Peruíbe – 89%
- SES Praia Grande – 78%
- SES Santos – 97%
- SES São Vicente – 46%

| Municípios | Investimento R\$ Milhões |
|--------------|-----------------------------|
| Bertioga | 56,1 |
| Cubatão | 48,9 |
| Guarujá | 109,8 |
| Itanhaém | 117,3 |
| Mongaguá | 91,9 |
| Peruíbe | 167,3 |
| Praia Grande | 136,3 |
| Santos | 135,5 |
| São Vicente | 38,0 |

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BAIXADA SANTISTA/SP

RESULTADOS ATÉ 31/12/2010 - continuação

- Publicação dos editais de licitação de etapas complementares das obras de Cubatão até 15/12/2010
- Início das obras complementares do SES de Bertioga até 15/12/2010
- Obtenção de licença ambiental para as obras complementares de São Vicente até 15/12/2010, de Bertioga, Cubatão e Santos até 30/12/2010
- Obtenção de titularidade para as obras complementares de São Vicente até 15/12/2010 e de Bertioga, Cubatão e Santos até 30/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- 86% realizados até 30/04/2011
- Obtenção da titularidade e da licença ambiental para as obras complementares de Guarujá até 30/10/2011
- Publicação dos editais de licitação de etapas das obras de Bertioga até 28/02/2011 e Guarujá até 30/03/2011

| Municípios | Conclusão |
|--------------|------------|
| Bertioga | 30/06/2013 |
| Cubatão | 30/03/2012 |
| Guarujá | 30/08/2013 |
| Itanhaém | 30/04/2011 |
| Mongaguá | 30/04/2011 |
| Peruíbe | 30/04/2011 |
| Praia Grande | 30/04/2011 |
| Santos | 30/09/2011 |
| São Vicente | 30/12/2012 |



DESPOLUIÇÃO DOS VALES DOS RIOS DOS SINOS, GUAÍBA E GRAVATAÍ/RS



Emissário Terrestre do SES Ponta da Cadeia

DESCRIÇÃO: Ampliação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Esteio, Sapucaia do Sul, Guaíba e Canoas. Em Porto Alegre as principais obras são implantação dos SES de Sarandi e de Ponta da Cadeia

UF: RS META: 813,7 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 671,3 milhões

OGU: R\$ 256,2 milhões

Financiamento: R\$ 415,1 milhões

EXECUTORES: Governo do Estado do Rio Grande do Sul/Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN e Prefeitura de Porto Alegre

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

➤ 25% de execução global

OGU

- 41% de execução
- Alvorada/Viamão, Canoas e Esteio/Sapucaia – 228 km de rede coletora e 25,4 mil ligações prediais

FINANCIAMENTO

- 13% de execução
- SES Ponta da Cadeia – 12% executados – estação de bombeamento de esgoto - EBE - Ponta da Cadeia concluída, 6 km de emissários executados
 - Obras da ETE Serraria do SES de Ponta da Cadeia iniciadas em 17/05/2010
- SES Sarandi – 24% realizados – redes coletoras e EBE Asa Branca concluídas, coletor tronco com 99% de execução
- SES Guaíba – 3% realizados

| Municípios | Investimento R\$ Milhões |
|------------------|-----------------------------|
| Porto Alegre | 370,1 |
| Alvorada/ Viamão | 108,1 |
| Esteio/ Sapucaia | 106,8 |
| Guaíba | 45,0 |
| Canoas | 41,3 |

DESPOLUIÇÃO DOS VALES DOS RIOS DOS SINOS, GUAÍBA E GRAVATAÍ/RS

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

➤ 28% de execução global

OGU

➤ 43% realizados

➤ Aprovação do projeto e licitação da ETE de Esteio/Sapucaia do Sul até 13/12/2010

➤ Aprovação do projeto e licitação da ETE de Alvorada/Viamão até 13/12/2010

FINANCIAMENTO

➤ 18% realizados

➤ Início das obras do emissário final do SES de Ponta da Cadeia até 13/12/2010

➤ Conclusão da licitação da ETE Sarandi até 14/12/2010

PROVIDÊNCIAS

➤ 52% de execução global até 30/04/2011

OGU - 80% realizados até 30/04/2011

FINANCIAMENTO - 33% realizados até 30/04/2011

| Municípios | Conclusão |
|------------------------|------------|
| Alvorada/Viamão | 29/05/2011 |
| Esteio/Sapucaia do Sul | 29/09/2011 |
| Canoas | 03/06/2011 |
| Guaíba | 31/12/2011 |
| Porto Alegre | 30/12/2011 |



COMPLEXO DE MANGUINHOS/RJ



Unidades Habitacionais no DSUP

DESCRIÇÃO: Saneamento integrado e urbanização de assentamentos precários no Complexo Manguinhos. Elevação da linha férrea, implantação de rede de abastecimento de água, rede coletora e ligações domiciliares de esgoto, drenagem de águas pluviais, sistema viário, construção de equipamentos públicos, construção de 1.774 unidades habitacionais - UH e aquisição de 4.888 UH para reassentamento de população residente em área de risco

UF: RJ

META: 12 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 662,2 milhões – OGU

EXECUTORES: Governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura do Rio de Janeiro

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

➤ 51% de execução global

Estado

➤ 46% realizados

➤ 100% do viaduto da elevação da Via Férrea e 70% do lançamento dos trilhos

➤ Entrega de 152 UH na área da Embratel em 28/06/2010 e de 328 UH em 25/10/2010

➤ Conclusão dos projetos executivos das obras complementares - 686 UH na CCPL, rede permanente e sinalização da linha férrea, estação intermodal, parque linear e pontes sobre o Canal do Cunha e sobre o Rio Faria Timbó 27/08/2010

Prefeitura

➤ 83% realizados

| Executor | Investimento R\$ milhões |
|------------|-----------------------------|
| Estado | 567,7 |
| Prefeitura | 94,5 |

COMPLEXO DE MANGUINHOS/RJ

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 60% de execução global

Estado

- 55% realizados até 31/12/2010

Prefeitura

- 88% realizados até 31/12/2010

PROVIDÊNCIAS

- 70% de execução global até 30/04/2011

Estado

- 65% realizados até 30/04/2011
- Contratação direta para execução das 686 UH na área da CCPL e das obras complementares até 05/01/2011
- Conclusão da elevação da linha férrea até 30/04/2011

Prefeitura

- Conclusão até 30/03/2011



Conclusão – 31/12/2011

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RM DE BELO HORIZONTE/MG



Execução dos filtros – ETE em Pedro Leopoldo

DESCRIÇÃO: Ampliação e melhorias no sistema de esgotamento sanitário de 15 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte – ligações prediais, redes coletoras, interceptores, emissários, estações elevatórias e estações de tratamento de esgoto

UF: MG META: 255 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 611,8 milhões – Financiamento

EMPREENDEDOR: Governo do Estado de Minas Gerais/Companhia de Saneamento de MG – Copasa e Prefeituras

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 78% de execução global*
- 97% das obras iniciadas, sendo 38% concluídas
 - Belo Horizonte – 82%
 - Contagem – 94%
 - Ribeirão das Neves – 78%
 - Betim – 81%
 - Santa Luzia – 57%
 - Pedro Leopoldo e Confins – 80%
 - Esmeraldas – 40%
 - Nova Lima – 8%
 - Lagoa Santa – 85%
 - Vespasiano – 97%
 - Matozinhos/Capim Branco – 86%
 - Outros RM – 100%

| Municípios | Investimento R\$ milhões |
|--------------------------|-----------------------------|
| Belo Horizonte | 120,5 |
| Contagem | 91,9 |
| Ribeirão das Neves | 87,6 |
| Betim | 49,9 |
| Santa Luzia | 45,0 |
| Pedro Leopoldo e Confins | 40,1 |
| Esmeraldas | 30,0 |
| Nova Lima | 30,0 |
| Ibirité | 24,1 |
| Lagoa Santa | 17,5 |
| Vespasiano | 21,9 |
| São José da Lapa | 9,3 |
| Matozinhos/Capim Branco | 3,0 |
| Outros RM | 41,0 |

* Considera o aumento no valor do investimento

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RM DE BELO HORIZONTE/MG

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- 82% de execução global

| Municípios | Conclusão |
|-------------------------|------------|
| Lagoa Santa | 13/12/2010 |
| Matozinhos/Capim Branco | 14/12/2010 |
| Vespasiano | 15/12/2010 |

PROVIDÊNCIA

- 92% de execução global até 30/04/2011

| Municípios | Conclusão |
|--------------------------|------------|
| Belo Horizonte | 01/03/2012 |
| Betim | 01/03/2012 |
| Contagem | 01/06/2011 |
| Esmeraldas | 01/07/2011 |
| Nova Lima | 30/12/2012 |
| Pedro Leopoldo e Confins | 01/07/2011 |
| Ribeirão das Neves | 01/03/2011 |
| Santa Luzia | 01/07/2011 |



DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS/BA



Reator da ETE de Vera Cruz

DESCRIÇÃO: Ampliação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em 12 municípios da Baía de Todos os Santos – rede coletora, ramais prediais, ligações intradomiciliares, estações elevatórias, linhas de recalque, emissários e estações de tratamento

UF: BA

META: 148,2 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 383,9 milhões

OGU: R\$ 192,6 milhões

Financiamento: R\$ 191,3 milhões

EXECUTOR: Governo do Estado da Bahia – Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 40% de execução global*

OGU

- 40% realizados – Candeias, Salvador, Simões Filho e Vera Cruz
- Início das obras do SES de Simões Filho em 31/10/2010

FINANCIAMENTO

- 40% realizados – Cachoeira, Itaparica, Madre de Deus, Maragogipe, Muritiba, Salvador, Santo Amaro, São Félix e São Francisco do Conde
- Conclusão do SES São Félix em 15/05/2010
- Obtenção das autorizações da DER-BA/DNIT para execução de 16 travessias em 25/05/2010
- Reinício das obras de São Francisco do Conde em 09/07/2010
- Reinício das obras de Maragogipe em 04/08/2010 e de Santo Amaro em 19/10/2010

| Municípios | Investimento R\$ milhões |
|------------------|-----------------------------|
| Salvador | 205,4 |
| Candeias | 39,8 |
| Vera Cruz | 38,6 |
| Simões Filho | 29,9 |
| Maragogipe | 11,9 |
| Muritiba | 14,6 |
| Sto. Amaro | 9,5 |
| Itaparica | 9,8 |
| Cachoeira | 8,8 |
| S. Fco. do Conde | 7,2 |
| Madre de Deus | 6,8 |
| São Felix | 1,7 |

* Considera o aumento no valor de investimento

DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS/BA

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 48% realizados*

OGU

- Obtenção da titularidade dos SES de Candeias e de Vera Cruz até 13/12/2010
- Obtenção da licença ambiental do emissário da Ilha da Maré até 13/12/2010
- Início das obras do SES da Ilha de Maré até 15/12/2010

FINANCIAMENTO

- Obtenção da licença ambiental do SES de Cachoeira até 14/12/2010
- Obtenção da titularidade dos SES de Cachoeira, Santo Amaro, Itaparica, Madre de Deus, Muritiba e de Salvador até 15/12/2010 e de São Francisco do Conde e Maragogipe até 31/12/2010



| Município | Conclusão | Município | Conclusão |
|-----------|------------|-----------|------------|
| Itaparica | 30/12/2010 | São Félix | 31/12/2010 |

PROVIDÊNCIAS

- 53% de execução até 30/04/2011*
- Conclusão das ETEs de Muritiba até 31/01/2011 e de Itaparica até 28/02/2011

| Município | Conclusão | Município | Conclusão |
|---------------|------------|------------------------|------------|
| Cachoeira | 30/06/2011 | Salvador | 30/12/2011 |
| Candeias | 30/06/2011 | Santo Amaro | 30/09/2011 |
| Madre de Deus | 30/05/2011 | São Francisco do Conde | 30/09/2011 |
| Maragogipe | 30/12/2011 | Simões Filho | 12/12/2011 |
| Muritiba | 30/03/2011 | Vera Cruz | 12/07/2011 |

* Considera o aumento no valor de investimento

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GUARULHOS/SP



Decantador secundário da ETE São João

DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário, com a construção de duas ETEs e coletores tronco nos Sistemas São João e Bonsucesso. Construção de coletores tronco, linhas de recalque e estações elevatórias nas vertentes 2 e 3 da ETE São Miguel. Construção de coletores tronco, interceptores e redes coletoras nas Sub-bacias 08 e 09. A obra eleva o índice de cobertura de coleta de esgoto de 75% para 89% e de tratamento de esgoto de 0% para 55%

UF: SP

META: 147,5 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 358,0 milhões – Financiamento

EXECUTOR: Prefeitura de Guarulhos/Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos – SAAE

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 50% de execução global*
 - 85% dos Sistemas São João e Bonsucesso – 6,8 km do coletor tronco São João, concluído interceptor São João, 90% da ETE São João e 84% da ETE Bonsucesso
 - 13% da vertente 3 da ETE São Miguel – 29,5 km de rede coletora e 3,1 km de coletor tronco
 - 25% da vertente 2 da ETE São Miguel – 21,1 km de rede coletora e 4,7 km de coletor tronco
 - 47% das Sub-bacias 08 e 09 – 10,4 km de rede coletora e 4,4 km de coletor tronco
 - 35% da complementação das ETEs São João e Bonsucesso
- Inaugurada a ETE São João em 27/09/2010
- Contratada a complementação das ETEs do Sistema São João e do Sistema Bonsucesso em 14/10/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 65% de execução global*
 - 90% dos Sistemas São João e Bonsucesso
 - 30% da vertente 3 da ETE São Miguel
 - 35% da vertente 2 da ETE São Miguel
 - 50% das Sub-bacias 08 e 09
 - 70% da complementação das ETEs São João e Bonsucesso

* Considera o aumento no valor de investimento

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GUARULHOS/SP

PROVIDÊNCIAS

- 79% de execução global até 30/04/2011
 - 91% dos Sistemas São João e Bonsucesso
 - 50% da vertente 3 da ETE São Miguel
 - 60% da vertente 2 da ETE São Miguel
 - 75% das Sub-bacias 08 e 09
 - 90% da complementação das ETEs São João e Bonsucesso
- Inauguração da ETE Bonsucesso até 30/04/2011

Conclusão - 30/09/2011



ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MANAUS/AM



Unidade de captação de água bruta no Rio Negro

DESCRIÇÃO: Regularização emergencial e ampliação do sistema de abastecimento de água nas zonas leste e norte, incluindo a construção de uma nova estação de tratamento de água, reservatórios, adutoras, redes de distribuição e ligações prediais

UF: AM

META: 306 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 342,6 milhões – Financiamento

EXECUTORES: Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura de Manaus

| Executor | Investimento R\$ milhões |
|------------|-----------------------------|
| Estado | 282,6 |
| Prefeitura | 60,0 |

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 90% de execução global

Estado – 90% realizados – ETA, captação no Rio Negro, adutoras, concretagem de reservatórios e unidades de bombeamento

Prefeitura – 88% realizados – 647 km de rede de distribuição e 55,9 mil ligações de água

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

Estado - 95% realizados

Prefeitura - conclusão até 20/12/2010

PROVIDÊNCIA

Estado - conclusão até 25/02/2011

| | |
|------------|------------------------|
| Prefeitura | Conclusão – 20/12/2010 |
| Estado | Conclusão – 25/02/2011 |



DRENAGEM URBANA NA BAIXADA FLUMINENSE/RJ



Conjunto Barro Vermelho em Belford Roxo

DESCRIÇÃO: Macrodrenagem, recuperação ambiental e reassentamento de 2,1 mil famílias residentes nas margens dos rios Botas e Sarapuí, visando ao controle de enchentes nas cidades de Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, São João do Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis e Rio de Janeiro

UF: RJ META: 500 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 293,9 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado do Rio de Janeiro/CEHAB/INEA

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 60% de execução global
 - 60% das redes de galerias – 3,5 km
 - 90% de desassoreamento dos rios Botas e Sarapuí – 2,7 milhões de metros cúbicos
 - 22% de pavimentação de vias marginais – 9,5 km
 - 50% das 252 unidades habitacionais – UH em Belford Roxo
 - 60% das 114 UH em Roldão Gonçalves em Mesquita
 - 20% das 960 UH em Trio de Ouro em São João de Meriti

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- 65% de execução

Conclusão – 30/12/2011

PROVIDÊNCIAS

- 80% de execução global até 30/04/2011
- Realização de nova licitação para a construção de 554 UH no COBREX em substituição à aquisição de UH prontas até 30/03/2011
- Publicação do edital de licitação para construção de 188 UH na Rua Meriti em Mesquita até 29/04/2011
- Conclusão das obras de drenagem até 30/06/2011



ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SALVADOR/BA



Conexão para colocação de chaminé de equilíbrio

DESCRIÇÃO: Ampliação e melhoria do sistema integrado de abastecimento de água de Salvador e localidades de Ilha dos Frades, Paramana, Porto Loreto, Praia da Costa e Ponto de Nossa Senhora de Guadalupe

UF: BA META: 69,1 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 83,7 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado da Bahia/Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 62% de execução global
- Aprovação da licitação para materiais da adutora para o Reservatório 3 em 14/09/2010
- Início das obras do Reservatório 3 em 15/09/2010
- Início das obras das redes da Cidade Baixa em 31/10/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 70% realizados até 31/12/2010
- Obtenção das titularidades da adutora Joanes II em 22/11/2010
- Aprovação da titularidade do Reservatório R-14 até 14/12/2010
- Republicação do edital de licitação das obras da Adutora, Rede e Reservatório R-14 que substituirão a etapa executada com recursos próprios – 1ª licitação deserta – até 15/12/2010

PROVIDÊNCIA

- 86% de execução até 30/04/2011

Conclusão – 30/12/2011



ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RIO BRANCO/AC

PROVIDÊNCIAS

- 49% de execução global até 30/04/2011

OGU

- 30% realizados até 30/04/2011
- Publicação do edital da ETE Conquista até 28/01/2011 e início da obra até 05/04/2011

FINANCIAMENTO

- 59% realizados até 30/04/2011

Conclusão – 31/10/2011



ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JOÃO PESSOA/PB



Ampliação da ETA Gramame

DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de produção e tratamento de água, com a construção de barragem de nível, duas estações elevatórias, três adutoras, um reservatório semienterrado e ampliação e automação da ETA. O empreendimento universaliza o atendimento da população urbana

UF: PB

META: 66 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 84,9 milhões – OGU

EXECUTOR: Governo do Estado da Paraíba/Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 72% de execução, 64% da captação, 27 km de adutora, 78% do reservatório apoiado, 16% da ETA

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Conclusão do projeto executivo da estação elevatória de água bruta 2 e apresentação da reprogramação até 13/12/2010
- Finalização da análise da reprogramação em razão das alterações no projeto original até 30/12/2010

RESTRIÇÕES

- Obra paralisada, houve desmobilização do executor em razão da Tomada de Contas Especial – TCE instaurada pelo TCU
- Provável necessidade de aporte de novos recursos para concluir a obra

PROVIDÊNCIAS

- 90% de execução até 30/04/2011
- Reinício das obras até 03/01/2011

Conclusão – 30/06/2011



ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DF E ENTORNO SISTEMA CORUMBÁ SUL – DF e GO



Assentamento da adutora de água bruta

DESCRIÇÃO: Ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de água em Goiás – Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Águas Lindas – e DF – Gama e Santa Maria. Construção de captação, estação de tratamento de água, adutoras de água bruta e tratada, reservatórios e estações de recalque

UF: GO e DF META: 230 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 304,2 milhões
OGU: R\$ 118,2 milhões
FIN: R\$ 186,0 milhões

EMPREENDEDORES: Governos do Estado de Goiás e do Distrito Federal

RESULTADO ATÉ 31/10/2010

GO - 11% realizados – movimentação de terra, aquisição de materiais e assentamento de cerca de 5 km adutora água bruta

| Executor | Investimento R\$ milhões |
|----------|-----------------------------|
| DF | 186,0 |
| GO | 118,2 |

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

GO

- 17% realizados
- Republicação do edital das bombas, em razão dos custos das duas propostas recebidas serem muito diferentes, até 13/12/2010
- Início das obras da elevatória de água bruta até 15/12/2010

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DF E ENTORNO SISTEMA CORUMBÁ SUL – DF e GO

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010 - continuação

DF

- Adequação dos projetos e detalhamento dos custos da adutora de água bruta em dois trechos, com valores compatíveis com os dois termos de compromisso que suportam a execução da referida adutora até 15/12/2010
- Revalidação da licença ambiental para a adutora de água bruta até 17/12/2010
- Obtenção da licença ambiental para a adutora de água tratada até 17/12/2010
- Publicação da licitação da ETA até 31/12/2010
- Obtenção de autorização para travessia de ferrovia da RFFSA até 31/12/2010
- Obtenção de autorização do DNIT para travessia da BR-040 até 31/12/2010



RESTRIÇÃO

DF - Morosidade na execução das ações preparatórias para início das obras

PROVIDÊNCIAS

GO

- 25% realizados até 30/04/2011
- Publicação do edital de licitação da subestação, da linha de alta tensão e dos equipamentos de proteção para transiente hidráulico até 31/03/2011
- Obtenção da licença ambiental da linha de transmissão para funcionamento das bombas da captação até 30/04/2011
- Conclusão do assentamento da adutora de água bruta até 30/04/2011
- Execução de 60% da elevatória de água bruta até 30/04/2011

DF

- Publicação da licitação da eletrificação e automação, reservatório, elevatória e da adutora de água tratada até 28/02/2011
- Início das obras da adutora de água bruta até 31/03/2011

Conclusão GO – 31/12/2011
Conclusão DF – 01/12/2011

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM FORTALEZA/CE



Assentamento de poço de visita Av. Osório de Paiva – Bacia SE-2

DESCRIÇÃO: Implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza para atender as Bacias dos Rios Siqueira e Cocó – o empreendimento eleva a cobertura de coleta e tratamento de 52% para 63%

UF: CE META: 150,3 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 204,5 milhões

OGU: R\$ 81,4 milhões

Financiamento: R\$ 123,1 milhões

EXECUTOR: Governo do Estado do Ceará/Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

➤ 16% de execução global

OGU – 40% realizados – Rede coletora, ligações domiciliares e ligações intradomiciliares

FIN – Conclusão da análise das licitações das Bacias CE-4 e CE-5 em 30/08/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

➤ 23% de execução global

OGU – 51% realizados

FINANCIAMENTO

➤ Conclusão da análise das licitações das Bacias CD-1, CD-2 e CD-3 até 15/12/2010

➤ Apresentação da titularidade da área restante da Bacia CE-4 até 15/12/2010

➤ Rescisão do contrato das obras da Bacia CD-3 para convocação da 2ª colocada ou realização de nova licitação até 30/12/2010

Conclusão – 30/08/2012

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM FORTALEZA/CE

RESTRICÇÕES

➤ Dificuldades na aprovação da reprogramação do projeto de engenharia das Bacias CE-6, SD-8, CD-1, CD-2, CE-4 e CE-5

➤ Indecisão da CAGECE sobre execução das obras das Bacias CD-1 e CD-2 com os recursos do PAC ou recursos do BID

PROVIDÊNCIAS

➤ 47% de execução global até 30/04/2011

OGU

➤ 72% realizados até 30/04/2011

➤ Conclusão da análise dos projetos de engenharia e das licitações das Bacias SD-8 e CE-6 até 15/01/2011

➤ Início das obras da Bacia CE-6 e SD-8 até 28/01/2011

FINANCIAMENTO

➤ Início de obra até 31/03/2011

Conclusão – 30/08/2012



URBANIZAÇÃO DO IGARAPÉ DO MINDU/AM



Vista panorâmica do Igarapé do Mindú

DESCRIÇÃO: Macrodrenagem e urbanização do Igarapé do Mindu para controle de enchentes, incluindo a recuperação ambiental, com a execução de parques lineares e corredor ecológico, reservatórios de acumulação de cheias, pontes e o reassentamento de população ribeirinha

UF: AM

META: 48 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 201 milhões – Financiamento

EXECUTOR: Prefeitura de Manaus

RESULTADO ATÉ 31/10/2010

- 4% de execução – projetos, centro de vigilância ambiental, fundações da ponte José Romão e ações de reassentamento

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 4% de execução
- Homologação de licitação de 53% do valor da obra em 16/11/2010
- Conclusão da revisão dos projetos referente ao contrato de complementação até 15/12/2010
- Republicação de edital de licitação da Ponte José Romão até 15/12/2010

RESTRIÇÕES

- Morosidade na execução das ações preparatórias para o início de 93% das obras
- Desistência da empresa executora das obras da Ponte José Romão

PROVIDÊNCIA

- Início de 53% das obras até 30/04/2011

Conclusão – 30/01/2012



ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ARACAJU E BARRA DOS COQUEIROS/SE



Reator da ETE de Barra dos Coqueiros

DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário, com execução de redes coletoras e ligações domiciliares nos bairros Atalaia, Coroa do Meio, São Conrado, Grageru, Índio Palentin, Ponto Novo, Sol Nascente, Castelo Branco, Augusto Franco e Farolândia, em Aracaju e Barra dos Coqueiros. A obra elevará a cobertura de coleta e o tratamento de 44% para 60% em Aracaju

UF: SE

META: 50 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 84,8 milhões – OGU

EXECUTOR: Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 28% de execução – Barra dos Coqueiros e bairros Ponto Novo e parte de Farolândia, em Aracaju
- Publicação dos editais da 3ª licitação para os serviços dos bairros de Atalaia, Coroa do Meio, Suissa, Salgado Filho, Jardins, Garcia e parte de Farolândia, em Aracaju, em 16/07/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 30% realizados até 31/12/2010
- Homologação da 3ª licitação das obras dos bairros de Atalaia, Coroa do Meio, Suissa, Salgado Filho, Jardins, Garcia e parte de Farolândia em Aracaju até 13/12/2010
- Início das obras da ETE ERQ-Sul até 13/12/2010
- Aprovação das planilhas orçamentárias do pregão – 3 lotes – para aquisição de parte dos materiais das ETEs ERQ-Oeste e Sul até 13/12/2010
- Publicação do novo edital para a 4ª licitação dos serviços da ETE ERQ-Oeste até 15/12/2010
- Publicação do edital do pregão dos 3 lotes restantes para aquisição dos materiais para as ETEs ERQ-Oeste e ERQ-Sul até 15/12/2010

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ARACAJU E BARRA DOS COQUEIROS/SE

RESTRIÇÕES

- Aracaju
 - Necessidade de 4ª licitação dos serviços da ETE ERQ-Oeste devido a problema de custos acima do SINAPI
 - Dos 5 lotes do pregão dos materiais da obra de Aracaju, 1 foi cancelado e 2 desertos

PROVIDÊNCIA

- 40% de execução até 30/04/2011

Conclusão – 30/12/2011



ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MACAPÁ/AP



Adutora em execução

DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento de água nos setores Felicidade, Central e zona norte de Macapá, incluindo a ampliação da Estação de Tratamento de Água – ETA – Macapá, construção de reservatórios e substituição de redes de distribuição. O sistema atenderá 90% da população urbana

UF: AP

META: 66 mil famílias beneficiadas

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 79,6 milhões – OGU

EXECUTORES: Governo do Estado do Amapá/Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA

RESULTADOS

- 10% realizados
- Início das obras da rede de distribuição em 30/06/2010
- Publicação do edital de licitação para contratar o gerenciamento das obras em 17/06/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 13% de execução global
- Homologação da licitação para contratar o gerenciamento das obras até 20/12/2010

RESTRIÇÕES

- Morosidade na execução das ações preparatórias para início das obras e dificuldades no gerenciamento das obras

PROVIDÊNCIAS

- 22% realizados até 30/04/2011
- Publicação do edital de licitação para os serviços de desenvolvimento institucional até 20/01/2011
- Contratação do gerenciamento das obras até 31/01/2011
- Início das obras das ETAs e reservatórios referentes à licitação homologada até 31/01/2010

Conclusão – 31/12/2011



SANEAMENTO INTEGRADO EM VITÓRIA/ES



Contenção de encosta no Bairro Cruzamento

DESCRIÇÃO: Obras de esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia elétrica, habitação, sistema viário e drenagem na Poligonal 2. Engloba os bairros Forte São João, Cruzamento, Romão e Alto Jucutuquara, construção de 405 unidades habitacionais - UH, melhoria de outras 768 unidades habitacionais e construção de 13 equipamentos comunitários

UF: ES META: 2,3 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R\$ 56 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Vitória

RESULTADO ATÉ 31/10/2010

- 30% de execução global: serviços preliminares, redes de drenagem pluvial, esgoto e água, melhorias e reconstruções de UH, obras de contenção, construção de escadarias, vias de microtrator e trabalho técnico social – 1ª e 2ª Etapas

RESULTADO PREVISTO ATÉ 31/12/2010

- 35% realizados até 31/12/2010

RESTRIÇÃO

- 3ª etapa – a Justiça deferiu liminar impedindo a realização das obras até que sejam solucionadas as pendências de licenciamento ambiental da área de reassentamento do Romão

PROVIDÊNCIAS

- 40% realizados até 30/04/2011
- Obtenção de nova licença ambiental emitida pelo órgão ambiental do Estado para o reassentamento do Romão até 07/01/2011
- Publicação do edital de licitação para urbanização e construção de 106 UH no reassentamento do Romão até 15/01/2011

Conclusão – 30/05/2012



ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PORTO VELHO/RO



Rede coletora em execução

DESCRIÇÃO: Construção do sistema de esgotamento sanitário da cidade. O empreendimento universaliza o atendimento à população urbana da sede do Município. Etapa 1: elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo. Etapa 2: execução da obra de implantação de redes coletoras, ligações domiciliares, interceptores, elevatórias e estações de tratamento

UF: RO META: 130 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 554,5 milhões
OGU: R\$ 437,3 milhões
Financiamento: R\$ 117,2 milhões
EXECUTOR: Governo do Estado de Rondônia/Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD

RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 3% de execução global
- OGU – 53% da etapa de elaboração de projetos realizados
- FINANCIAMENTO – 12% realizados – Rede coletora na sub-bacia 2B da zona norte – 40 km executados

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 3% de execução global
- OGU – Conclusão da readequação do projeto básico e do projeto executivo da zona norte de Porto Velho até 30/12/2010

RESTRIÇÕES

- O TCU determinou suspensão cautelar dos desbloqueios dos termos de compromisso do OGU e os indicou à lista de obras com irregularidades graves com indicativo de paralisação
- Necessidade de readequação do projeto básico, elaboração do projeto executivo e ajustes na planilha orçamentária

PROVIDÊNCIAS

- 6% de execução global até 30/04/2011
- OGU – 2% realizados
- FINANCIAMENTO – 20% realizados

Conclusão – 28/06/2013



SANEAMENTO INTEGRADO EM ANANINDEUA/PA



Conjunto habitacional em Jaderlândia

DESCRIÇÃO: Erradicação de palafitas e recuperação de áreas degradadas em Jaderlândia e no entorno do rio Maguari-Açú, com construção de 812 UH, infraestrutura de esgotamento sanitário, ampliação de rede de água, ampliação de rede de energia, drenagem de águas pluviais, macrodrenagem, pavimentação, regularização fundiária, construção de espaços para esporte e lazer, postos de saúde e creche-escola

UF: PA META: 6 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 74,3 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Ananindeua



RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 18% realizados
- Homologação da nova licitação para as obras restantes em 01/07/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- 18% realizados até 31/12/2010
- Publicação de edital de licitação para finalizar as casas inacabadas pela desistência do 1º executor até 15/12/2010

RESTRICÇÕES

- Recisão do contrato feito por dispensa de licitação para a finalizar as casas inacabadas pela desistência do 1º executor em 30/09/2010
- Nova licitação homologada pelo proponente para as obras restantes apresenta problemas com custos SINAPI e composição do BDI

PROVIDÊNCIAS

- 25% realizados até 30/04/2011
- Reinício da obra até 10/01/2011

Conclusão – 31/12/2011

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CUIABÁ/MT



Canteiro de Obras

DESCRIÇÃO: Ampliação e melhorias no sistema de esgotamento sanitário de Cuiabá, com execução de redes coletoras, ligações domiciliares, linhas de recalque, elevatórias e estações de tratamento de esgotos – Projeto Pantanal. Elevará o nível de cobertura de coleta e tratamento para 70% em Cuiabá

UF: MT META: 56 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R\$ 135,7 milhões – OGU
EXECUTORES: Governo do Estado do Mato Grosso, Prefeitura de Cuiabá/
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP



RESULTADOS ATÉ 31/10/2010

- 2% de execução global
- Conclusão das licitações para o lote 4 em 23/08/2010 e para o lote 2 em 08/09/2010

RESULTADOS PREVISTOS ATÉ 31/12/2010

- Conclusão da elaboração do projeto do lote 5 até 15/12/2010
- Conclusão da nova licitação para o lote 3 até 15/12/2010


RESTRICÇÕES

- Obras paralisadas desde agosto de 2009 em razão da anulação dos contratos com os executores
- Lotes 3 e 5 dependem de acordo judicial com os executores anteriores para reinício das obras com contratos novos

PROVIDÊNCIA

- Início das obras do lote 8 até 31/01/2011

Conclusão – 31/12/2011



**OBRA
CONCLUÍDA**

PAC PROGRAMA DE
ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO



PAC PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

BRASIL
UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

